MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES PARAGUAY | PARAGUÁI TETÃ REMBIAPO HA MARANDU MOTENONDEHA

SECRETARIA GENERAL - MESA DE ENTRADA ÚNICA

EXPEDIENTE MEU Nº **17929/2025** **FECHA / HORA** 25/04/2025 12:51:31

Datos del Documento

TITULAR: MM S.A.

Nombre y Apellido	Número Telefónico	Correo electrónico
CECELIA VAZQUEZ	0975434270	

Referencia

LLAMADO N° 51/2024. SOLICITUD DE PAGO DEL CERTIFICADO DE OBRA N° 3.

Se remite a:

UNIDAD ADMINISTRATIVA Y CONTABLE

Procesado por: DMORAS
Fecha: 25/04/2025
Hora: 12:51:31

Abg. Diego Moras
M.O.P.C. - Dpto. Mesa de Entrada

Jefe/Encargado
Dpto. Mesa de Entrada Unica

ANEXO 001 - A
Presentación de Pedido de Pago de la empresa MM S.A.

Asunción, 24 de abril de 2025

Señora
Ing. CLAUDIA Mª DE LA PAZ CENTURIÓN, Ministro
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones
Presente

Ref.: REHABILITACIÓN Y PAVIMENTACIÓN DE TRAMOS CAMINEROS EN EL DEPARTAMENTO CENTRAL (PLAN CENTRAL 2) LOTE 3. ID N° 449.370.

Anexo: PEDIDO DE PAGO CERTIFICADO DE OBRA N° 3

Nos dirigimos a Usted, a fin de SOLICITAR EL PAGO DEL CERTIFICADO DE OBRA N° 3, cargo Fondo Local.

EL MONTO A SER PAGADO CON FONDO LOCAL, ES DE Gs.1.315.891.186(Guaraníes: un mil trescientos quince millones ochocientos noventa y un mil ciento ochenta y seis), IVA incluido.-

Los datos del presente pedido de pago son los siguientes:

OBJETO DEL INFORME:	
CONTRATISTA:	MM S.A.
RESOLUCIÓN DE ADJUDICACIÓN:	Resolución de Adjudicación N°1973/2024
FECHA DE CONTRATO:	09.diciembre.2024 - Contrato SG Ministro N° 325/2024
ORDEN DE INICIO CONTRATO:	09.enero.2025
DESCRIPCIÓN DE LA OBRA:	OBRA: REHABILITACIÓN Y PAVIMENTACIÓN DE TRAMOS CAMINEROS EN EL DEPARTAMENTO CENTRAL (PLAN CENTRAL 2) LOTE 3. ID N° 449.370.
% AVANCE FÍSICO FINANCIERO:	3,45%
PLAZO DE EJECUCIÓN:	Previsto: 19 meses
MONTO DEL CONTRATO:	79.419.204.780
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	FONDO LOCAL

Manifestamos en carácter de Declaración Jurada que de conformidad a las cláusulas contractuales, los Términos de Referencias y los Convenios Modificatorios suscritos y debidamente aprobados por el MOPC, el presente pedido de pago se ajusta al Contrato firmado entre el Ministerio y esta Contratista, y que los datos y valores expuestos han sido verificados, asumiendo toda responsabilidad civil y penal emergente.

Se adjuntan las documentaciones correspondientes debidamente foliadas en el anexo que forma parte de la presente nota.

Sin otro particular, le saludamos atentamente.

Ing. Carlos Chávez
FISCALIZACIÓN

27. veintisiete

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES PARAGUAY | PARAGUÁI TETÃ REMBIAPO HA MARANDU MOTENONDEHA | GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

CORRESPONDE AL EXPEDIENTE DCV N° 180/2025

M.E.U. N° 17.929 (25/04/2025)

Asuncion, 29 de Abril de 2025

INFORME DE LA DIRECCIÓN DE CAMINOS VECINALES

OBJETO DEL INFORME **DESCRIPCION DE LA OBRA**	CERTIFICADO Nº 3 MES MARZO 2.025 REHABILITACION Y PAVIMENTACION DE TRAMOS CAMINEROS EN EL DEPARTAMENTO CENTRAL (PLAN CENTRAL 2)
CONTRATISTA **MONTO DE LA FACTURA CREDITO ORIGINAL Nº 0000366**	MM S.A. Gs. 1.315.891.186.- (Guaranies, Mil Trescientos Quince Millones Ochocientos Noventa y Un Mil Ciento Ochenta y Seis)
MONTO DE LA FACTURA SIN IVA	Gs. 1.196.264.715 (Guaranies, Mil Ciento Noventa y Seis Millones Doscientos Sesenta y Cuatro Mil Setecientos Quince)
MONTO DEL IVA	Gs. 119.626.471 (Guaranies, Ciento Diecinueve Millones Seiscientos Veintiséis Mil Cuatrocientos Setenta y Un)
FUENTE DE FINANCIAMIENTO	**FONDO LOCAL**
% de AV. FISICO FIN. PROG. ACUM.	3,88 %
% de AV. FISICO FIN. EJEC. ACUM.	3,44 %
% de AV. FISICO FIN.EJEC. DEL MES	1,84 %
% de AV. TEOR. COR. POR LLUV. ACUM.	3,47 %
DATOS CONTRACTUALES	
FECHA DE RECEPCION Y APERTURA DE OFERTA:	26/07/2024
LICITACION PUBLICA NACIONAL:	MOPC Nº 51/2024
CODIGO DE CONTRATACIÓN:	LP-12013-24-249704
Nº y FECHA DEL CONTRATO:	S.G. MINISTRO Nº 325/2024 de fecha 09/12/2024
MONTO DEL CONTRATO ORIGINAL:	Gs. 79.419.204.782 (c/IVA)
RESOLUCIÓN DE ADJUDICACIÓN:	Nº 1973 de fecha 30/10/2024
PLAZO DE EJECUCIÓN :	18 meses
ORDEN DE INICIO:	09/01/2025
FECHA DE TERMINACION:	09/07/2026

Los trabajos y cantidades indicados en el certificado, como todo lo concerniente al mismo, son verificados y aprobados por la fiscalización. Al respecto la fiscalización manifiesta en carácter de declaración jurada que de conformidad a las clausulas contractuales , el presente pedido de pago se ajusta al contrato firmado entre el Ministerio y la empresa Contratista y que los datos y valores expuestos han sido debidamente verificados y constituyen el avance físico real de la obra, asumiendo toda la responsabilidad civil y penal emergente.

Se remite el presente certificado a **UNIDAD ADMINISTRATIVA Y CONTABLE - DCV** para proseguir los trámites administrativos correspondientes.

.....

Ing. Mario Alfredo Garcia Gonzalez
JEFE INTERINO/A

MOPC DPTO. DE EJECUCION DCV

Sr. Martin Dario Obando Ferreira 29/04/2025 11:46:44

MMSA
CONSTRUCTORA

CONTRATO N° 325/2024 - LLAMADO MOPC N° 51/2024 LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL PARA LA REHABILITACIÓN Y PAVIMENTACIÓN DE TRAMOS CAMINEROS EN EL DEPARTAMENTO CENTRAL (PLAN CENTRAL 2) AD REFERENDUM A LA REPROGRAMACIÓN PRESUPUESTARIA

CERTIFICADO N° 3 – MARZO 2025

26 veintiseis

ANEXO 001 - A
Presentación de Pedido de Pago de la empresa MM S.A.

Asunción, 24 de abril de 2025

Señora
Ing. CLAUDIA Mª DE LA PAZ CENTURIÓN, Ministro
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones
Presente

Ref.: REHABILITACIÓN Y PAVIMENTACIÓN DE TRAMOS CAMINEROS EN EL DEPARTAMENTO CENTRAL (PLAN CENTRAL 2) LOTE 3. ID N° 449.370.

Anexo: PEDIDO DE PAGO CERTIFICADO DE OBRA N° 3

Nos dirigimos a Usted, a fin de SOLICITAR EL PAGO DEL CERTIFICADO DE OBRA N° 3, cargo Fondo Local.

EL MONTO A SER PAGADO CON FONDO LOCAL, ES DE Gs.1.315.891.186(Guaraníes: un mil trescientos quince millones ochocientos noventa y un mil ciento ochenta y seis), IVA incluido.-

Los datos del presente pedido de pago son los siguientes:

OBJETO DEL INFORME:	
CONTRATISTA:	MM S.A.
RESOLUCIÓN DE ADJUDICACIÓN:	Resolución de Adjudicación N°1973/2024
FECHA DE CONTRATO:	09.diciembre.2024 - Contrato SG Ministro N° 325/2024
ORDEN DE INICIO CONTRATO:	09.enero.2025
DESCRIPCIÓN DE LA OBRA:	OBRA: REHABILITACIÓN Y PAVIMENTACIÓN DE TRAMOS CAMINEROS EN EL DEPARTAMENTO CENTRAL (PLAN CENTRAL 2) LOTE 3. ID N° 449.370.
% AVANCE FÍSICO FINANCIERO:	3,45%
PLAZO DE EJECUCIÓN:	Previsto: 19 meses
MONTO DEL CONTRATO:	79.419.204.780
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	FONDO LOCAL

Manifestamos en carácter de Declaración Jurada que de conformidad a las cláusulas contractuales, los Términos de Referencias y los Convenios Modificatorios suscritos y debidamente aprobados por el MOPC, el presente pedido de pago se ajusta al Contrato firmado entre el Ministerio y esta Contratista, y que los datos y valores expuestos han sido verificados, asumiendo toda responsabilidad civil y penal emergente.

Se adjuntan las documentaciones correspondientes debidamente foliadas en el anexo que forma parte de la presente nota.

Sin otro particular, le saludamos atentamente.

Ing. Carlos Chávez
FISCALIZACIÓN

25 veinticinco

REHABILITACION Y PAVIMENTACION DE TRAMOS CAMINEROS EN EL DEPARTAMENTO CENTRAL (PLAN CENTRAL 2)

MM S.A.

COD. 8912025

24 (veinticuatro)

MMSA CONSTRUCTORA

Email: mmsa.const@gmail.com
Tel: (021) 298 999
Ruta Transchaco N° 1435 c/ Gonzalez Belotto
Asunción – Paraguay

Asunción, 24 de abril de 2025

NOTA N° 37/2025

Señor
Ing. Carlos Chávez
Fiscalizador de Obras.
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones
Presente

Ref.: LLAMADO MOPC N° 51/2024 LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL PARA LA REHABILITACIÓN Y PAVIMENTACIÓN DE TRAMOS CAMINEROS EN EL DEPARTAMENTO CENTRAL (PLAN CENTRAL 2) - ID N° 449.370.

Obj.: Solicitud de pago de factura cargo Fondo Local, Certificado de Obra N° 3

Anexo: Un Original y Una copia, Certificado de Obra N° 3

Nos dirijimos a Usted, a fin de solicitar el pago de la factura por valor de 1.315.891.186(Guaraníes: un mil trescientos quince millones ochocientos noventa y un mil ciento ochenta y seis), IVA incluido, correspondiente a la porción pagada con FONDO LOCAL, amparado por el Certificado de Obra Nº 3 (marzo/2025), remitido en anexo.-

Los datos del presente pedido de pago se consignan en el presente Cuadro:

OBJETO DEL INFORME:	Pedido de Pago del Certificado de Obra Nº 3 - marzo/2025
DESCRIPCIÓN DE LA OBRA:	LLAMADO MOPC N° 51/2024 LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL PARA LA REHABILITACIÓN Y PAVIMENTACIÓN DE TRAMOS CAMINEROS EN EL DEPARTAMENTO CENTRAL (PLAN CENTRAL 2) - ID N° 449.370. - Contrato SG Ministro N° 325/2024 - Resolución de Adjudicación N° 1973/2024 del 30 de octubre 2024.-
CONTRATISTA:	MMS.A.
MONTO:	1.315.891.186
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	FONDO LOCAL
% AVANCE FÍSICO FINANCIERO:	3,45%
FECHA DE CONTRATO:	9/12/2024
DECRETO DE ADJUDICACIÓN:	Resolución de Adjudicación N° 2991/2022
PLAZO DE EJECUCIÓN:	18,00 Meses
ORDEN DE INICIO CONTRATO:	9/1/2025
ORDEN DE INICIO FÍSICO:	9/4/2025

Manifestamos en carácter de Declaración Jurada, que, de conformidad con las Cláusulas Contractuales, los Términos de Referencias, y las Ordenes de Modificación suscritas y aprobadas por el MOPC, el presente Pedido de Pago se ajusta al Contrato firmado entre el Ministerio y la Empresa Contratista, y que los datos y valores en el expuestos han sido debidamente verificados y constituyen el Avance Físico real de la Obra, asumiendo toda responsabilidad civil y penal emergente de las mismas.

Se adjuntan 24 (veinticuatro) hojas con las documentaciones correspondintes debidamente foliadas en el anexo que forma parte de la presente Nota.

Sin otro particular le saludamos atentamente.

MMSA
Ing. Jorge Moreno
Representante Legal

Ing. Jorge A. Moreno M.
Representante Legal

23 (Veinti tres)

ORIGINAL

ANEXO 001 - B

PRESENTACION DE PEDIDO DE PAGO

Certificado N° 03 (tres) Mes/Año: MARZO/2025 % Avance Fisico: 3,45%

Descripcion de la Obra: LLAMADO MOPC N° 51/2024 LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL PARA LA REHABILITACIÓN Y PAVIMENTACIÓN DE TRAMOS CAMINEROS EN EL DEPARTAMENTO CENTRAL (PLAN CENTRAL 2) - ID N° 449.370. - Contrato SG Ministro N° 325/2024 - Resolución de Adjudicación N° 1973/2024 del 30 de octubre 2024.-

Empresa Contratista: **MM SA**

Monto Solicitado: Gs 1.315.891.186 — Son GUARANIES: un mil trescientos quince millones ochocientos noventa y un mil ciento ochenta y seis .-

Fuente de Financiamiento: AD REFERENDUM A LA REPROGRAMACIÓN PRESUPUESTARIA (Gs)

	RECAUDOS REMITIDOS	SI	NO	N/A	OBSERVACION
1	Nota de pedido de pago de la Contratista	√			Folio 024 al 023
2	Factura Crédito (Numerada)	√			Folio 022 al 020
3	Certificado de Obra	√			Folio 019 al 015
4	Certificado de Reajuste		√		
5	Acta y Hojas de Medición por items de Obra	√			Folio 014 al 012
6	Cronograma de Avance Físico Financiero	√			Folio 011 al 010
7	Planilla de Lluvia	√			Folio 009 al 008
8	Certificado de Cumplimiento Tributario al dia	√			Folio 007 al 006
9	Copia Autenticada de Polizas vigentes	√			Folio 005 al 004
10	Planilla de Personales	√			Folio 003 al 001
11	Planilla de Equipos		√		
12	Ordenes de Trabajo Extra / Ordenes de Cambio / Acuerdos Suplementarios / Convenio Modificatorio			√	
13	Nota de Presentación del Informe Ambiental a la Fiscalización		√		
14	Calendario de Pago de Cuotas según Contrato			√	
15	Planilla de Certificación			√	
16	Decreto / Resolución que autoriza el Contrato (para Anticipos)		√		
17	Poder Legal otorgado por la Empresa a su representante (para Anticipos)		√		
18	Escritura de Constitución del Consorcio debidamente legalizado (para Anticipos)		√		
19	Copia de Contrato Protocolizado (para Anticipos)		√		
20	Orden de Inicio o Proceder (para Anticipos)			√	
21	Informe de Avance			√	
22	Anexos			√	

Observaciones Generales:

MMSA
Ing. Jorge Moreno
Representante Legal

Ing. Jorge A. Moreno M.
Representante Legal
MM SA

22 (Veintidos)

MMSA
CONSTRUCTORA

CONTRATO N° 325/2024 - LLAMADO MOPC N° 51/2024 LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL PARA LA REHABILITACIÓN Y PAVIMENTACIÓN DE TRAMOS CAMINEROS EN EL DEPARTAMENTO CENTRAL (PLAN CENTRAL 2) AD REFERENDUM A LA REPROGRAMACIÓN PRESUPUESTARIA

FACTURA A CRÉDITO Gs.

21 (Veintiuno).

MMSA CONSTRUCTORA

KuDE de FACTURA ELECTRÓNICA

MM SA

CONSTRUCCIÓN DE CARRETERAS Y VÍAS FÉRREAS, PUENTES Y TÚNELES
CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS
INVERSORES DE EMPRENDIMIENTOS INMOBILIARIOS
INSTALACIONES ELÉCTRICAS, ELECTROMECÁNICAS Y ELECTRÓNICAS
CONSTRUCCIÓN DE PROYECTOS DE SERVICIOS PÚBLICOS

RUC : 80013212-2
Timbrado: 16093186
Inicio 19/12/2022
FACTURA ELECTRÓNICA
001 - 001 - 0000366

Dirección : RUTA Nº 3 GRAL. ELIZARDO AQUINO Nº 1435 ESQ. GONZALEZ BELOTTO Nro: 1435
Teléfono : 0986340849
Correo Electrónico: hparedes@mmsa.com.py

Fecha y hora de 24/04/2025
RUC/documento de identidad No: 80004239-5
Nombre o razón social: M.O.P.C
Direccion GRAL DIAZ 411

Condición de venta: Crédito
Cuotas: 0
Moneda: Guarani
Tipo de operación: Prestación de servicios

Cantidad	Descripción	Precio	Descuento	Exentas	5%	10%
1	LLAMADO MOPC N° 51/2024 LICITACION PUBLICA NACIONAL PARA LA REHABILITACION Y PAVIMENTACION DE TRAMOS CAMINEROS EN EL3DEPARTAMENTO CENTRAL (PLAN CENTRAL 02) ID 449.370 CONTRATO SG MINISTRO N°325/2024 CERTIFICADO DE OBRA N° 03 MARZO 2025 GS.1.462.101.318 DEVOLUCION ANTICIPO 10% GS. 146.210.132 RETENCION CAUCIONAL 5% GS. 73.105.066.- TOTAL FACTURA GS. 1.315.891.186.-	1.315.891.186	0	0	0	1.315.891.186

SUBTOTAL: 1.315.891.186
TOTAL DE LA OPERACIÓN: 1.315.891.186
TOTAL EN GUARANÍES: 1.315.891.186
TOTAL EN LETRAS: MIL TRESCIENTOS QUINCE MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y UN MIL CIENTO OCHENTA Y SEIS

LIQUIDACIÓN IVA: **5%** 0 **10%** 119.626.471 **TOTAL IVA** 119.626.471

Consulte la validez de esta Factura Electrónica con el número de CDC
https://ekuatia.set.gov.py/consultas/

01800132122001001000036612025042411475541839

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE UN DOCUMENTO

Si su documento electrónico presenta algún error, podrá solicitar la modificación dentro de las 72 horas siguientes de la emisión de este comprobante

MMSA
Ing. Jorge Moreno
Representante Legal

20 (veinte)

COD. 8912025

CONTRATISTA	FISCALIZACIÓN	CERTIFICADO MENSUAL DE OBRAS
MM S.A. RUTA TRANSCHACO N°1.435 - ASUNCIÓN - PARAGUAY Tel: 292583/294579 Email: mmsa.const@gmail.com	Tel:	**Certificado N°:** 3 **Mes/Año:** Marzo/2025

		AVANCES (%)	Del mes:	Acumulado
FECHA DE CONTRATO:	09/12/2024	A. Prog. Contract.	0, 14 %	3, 88 %
ORDEN DE INICIO:	09/01/2025	Avance ejecutado	1, 84 %	3, 44 %
PLAZO CONTRACTUAL:	18 Meses	Teórico	1, 87 %	3, 47 %
MONTO CONTRACTUAL (Sin IVA):	Gs 72.199.277.075			
MONTO CONTRACTUAL (Con IVA):	Gs 79.419.204.782			

	MONTO TOTAL DE LOS TRABAJOS DEL MES	TOTAL GS.
A	1. Monto total de los trabajos a la fecha	2.736.885.466
	2. Monto total del los trabajos al mes anterior	1.274.784.148
	3. Monto de los trabajos del mes	1.462.101.318
	1. Trabajos por administración (IVA incluido)	0
	2. Acopio de material (IVA incluido)	0
	3. Certificado del mes	1.462.101.318

	DETALLE DE LA FACTURA	TOTAL GS.
B	1. Monto del certificado del mes (IVA incluido)	1.462.101.318
	2. Ajuste del mes (IVA incluido)	0
	3. Regularización de reajuste ()	0
	4. Total básico + ajustes (IVA incluido)	1.462.101.318
	5. Devolución de anticipo (10%)	-146.210.132
	6. Retención de garantía (5%)	-73.105.066
	7. Penalización (según C.E.C.) (IVA incl.)	0
	8. Monto líquido de la factura (IVA incluido)	1.315.891.186
	9. Son guaránies: Mil trescientos quince millones ochocientos noventa y un mil ciento ochenta y seis	

ING. CARLOS EDUARDO CHAVEZ COLMAN
FISCALIZADOR/A DE OBRA
MOPC

MMSA
Ing. Pedro Rapetti
Residente de Obra
ING. PEDRO NICOLAS RAPETTI
INGENIERO RESIDENTE DE OBRA
MM S.A.

19 (DIECINUEVE)

MMSA
CONSTRUCTORA

CONTRATO N° 325/2024 - LLAMADO MOPC N° 51/2024 LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL PARA LA REHABILITACIÓN Y PAVIMENTACIÓN DE TRAMOS CAMINEROS EN EL DEPARTAMENTO CENTRAL (PLAN CENTRAL 2) AD REFERENDUM A LA REPROGRAMACIÓN PRESUPUESTARIA

CERTIFICADO MENSUAL DE OBRAS N° 3 – MES DE MARZO DE 2025

18
(dieciocho)

COD. 8912025

CONTRATISTA	FISCALIZACIÓN	CERTIFICADO MENSUAL DE OBRAS
MM S.A. RUTA TRANSCHACO N°1.435 - ASUNCIÓN - PARAGUAY Tel: 292583/294579 Email: mmsa.const@gmail.com	Tel:	**Certificado N°:** 3 **Mes/Año:** Marzo/2025

		AVANCES (%)	Del mes:	Acumulado
FECHA DE CONTRATO:	09/12/2024	A. Prog. Contract.	0,14 %	3,88 %
ORDEN DE INICIO:	09/01/2025	Avance ejecutado	1,84 %	3,44 %
PLAZO CONTRACTUAL:	18 Meses	Teórico	1,87 %	3,47 %
MONTO CONTRACTUAL (Sin IVA):	Gs 72.199.277.075			
MONTO CONTRACTUAL (Con IVA):	Gs 79.419.204.782			

ESTADISTICOS

I	**ANTICIPO**	**TOTAL GS.**
	1. Anticipo 10% Monto Total Obra (I.V.A. incluido)	7.941.920.478
	2. Devolución del Anticipo acumulada hasta el certif. ant. (IVA inc.)	127.478.414
	3. Devolución del Anticipo del presente certif. (IVA inc.)	146.210.132
	4. Devolución del Anticipo acumulada hasta el presente certif. (IVA inc.)	273.688.546
	5. Saldo del Anticipo (IVA inc.)	7.668.231.932
II	**TRABAJOS POR ADMINISTRACION Y ACOPIOS**	**TOTAL GS.**
	1. Monto del mes	0
	2. Monto acumulado anterior	0
	3. Monto acumulado	0
III	**RETENCIONES**	**TOTAL GS.**
	1. Retenciones del mes	73.105.066
	2. Retenciones acumuladas hasta el mes anterior	63.739.208
	3. Devolución de retenciones	0
	4. Retenciones acumuladas	136.844.274
IV	**AJUSTES**	**TOTAL GS.**
	1. Ajustes del mes	0
	2. Regularizacion de reajuste	0
	3. Ajustes acumulados hasta el mes anterior	0
	4. Ajustes acumulados	0
V	**PENALIZACION**	**TOTAL GS.**
	1. Penalización del mes	0
	2. Devolución de penalizaciones del mes	0
	3. Penalizaciones acumuladas hasta el mes anterior	0
	4. Devolución de penalizaciones acumuladas hasta el mes anterior	0
	5. Penalizaciones acumuladas	0
VI	**RESUMEN**	**TOTAL GS.**
	1. Monto de los trabajos facturados hasta la fecha	2.736.885.466
	2. Trabajos por administración	0
	3. Acopio de material	0
	4. Saldo del anticipo	7.668.231.932
	5. Ajustes acumulados	0
	6. Retenciones acumuladas	136.844.274
	7. Penalizaciones acumuladas	0
	8. Monto total facturado hasta la fecha	10.405.117.398

ING. CARLOS EDUARDO CHAVEZ COLMAN
FISCALIZADOR/A DE OBRA
MOPC

MMMSA
Ing. Pedro Rapetti
ING. PEDRO NICOLAS RAPETTI
INGENIERO RESIDENTE DE OBRA
MM S.A.

COD. 8912025

CONTRATISTA **MM S.A.** RUTA TRANSCHACO N°1.435 - ASUNCIÓN - PARAGUAY Tel: 292583/294579 Email: mmsa.const@gmail.com	**MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES** **DIRECCIÓN DE CAMINOS VECINALES** **CONTRATO S.G. MINISTRO N° 325/2024**	**FISCALIZACIÓN: MOPC** Tel:
	OBRA: REHABILITACION Y PAVIMENTACION DE TRAMOS CAMINEROS EN EL DEPARTAMENTO CENTRAL (PLAN CENTRAL 2) **Longitud Total: 27,320 Km**	**CERTIFICADO MENSUAL DE OBRAS** **Certificado N°:** 3 **Mes/Año:** Marzo/2025

RESOL. MINISTERIAL N°:	1973/2024	**FECHA PRESENTACION DE OFERTA:**	26/07/2024
FECHA DE CONTRATO:	09/12/2024	**ORDEN DE INICIO:**	09/01/2025
MONTO CONTRACTUAL (Sin IVA):	Gs 72.199.277.075	**PLAZO CONTRACTUAL:**	18 Meses
MONTO CONTRACTUAL (Con IVA):	Gs 79.419.204.782	**PLAZO VIGENTE:**	18 Meses

AVANCES (%)	**Del mes:**	**Acumulado**
A. Prog. Contract.	0,14 %	3,88 %
Avance ejecutado	1,84 %	3,44 %
Teórico	1,87 %	3,47 %

DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM	U/M	Cantidad		Cantidades certificadas			% Ejec.	Precio Unitario (Gs.)	MONTO DE CERTIFICACIÓN EN GUARANIES		
		Contractual	C.M.	ANTERIOR	PRESENTE	ACUMULADO			ANTERIOR	PRESENTE	ACUMULADO
LOTE N°3 DISTRITO DE CAPIATA LONG. 27,32 KM											
1 ITEMS CONTRACTUALES											**3,45 %**
1.1 Proyecto Básico	km	27,32	--	--	26,52	26,52	97,07 %	9.942.543	--	263.676.240	263.676.240
1.2 Limpieza y Despeje de Franja de dominio	ha	1,69	--	--	--	--	0,00 %	7.349.025	--	--	--
1.3 Excavación no clasificada	m3	2.500,00	--	--	--	--	0,00 %	29.671	--	--	--
1.4 Excavación estructural	m3	867,95	--	--	--	--	0,00 %	51.922	--	--	--
1.5 Excavación de zanjas de drenajes	m3	423,00	--	--	--	--	0,00 %	41.537	--	--	--
1.6 Excavación de bolsones	m3	1.231,20	--	--	--	--	0,00 %	34.615	--	--	--
1.7 Empedrado	m2	21.432,00	--	--	--	--	0,00 %	67.910	--	--	--
1.8 Bacheo de empedrado existente (5%)	m2	9.895,60	--	--	--	--	0,00 %	85.721	--	--	--
1.9 Remoción de empedrado existente	m2	45,00	--	--	--	--	0,00 %	37.099	--	--	--
1.10 Levantar Registro Cloacal con Base Tipo Anillo de H°A° fck=21 MPa	und	3,00	--	--	--	--	0,00 %	1.778.237	--	--	--
1.11 Terraplén (CBR>15, Espesor mínimo =30cm)	m3	28.931,60	--	--	--	--	0,00 %	60.766	--	--	--
1.12 Banquina de suelo seleccionado (CBR>15)	m3	1.386,00	--	--	--	--	0,00 %	60.766	--	--	--
1.13 Cordón de Hormigón Simple	ml	13.784,00	--	--	--	--	0,00 %	94.900	--	--	--
1.14 Cordón Cuneta de Hormigón	m3	7.066,20	--	--	--	--	0,00 %	1.350.021	--	--	--
1.15 Cuneta Revestida de Hormigón	m3	214,40	--	--	--	--	0,00 %	1.592.917	--	--	--
1.16 Sub Base Macadam Hidráulico	m3	6.238,38	--	--	--	--	0,00 %	330.959	--	--	--

17 (Diecisiete)

ING. CARLOS EDUARDO CHAVEZ COLMAN
FISCALIZADOR/A DE OBRA
MOPC

MMMSA
Ing. Pedro Rapetti
Residente de Obra

ING. PEDRO NICOLAS RAPETTI
INGENIERO RESIDENTE DE OBRA
MM S.A.

1.17 Base granular estabilizada	m3	6.238,38	--	--	--	--	0,00 %	400.320	--	--	--
1.18 Regularización de concreto asfaltico (60 kg/m2)	tn	13.725,12	--	--	--	--	0,00 %	818.444	--	--	--
1.19 Riego de liga	m2	228.752,00	--	--	--	--	0,00 %	8.080	--	--	--
1.20 Riego de imprimación (1,6 Lt/m2)	lts	366.003,20	--	--	--	--	0,00 %	14.774	--	--	--
1.21 Carpeta de Concreto Asfaltico (e=4cm)	m3	9.096,48	--	--	--	--	0,00 %	1.989.672	--	--	--
1.22 Banquina de Concreto Asfaltico (e=2cm)	m3	26,80	--	--	--	--	0,00 %	1.989.672	--	--	--
1.23 Pavimento de Losas Cortas	m2	198,00	--	--	--	--	0,00 %	702.909	--	--	--
1.24 Badén de Hormigón Armado fck= 18Mpa	m3	1.223,76	--	--	--	--	0,00 %	2.844.838	--	--	--
1.25 Alcantarilla Tubular Simple D= 0,80 m	ml	90,00	--	--	--	--	0,00 %	3.381.203	--	--	--
1.26 Alcantarilla Tubular Simple D= 1,00 m	ml	92,00	--	--	--	--	0,00 %	4.267.661	--	--	--
1.27 Alcantarilla Tubular Doble D= 1,00m	ml	66,00	--	--	--	--	0,00 %	7.748.957	--	--	--
1.28 Alcantarilla Tubular Triple D= 1,00m	ml	55,00	--	--	--	--	0,00 %	11.173.405	--	--	--
1.29 Alcantarilla Tubular Simple D= 1.20m	ml	70,00	--	--	--	--	0,00 %	6.244.409	--	--	--
1.30 Alcantarilla Tubular Triple D= 1,20 m	ml	33,00	--	--	--	--	0,00 %	14.093.529	--	--	--
1.31 Alcantarilla Celular de 1,0 x 1,0 m	ml	212,00	--	--	--	--	0,00 %	6.964.275	--	--	--
1.32 Alcantarilla Celular Triple de 1,0 x 1,0 m	ml	10,00	--	--	--	--	0,00 %	14.322.595	--	--	--
1.33 Alcantarilla Celular de 1,5 x 1,5 m	ml	50,00	--	--	--	--	0,00 %	9.630.431	--	--	--
1.34 Alcantarilla Celular Doble de 1,5 x 1,5 m	ml	33,00	--	--	--	--	0,00 %	13.349.709	--	--	--
1.35 Alcantarilla Celular Triple de 1,5 x 1,5 m	ml	11,00	--	--	--	--	0,00 %	18.382.426	--	--	--
1.36 Alcantarilla Celular de 2,0 x 2,0 m	ml	11,00	--	--	--	--	0,00 %	10.644.995	--	--	--
1.37 Alcantarilla Celular Doble de 2,0 x 2,0 m	ml	11,00	--	--	--	--	0,00 %	16.643.079	--	--	--
1.38 Alcantarilla Celular Triple de 2,0 x 2,0 m	ml	11,00	--	--	--	--	0,00 %	22.641.901	--	--	--
1.39 Alcantarilla Celular Simple de 3,0 x 3,0 m	ml	11,00	--	--	--	--	0,00 %	24.385.356	--	--	--
1.40 Alcantarilla Celular Triple de 3,0 x 3,0 m	ml	11,00	--	--	--	--	0,00 %	40.656.884	--	--	--
1.41 Sumidero	und	9,00	--	--	--	--	0,00 %	23.715.924	--	--	--
1.42 Dren profundo	ml	30,00	--	--	--	--	0,00 %	481.923	--	--	--
1.43 Vereda de hormigón fck= 180 kg/cm2 e= 0,10 m	m2	4.170,00	--	--	--	--	0,00 %	173.602	--	--	--
1.44 Barandas metálicas para defensa, tipo "FLEX BEAM"	ml	55,00	--	--	--	--	0,00 %	383.339	--	--	--
1.45 Reductores de velocidad de concreto asfaltico	ml	200,00	--	--	--	--	0,00 %	557.109	--	--	--

16 (DECISÓN)

ING. CARLOS EDUARDO CHAVEZ COLMAN
FISCALIZADOR/A DE OBRA
MOPC

MMSA
Ing. Pedro Rapetti
Residente de Obra

ING. PEDRO NICOLAS RAPETTI
INGENIERO RESIDENTE DE OBRA
MM S.A.

1.46 Revestimiento vegetal con tepes	m2	150,00	--	--	--	--	0,00 %	14.497	--	--	--
1.47 Reposición de cañerías de red de agua, d=40mm, incluye accesorios	ml	9.518,00	--	--	--	--	0,00 %	65.159	--	--	--
1.48 Señalización vertical	m2	1.909,60	--	--	--	--	0,00 %	1.840.785	--	--	--
1.49 Señalización horizontal	m2	9.548,00	--	--	--	--	0,00 %	51.814	--	--	--
1.50 Tachas reflectivas	und	6.022,00	--	--	--	--	0,00 %	32.394	--	--	--
1.51 Tachones reflectivos	und	600,00	--	--	--	--	0,00 %	95.665	--	--	--
1.52 Traslado de Alambrado	ml	1.800,00	--	--	--	--	0,00 %	48.854	--	--	--
1.53 Alambrado Nuevo	ml	1.200,00	--	--	--	--	0,00 %	57.211	--	--	--
1.54 Traslado de columnas de ANDE MT	und	14,00	--	--	--	--	0,00 %	9.102.189	--	--	--
1.55 Traslado de línea eléctrica	ml	750,00	--	--	--	--	0,00 %	141.600	--	--	--
1.56 Remoción de estructuras existentes	m3	202,24	--	--	--	--	0,00 %	1.195.426	--	--	--
1.57 Losa Base de H°A° para accesos a viviendas fck=18 MPa	m3	106,44	--	--	--	--	0,00 %	3.089.807	--	--	--
1.58 Muro de Piedra Bruta para accesos a viviendas	m3	392,60	--	--	--	--	0,00 %	901.761	--	--	--
1.59 Losa de H°A° para accesos a viviendas fck=21 MPa	m3	50,76	--	--	--	--	0,00 %	3.099.704	--	--	--
1.60 Instalación y Servicios especializados	mes	18,00	--	2,00	1,00	3,00	16,67 %	76.359.071	152.718.142	76.359.071	229.077.213
1.61 Cartel de obra	und	52,00	--	--	--	--	0,00 %	4.772.405	--	--	--
1.62 Mitigación Ambiental	gl	1,00	--	--	--	--	0,00 %	748.044.004	--	--	--
1.63 Movilización (3%)	gl	1,00	--	0,5000	0,5000	1,0000	100,00 %	2.244.132.013	1.122.066.006	1.122.066.007	2.244.132.013
TOTAL PROGRAMADO ITEMS CONTRACTUALES SEGUN CANTIDADES CONTRACTUALES											**79.419.204.782**
TOTAL EJECUTADO ACUMULADO									**1.274.784.148**	**1.462.101.318**	**2.736.885.466**
TOTAL GENERAL (SIN IVA)									**1.158.894.680**	**1.329.183.016**	**2.488.077.696**
IVA (10%)									**115.889.468**	**132.918.302**	**248.807.770**
TOTAL GENERAL (CON IVA)									**1.274.784.148**	**1.462.101.318**	**2.736.885.466**

15 (Quince)

ING. CARLOS EDUARDO CHAVEZ COLMAN
FISCALIZADOR/A DE OBRA
MOPC

MMSA
Ing. Pedro Rapetti
Residente de Obra

ING. PEDRO NICOLAS RAPETTI
INGENIERO RESIDENTE DE OBRA
MM S.A.

14 (catorce)

MMSA
CONSTRUCTORA

CONTRATO N° 325/2024 - LLAMADO MOPC N° 51/2024 LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL PARA LA REHABILITACIÓN Y PAVIMENTACIÓN DE TRAMOS CAMINEROS EN EL DEPARTAMENTO CENTRAL (PLAN CENTRAL 2) AD REFERENDUM A LA REPROGRAMACIÓN PRESUPUESTARIA

HOJA DE MEDICIÓN

ACTA DE MEDICIÓN

13(Trece)

COD. 8912025

CONTRATISTA MM S.A. RUTA TRANSCHACO N°1.435 - ASUNCIÓN - PARAGUAY Tel: 292583/294579 Email: mmsa.const@gmail.com	M.O.P.C. Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones DIRECCIÓN DE CAMINOS VECINALES	FISCALIZACIÓN MOPC Tel:

ACTA DE MEDICION
Certificado de Trabajo N° 3 Marzo/2025

AVANCES (%)	Del mes:	Acumulado:
A. Prog. Contract.	0,14 %	3,88 %
Avance ejecutado	1,84 %	3,44 %
Teórico	1,87 %	3,47 %

En la localidad de CAPIATÁ, Departamento de CENTRAL, a los 21 dias del mes de Abril del año 2025, se reúnen, por una parte, el ING. CARLOS EDUARDO CHAVEZ COLMAN, FISCALIZADOR/A DE OBRA, en representación de MOPC y el ING. PEDRO NICOLAS RAPETTI, INGENIERO RESIDENTE DE OBRA, en representación de MM S.A.; Obra: "REHABILITACION Y PAVIMENTACION DE TRAMOS CAMINEROS EN EL DEPARTAMENTO CENTRAL (PLAN CENTRAL 2)", que suscriben el presente Acta, han procedido a la verificación de los trabajos ejecutados en obra durante el mes de Marzo del año 2025.-

De acuerdo a las C.G.C., las cantidades que figuran en el acta del presente certificado no tienen carácter definitivo, por lo tanto cualquier error u omisión serán rectificados en los próximos certificados. Los ítems ejecutados son los siguientes:

Item N°	Descripción de los trabajos	U/M	Cantidades		Cantidades ejecutadas			
			Contractual	C.M.	Anterior	Presente	Acumulado	% Ejecut.
LOTE N°3 DISTRITO DE CAPIATA LONG. 27,32 KM								
1	ITEMS CONTRACTUALES							
1.1	Proyecto Básico	km	27,32	--	0,00	26,52	26,52	97,072 %
1.60	Instalación y Servicios especializados	mes	18,00	--	2,00	1,00	3,00	16,667 %
1.63	Movilización (3%)	gl	1,00	--	0,5000	0,5000	1,0000	100,000 %

ING. CARLOS EDUARDO CHAVEZ COLMAN
FISCALIZADOR/A DE OBRA
MOPC

MMSA
Ing. Pedro Rapetti
Residente de Obra

ING. PEDRO NICOLAS RAPETTI
INGENIERO RESIDENTE DE OBRA
MM S.A.

12 (Doce)

COD. 8912025

CONTRATISTA MM S.A. RUTA TRANSCHACO N°1.435 - ASUNCIÓN - PARAGUAY Tel: 292583/294579 Email: mmsa.const@gmail.com	M.O.P.C. Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones DIRECCIÓN DE CAMINOS VECINALES	FISCALIZACIÓN Tel:
Obra: REHABILITACION Y PAVIMENTACION DE TRAMOS CAMINEROS EN EL DEPARTAMENTO CENTRAL (PLAN CENTRAL 2)	**Fecha orden inicio:** 09/01/2025 **Plazo contractual:** 18 Meses	**Certificado Nº:** 3 **Mes/Año:** Marzo/2025

HOJA DE MEDICIÓN

Item N°	Descripción - Unidad de medida

LOTE N°3 DISTRITO DE CAPIATA LONG. 27,32 KM

1.1	Proyecto Básico					
	Progresiva			Total certificado		
	Desde	Hasta	Obs.	Anterior	Presente	Acumulado
	0+000	26+520		0,000	26,520	26,520
	Total hasta el presente certificado			0,000	26,520	26,520

1.60	Instalación y Servicios especializados					
	Progresiva			Total certificado		
	Desde	Hasta	Obs.	Anterior	Presente	Acumulado
		COTA N° 3		0,000	1,000	1,000
	Total hasta el presente certificado			0,000	1,000	1,000

1.63	Movilización (3%)					
	Progresiva			Total certificado		
	Desde	Hasta	Obs.	Anterior	Presente	Acumulado
		COTA N° 3		0,0000	0,5000	0,5000
	Total hasta el presente certificado			0,0000	0,5000	0,5000

MMSA
Ing. Pedro Rapetti
Ingeniero de Obra

ING. PEDRO NICOLAS RAPETTI
INGENIERO RESIDENTE DE OBRA
MM S.A.

11 (Once)

MMSA
CONSTRUCTORA

CONTRATO N° 325/2024 - LLAMADO MOPC N° 51/2024 LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL PARA LA REHABILITACIÓN Y PAVIMENTACIÓN DE TRAMOS CAMINEROS EN EL DEPARTAMENTO CENTRAL (PLAN CENTRAL 2) AD REFERENDUM A LA REPROGRAMACIÓN PRESUPUESTARIA

CURVA DE AVANCE FÍSICO – FINANCIERA

COD. 8912025

Curva de avance físico financiero - MM S.A. - Certificado N°: 3 - Marzo/2025

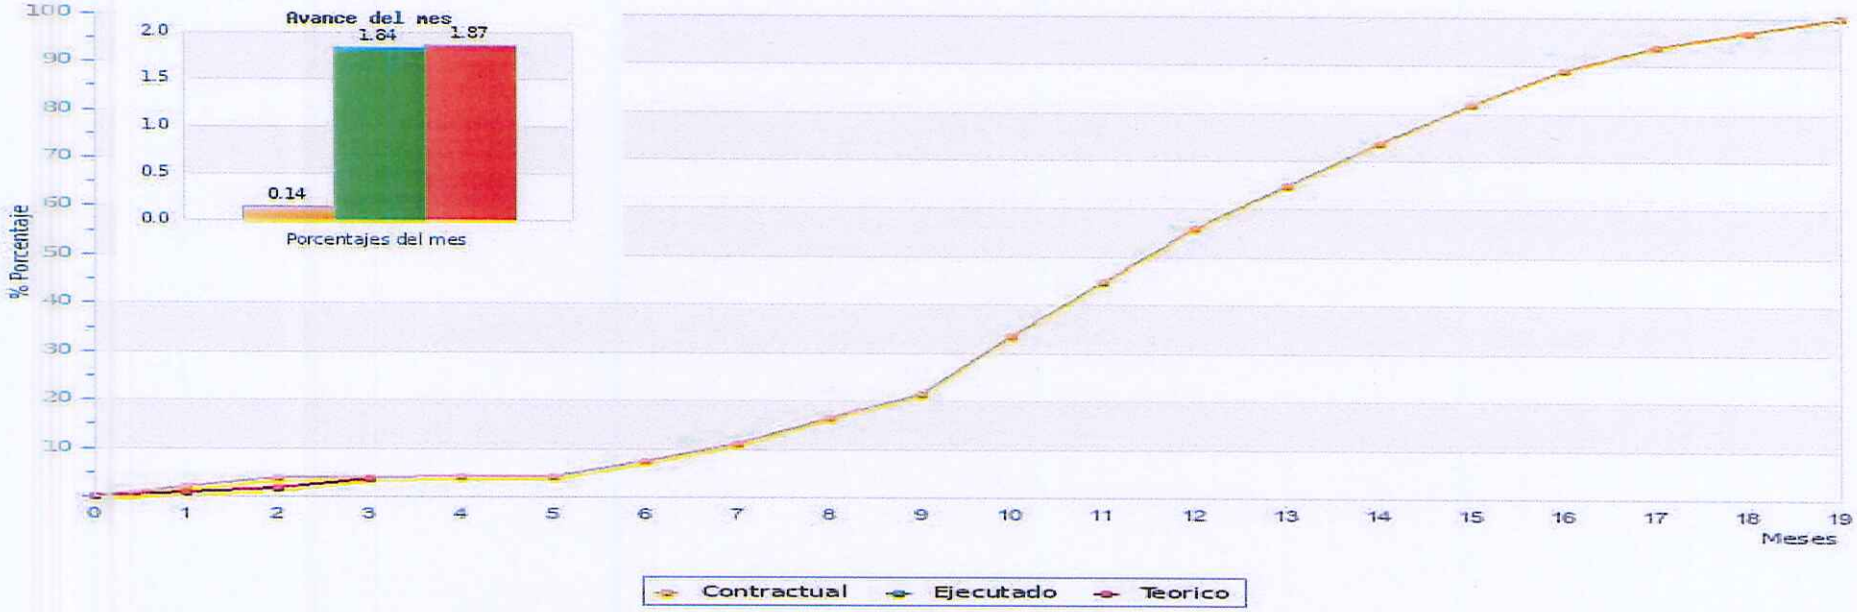

Porcentajes acumulados

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Contr. Parcial	1,87 %	1,87 %	0,14 %	0,17 %	0,17 %	3,17 %	3,50 %	5,47 %	5,14 %	11,90 %	11,33 %	11,38 %	8,62 %	8,97 %	8,22 %	7,13 %	4,81 %	3,07 %	3,07 %
Contr. Acum.	1,87 %	3,74 %	3,88 %	4,05 %	4,22 %	7,39 %	10,89 %	16,36 %	21,50 %	33,40 %	44,73 %	56,11 %	64,73 %	73,70 %	81,92 %	89,05 %	93,86 %	96,93 %	100,00 %
Ejec. Parcial	0,80 %	0,80 %	1,84 %																
Ejec. Acum.	0,80 %	1,60 %	3,44 %																
Teor. Parcial	0,80 %	0,80 %	1,87 %																
Teor. Acum.	0,80 %	1,60 %	3,47 %																

ING. CARLOS EDUARDO CHAVEZ COLMAN
FISCALIZADOR/A DE OBRA
MOPC

MMSA
Ing. Pedro Rapetti
Residente de Obra
ING. PEDRO NICOLAS RAPETTI
INGENIERO RESIDENTE DE OBRA
MM S.A.

9 (Nueve)

MMSA
CONSTRUCTORA

CONTRATO N° 325/2024 - LLAMADO MOPC N° 51/2024 LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL PARA LA REHABILITACIÓN Y PAVIMENTACIÓN DE TRAMOS CAMINEROS EN EL DEPARTAMENTO CENTRAL (PLAN CENTRAL 2) AD REFERENDUM A LA REPROGRAMACIÓN PRESUPUESTARIA

REGISTRO DE LLUVIAS

COD. 8912025

CUADRO DE LLUVIA Y/O HUMEDAD EXCESIVA

REHABILITACION Y PAVIMENTACION DE TRAMOS CAMINEROS EN EL DEPARTAMENTO CENTRAL (PLAN CENTRAL 2)

Certificado de Trabajo Nº: 3 - Marzo/2025

		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Total lluvias (días)	Total humedad (días)	Total no laborables (días)	Total laborables (días)
2025	Ene									B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	9.2	0.1	B	B	B	B	B	4.3	13.4	16.1	13.3	B	B	6	0	6	17
	Feb	B	B	B	B	B	B	B	3.3	B	B	B	B	0.4	B	B	B	52.3	0.1	B	B	B	B	B	B	B	1.1	1	B				6	0	6	22
	Mar	B	B	B	H	B	B	B	B	B	B	B	3.8	B	2.8	0.2	B	15	B	B	B	0.8	7	B	B	25.9	4.2	4.2	20	H	B	54	11	2	13	18
	Abr																																0	0	0	0
	May																																0	0	0	0
	Jun																																0	0	0	0
	Jul																																0	0	0	0
	Ago																																0	0	0	0
	Sep																																0	0	0	0
	Oct																																0	0	0	0
	Nov																																0	0	0	0
	Dic																																0	0	0	0

ING. CARLOS EDUARDO CHAVEZ COLMAN
FISCALIZADOR/A DE OBRA
MOPC

MMMSA
Ing. Pedro Rapetti
Ingeniero de Obra
ING. PEDRO NICOLAS RAPETTI
INGENIERO RESIDENTE DE OBRA
MM S.A.

8 (ocho)

7 (Siete)

MMSA
CONSTRUCTORA

CONTRATO N° 325/2024 - LLAMADO MOPC N° 51/2024 LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL PARA LA REHABILITACIÓN Y PAVIMENTACIÓN DE TRAMOS CAMINEROS EN EL DEPARTAMENTO CENTRAL (PLAN CENTRAL 2) AD REFERENDUM A LA REPROGRAMACIÓN PRESUPUESTARIA

CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO TRIBUTARIO

6 (seis)

Lote 5696918602 , Cons.: 2

DIRECCIÓN NACIONAL DE INGRESOS TRIBUTARIOS

GERENCIA GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS

NUMERO 4270198488683

FECHA 21/04/2025

FORM.427-1

CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO TRIBUTARIO

DATOS DEL SOLICITANTE

RUC	80013212	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL
DV	2	MM SOCIEDAD ANONIMA

A LA FECHA DE EXPEDICIÓN DEL PRESENTE DOCUMENTO EL CONTRIBUYENTE HA CUMPLIDO CON SUS OBLIGACIONES ANTE LA ADMINISTRACIÓN Y SE EMITE EL PRESENTE CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO TRIBUTARIO EN CARÁCTER NORMAL EN VIRTUD A LO ESTABLECIDO EN EL ART. Nº 194 DE LA LEY Nº 125/91 Y SU MODIFICACIÓN CON LA LEY Nº 2421/04 Y DEMÁS DISPOSICIONES VIGENTES.

VALIDO HASTA: 21/05/2025

NÚMERO DE CONTROL : 8CC70904

DIRECCIÓN NACIONAL DE INGRESOS TRIBUTARIOS

4271800132128CC70904

MMSA
Ing. Jorge Moreno
Representante Legal

5 (cinco)

MMSA
CONSTRUCTORA

CONTRATO N° 325/2024 - LLAMADO MOPC N° 51/2024 LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL PARA LA REHABILITACIÓN Y PAVIMENTACIÓN DE TRAMOS CAMINEROS EN EL DEPARTAMENTO CENTRAL (PLAN CENTRAL 2) AD REFERENDUM A LA REPROGRAMACIÓN PRESUPUESTARIA

INFORME DE VERIFICACIÓN DE PÓLIZAS

4 (cuatro)

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES PARAGUAY | PARAGUÁI TETÃ REMBIAPO HA MARANDU MOTENONDEHA | GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Miércoles, 23 de Abril de 2025 a las 17:53

B- PARA PAGO DE CERTIFICADOS O SERVICIOS

INFORME DE VERIFICACION DE PÓLIZAS Y GARANTÍAS

LLAMADO MOPC N° 51/2024 - CONTRATO SG MINISTRO Nº 325/2024

Descripcion de la obra:	REHABILITACION Y PAVIMENTACION DE TRAMOS CAMINEROS EN EL DEPARTAMENTO CENTRAL (PLAN CENTRAL 2)
Empresa contratista:	MM S.A.
Dependencia responsable:	DIRECCIÓN DE CAMINOS VECINALES

						RECAUDOS VERIFICADOS		
Tipo de Póliza	**Si**	**No**	**N/A**	**N° poliza**	**Venc.**	**CUMPLEN LAS EXIGENCIAS DEL CONTRATO EN CUANTO A MONTO Y PLAZO ASEGURADO**	**LA COMPAÑÍA ASEGURADORA ESTÁ AUTORIZADA A OPERAR POR LA SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS**	**LA GARANTÍA CUENTA CON UN RESPALDO DE REASEGUROS, CONFORME A LO ESTABLECIDO EN LA RESOLUCIÓN SS. GG. N° 102/2009**
Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato de Obras	●			15,1503,00629,	08/06/2027	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato de Servicios			●					
Garantía de Anticipo Financiero de Obras	●			GTIA BRIA	18/12/2025	CUMPLE	CUMPLE	NO APLICA
Garantía de Anticipo Financiero de Servicios			●					
Garantía de Pago a Proveedores			●					
Sustitución de Fondos de Reparo de Obras			●					
Sustitución de Fondos de Reparo de Servicios			●					
Responsabilidad Civil			●					
Responsabilidad Civil Profesional			●					
Seguro de Vehículos			●					
Accidentes Personales	●			15.0401.14357.	19/06/2026	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Contra Todo Riesgo	●			15.1402.00482.	19/06/2026	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Seguro contra Incendio			●					

Los datos consignados en el Anexo son permanentemente actualizados por el Departamento de Garantías de la Unidad Operativa de Contratación

MMSA
Ing. Jorge Moreno
Representante Legal

Firma y Sello del Representante Legal

3 (Tres)

MMSA
CONSTRUCTORA

CONTRATO N° 325/2024 - LLAMADO MOPC N° 51/2024 LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL PARA LA REHABILITACIÓN Y PAVIMENTACIÓN DE TRAMOS CAMINEROS EN EL DEPARTAMENTO CENTRAL (PLAN CENTRAL 2) AD REFERENDUM A LA REPROGRAMACIÓN PRESUPUESTARIA

LISTA DE PERSONAL

2 (dos)

COD. 8912025

CONTRATISTA MM S.A. RUTA TRANSCHACO N°1.435 - ASUNCIÓN - PARAGUAY Tel: 292583/294579 Email: mmsa.const@gmail.com	M.O.P.C. Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones DIRECCIÓN DE CAMINOS VECINALES	FISCALIZACIÓN Tel:
Obra: REHABILITACION Y PAVIMENTACION DE TRAMOS CAMINEROS EN EL DEPARTAMENTO CENTRAL (PLAN CENTRAL 2)	**Fecha orden inicio:** 09/01/2025 **Plazo contractual:** 18 Meses	**Certificado Nº:** 3 **Mes/Año:** Marzo/2025

PLANILLA DE PERSONAL - MARZO/2025

#	C.I.	Apellidos y nombres	Cargo
		CAPIATA	
1	2031593	AMARILLA HECTOR NICOLAS	OPERADOR TERMINADORA ASFÁLTICA
2	1364000	CABRERA MEAURIO ISMAEL ROLANDO	TOPOGRAFO/NIVELISTA
3	4411018	MACIEL LOPEZ AIDE	INGENIERO RESIDENTE
4	3254587	MANDELBURGER INCHAUSTTI IVAN DARIO	ENCARGADO DE PLANTA ASFÁLTICA
5	2900438	SPINZI SILVANO DE GONZALEZ NATALIA VERONICA	ESPECIALISTA AMBIENTAL
6	4683996	VAZQUEZ MERCADO CECILIA ISABEL	ASISTENTE DE INGENIERIA

ING. CARLOS EDUARDO CHAVEZ COLMAN
FISCALIZADOR/A DE OBRA
MOPC

MMMSA
Ing. Pedro Rapetti
Residente de Obra

ING. PEDRO NICOLAS RAPETTI
INGENIERO RESIDENTE DE OBRA
MM S.A.

1 (uno)

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
DIRECCION DE APORTE OBRERO PATRONAL

CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO
CON EL SEGURO SOCIAL

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

USUARIO EMISION: 791452

NRO. CERTIFICADO: 484319

FECHA EMISION: 14-04-2025

VENCIMIENTO: 14-05-2025

DATOS DEL EMPLEADOR

Nro. Ruc: 80013212

Nro. Certificado: 484319

Razon Social: MM S.A.

Actividad(es): ACTIVIDADES INMOBILIARIAS REALIZADAS CON BIENES PROPIOS O ARRENDADOS
CONSTRUCCIÓN DE CARRETERAS Y VÍAS FÉRREAS, PUENTES Y TÚNELES
CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS

Fecha de Inscripcion: 20-02-1989

Cantidad de Asegurados: 186

Nro. Patronal(es): 0567-35-0004 -

CONSTE QUE EL(LOS) EMPLEADOR(ES), A LA FECHA DE EMISION DEL PRESENTE CERTIFICADO NO ADEUDA(N) EN CONCEPTO DE APORTE OBRERO PATRONAL

Se expide el presente Certificado sin perjuicio de las facultades de Fiscalizacion y Control otorgadas a la Direccion Aporte Obrero Patronal.
Nota: Cualquier correccion no salvada en el texto invalida el presente certificado. "El presente instrumento solo certifica estar al dia en el pago del aporte Obrero-Patronal del/los personal/es declarado/s, no eximiendo la responsabilidad patronal sobre los no declarados.".

La validez de este documento se puede confirmar, ingresando el número de ruc y certificado a traves de nuestro sitio:
http://servicios.ips.gov.py/constancia/

LA MISIÓN DEL INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL "Otorgar las prestaciones del seguro social con calidad y calidez mediante la excelencia en la gestión de los talentos y recursos, para el bienestar de sus beneficiarios".

MMSA
Ing. Jorge Moreno
Representante Legal

Ministerio de Obras Publicas
y Comunicaciones

HOJA DE COSTOS DE INVERSION

CONTROL DE ETAPAS DE PROCESO DE CONSTRUCION.

F.C. - 9

Lugar: Asunción

Hoja N°:	1
Mes:	MARZO.2025
Hora :	09:00:00
Lugar:	Asunción

Entidad		Ministerio de Obras Publicas y Comunicaciones
Unidad Jerarq.		Sub Secretaria de Obras Publicas
Reparticion		Dirección de Caminos Vecinales
Dependencia		Unidad Ejecutora - DCV
Area		Jefatura

Liquidacion de Costos por Administracion

Por Materiales.....Gs.	0
Por Mano de Obra.....Gs.	0
Por Gastos Indirectos.....Gs.	0
Costo Total Gs.	0

Importe de la Construccion Adjudicada

Por Construccion Gs.	79.419.204.780
Por Instalacion en Gral Gs.	0
Por Equipam. En Gral. Gs.	
Valor Total Iva inc Gs.	79.419.204.780

Cuenta		
Sub. Cta.		

Obra	LLAMADO MOPC N° 51/2024 LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL PARA LA REHABILITACIÓN Y PAVIMENTACIÓN DE TRAMOS CAMINEROS EN EL DEPARTAMENTO CENTRAL (PLAN CENTRAL 2) - ID N° 449.370. - Contrato SG Ministro N° 325/2024 - Resolución de Adjudicación N° 1973/2024 del 30 de octubre 2024.-
Proyecto	Contrato S.G. Ministro N° 325/2024

Fecha de Inicio Contrato	01.enero.2025
Fecha Terminacion Construcción	09.noviembre.2026

Item	INSTRUMENTO			PROCESO DE LOS CERTIFICADOS DE OBRAS.		
	Fecha	Tipo	Nº	Certificado	a)	Total
1		Factura Fondo Local		PEDIDO DE PAGO CERTIFICADO N°: 03	REHABILITACIÓN Y PAVIMENTACIÓN DE TRAMOS CAMINEROS EN EL DEPARTAMENTO CENTRAL (PLAN CENTRAL 2)	1.315.891.186
				Totales.-		1.315.891.186

OBSERVACIÓN:

SUPERVISOR DE OBRAS

JEFE DE PATRIMONIO

DIRECTOR DE AREA

Ministerio de Obras Publicas
y Comunicaciones

HOJA DE COSTOS DE INVERSION

CONTROL DE ETAPAS DE PROCESO DE CONSTRUCION.

F.C. - 9

Lugar: Asunción

Hoja N°:	1
Mes:	MARZO.2025
Hora :	09:00:00
Lugar:	Asunción

Entidad		Ministerio de Obras Publicas y Comunicaciones
Unidad Jerarq.		Sub Secretaria de Obras Publicas
Reparticion		Dirección de Caminos Vecinales
Dependencia		Unidad Ejecutora - DCV
Area		Jefatura

Liquidacion de Costos por Administracion

Por Materiales.....Gs.	0
Por Mano de Obra.....Gs.	0
Por Gastos Indirectos.....Gs.	0
Costo Total Gs.	0

Importe de la Construccion Adjudicada

Por Construccion Gs.	79.419.204.780
Por Instalacion en Gral Gs.	0
Por Equipam. En Gral. Gs.	
Valor Total Iva inc Gs.	79.419.204.780

Cuenta		
Sub. Cta.		

Obra	LLAMADO MOPC N° 51/2024 LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL PARA LA REHABILITACIÓN Y PAVIMENTACIÓN DE TRAMOS CAMINEROS EN EL DEPARTAMENTO CENTRAL (PLAN CENTRAL 2) - ID N° 449.370. - Contrato SG Ministro N° 325/2024 - Resolución de Adjudicación N° 1973/2024 del 30 de octubre 2024.-
Proyecto	Contrato S.G. Ministro N° 325/2024

Fecha de Inicio Contrato	01.enero.2025
Fecha Terminacion Construcción	09.noviembre.2026

Item	INSTRUMENTO			PROCESO DE LOS CERTIFICADOS DE OBRAS.		
	Fecha	Tipo	Nº	Certificado	a)	Total
1		Factura Fondo Local		PEDIDO DE PAGO CERTIFICADO N°: 03	REHABILITACIÓN Y PAVIMENTACIÓN DE TRAMOS CAMINEROS EN EL DEPARTAMENTO CENTRAL (PLAN CENTRAL 2)	1.315.891.186
				Totales.-		1.315.891.186

OBSERVACIÓN:

SUPERVISOR DE OBRAS

JEFE DE PATRIMONIO

DIRECTOR DE AREA

Ministerio de Obras Publicas
y Comunicaciones

HOJA DE COSTOS DE INVERSION

CONTROL DE ETAPAS DE PROCESO DE CONSTRUCION.

F.C. - 9

Lugar: Asunción

Hoja N°:	1
Mes:	MARZO.2025
Hora :	09:00:00
Lugar:	Asunción

Entidad		Ministerio de Obras Publicas y Comunicaciones
Unidad Jerarq.		Sub Secretaria de Obras Publicas
Reparticion		Dirección de Caminos Vecinales
Dependencia		Unidad Ejecutora - DCV
Area		Jefatura

Liquidacion de Costos por Administracion

Por Materiales.....Gs.	0
Por Mano de Obra.....Gs.	0
Por Gastos Indirectos.....Gs.	0
Costo Total Gs.	0

Importe de la Construccion Adjudicada

Por Construccion Gs.	79.419.204.780
Por Instalacion en Gral Gs.	0
Por Equipam. En Gral. Gs.	
Valor Total Iva inc Gs.	79.419.204.780

Cuenta		
Sub. Cta.		

Obra	LLAMADO MOPC N° 51/2024 LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL PARA LA REHABILITACIÓN Y PAVIMENTACIÓN DE TRAMOS CAMINEROS EN EL DEPARTAMENTO CENTRAL (PLAN CENTRAL 2) - ID N° 449.370. - Contrato SG Ministro N° 325/2024 - Resolución de Adjudicación N° 1973/2024 del 30 de octubre 2024.-
Proyecto	Contrato S.G. Ministro N° 325/2024

Fecha de Inicio Contrato	01.enero.2025
Fecha Terminacion Construcción	09.noviembre.2026

Item	INSTRUMENTO			PROCESO DE LOS CERTIFICADOS DE OBRAS.		
	Fecha	Tipo	Nº	Certificado	a)	Total
1		Factura Fondo Local		PEDIDO DE PAGO CERTIFICADO N°: 03	REHABILITACIÓN Y PAVIMENTACIÓN DE TRAMOS CAMINEROS EN EL DEPARTAMENTO CENTRAL (PLAN CENTRAL 2)	1.315.891.186
Totales.-						1.315.891.186

OBSERVACIÓN:

SUPERVISOR DE OBRAS

JEFE DE PATRIMONIO

DIRECTOR DE AREA

Ministerio de Obras Publicas
y Comunicaciones

HOJA DE COSTOS DE INVERSION

CONTROL DE ETAPAS DE PROCESO DE CONSTRUCION.

F.C. - 9

Lugar: Asunción

Hoja N°:	1
Mes:	MARZO.2025
Hora :	09:00:00
Lugar:	Asunción

Entidad		Ministerio de Obras Publicas y Comunicaciones
Unidad Jerarq.		Sub Secretaria de Obras Publicas
Repartición		Dirección de Caminos Vecinales
Dependencia		Unidad Ejecutora - DCV
Area		Jefatura

Liquidacion de Costos por Administracion

Por Materiales.....Gs.	0
Por Mano de Obra.....Gs.	0
Por Gastos Indirectos.....Gs.	0
Costo Total Gs.	0

Importe de la Construccion Adjudicada

Por Construccion Gs.	79.419.204.780
Por Instalacion en Gral Gs.	0
Por Equipam. En Gral. Gs.	
Valor Total Iva inc Gs.	79.419.204.780

Cuenta		
Sub. Cta.		

Obra	LLAMADO MOPC N° 51/2024 LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL PARA LA REHABILITACIÓN Y PAVIMENTACIÓN DE TRAMOS CAMINEROS EN EL DEPARTAMENTO CENTRAL (PLAN CENTRAL 2) - ID N° 449.370. - Contrato SG Ministro N° 325/2024 - Resolución de Adjudicación N° 1973/2024 del 30 de octubre 2024.-
Proyecto	Contrato S.G. Ministro N° 325/2024

Fecha de Inicio Contrato	01.enero.2025
Fecha Terminacion Construcción	09.noviembre.2026

Item	INSTRUMENTO			PROCESO DE LOS CERTIFICADOS DE OBRAS.		
	Fecha	Tipo	Nº	Certificado	a)	Total
1		Factura Fondo Local		PEDIDO DE PAGO CERTIFICADO N°: 03	REHABILITACIÓN Y PAVIMENTACIÓN DE TRAMOS CAMINEROS EN EL DEPARTAMENTO CENTRAL (PLAN CENTRAL 2)	1.315.891.186
				Totales.-		1.315.891.186

OBSERVACIÓN:

SUPERVISOR DE OBRAS

JEFE DE PATRIMONIO

DIRECTOR DE AREA
