GOBERNACIÓN DE MISIONES
Juntos Haremos Historia.!

GOBIERNO DEL PARAGUAY

MEMORANDO NRO. 89/2026

A: Abog. Richard Rolando Ramírez Rodríguez, Gobernador

Para: Lic. Quintín González, Secretario de Hacienda

DE: Abog. Patricio Ortiz Cantero, Secretario de Obras Públicas

FECHA: 10/04/2026

MOTIVO: **Remitir**

Certificado de avance de obra Nro. 02, del Contrato de Adjudicación Nro. 30/2025, **CONSTRUCCIONES DE OBRAS VARIAS EN LOS DISTRITOS DEL DEPARTAMENTO (SEGUNDA PARTE), Lote Nro. 04, Grupo 01** Mejoramiento de espacio Público en la Plaza Teniente Pedro Brusquetti de la Ciudad de San Ignacio Guasú - Misiones", con ID Nro. 473.404, L.P.N. Nro. 04/2025.-

Ítem	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total S/ Contrato
1	**Grupo 01** Mejoramiento de espacio Público en la Plaza Teniente Pedro Brusquetti de la Ciudad de San Ignacio Guasú - Misiones	UN	1.00	4.765.485.368	4.765.485.368

Hemos verificado y constatado el avance de las obras, según las especificaciones técnicas y encontramos un avance acumulado de 7.36 %. Se adjuntan informe 02 y planillas.

Empresa Responsable: JOAPY S.A. del Sr. Federico Daniel Díaz Carmona, para su correspondiente pago, según Informe de la Secretaria de Obras Públicas, **SALVO MEJOR PARECER AL EJECUTIVO DEPARTAMENTAL. -**

Hacienda 14/04/26

MEMORANDUM

A: ABOG. RICHAR R. RAMIREZ RODRIGUEZ, Gobernador de Misiones

PARA: QUINTIN GOZALEZ, SECRETARIO DE HACIENDA

Referencia: Certificación de Obras –CERTIFICADO 02

FECHA< 06 DE abril de 2026

DE: PATRICIO ORTIZ, SECRETARIO DE OBRAS DE L;A GOBERNACION DE MISIONES

Adjunto van las planillas de certificación de obra 02, CONTRATO NO. 30/2025, registro ejecutadas por la empresa CONTRATISTA: JOAPY S.A; CONSTRUCCIONES DE OBRAS VARIAS EN LOS DISTRITOS DEL DEPARTAMENTO (SEGUNDA PARTE), Lote Nro. 04, Grupo 01 Mejoramiento de espacio Público en la Plaza Teniente Pedro Brusquetti de la Ciudad de San Ignacio Guasú – Misiones

ITEM	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Precio Total S/ CONTRATO	Precio Total S/ PLANILLA
1	Grupo 1 - Mejoramiento de Espacio Público en la Plaza Teniente Pedro Brusquetti de la Ciudad de San Ignacio	UN	1,00	4.765.485.368	4.765.485.368	4.765.485.369
					4.765.485.368	4.765.485.369

Hemos verificado y constatado el avance de las obras, según las especificaciones técnicas y encontramos un avance acumulado del 7,36 %. Se adjuntan informe 01 y planillas.

La fiscalización recomienda la aprobación de la certificación de este lote para el pago correspondiente.

Arq. Norma Medina

Abg. Patricio Ortiz Cantero
Secretario de Obras
Gobernación de Misiones

REGISTRO FOTOGRAFICO

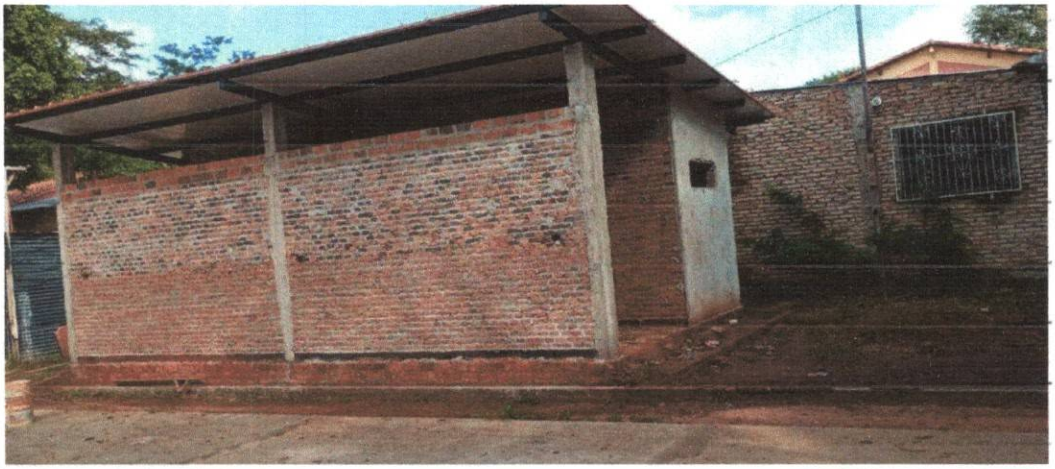

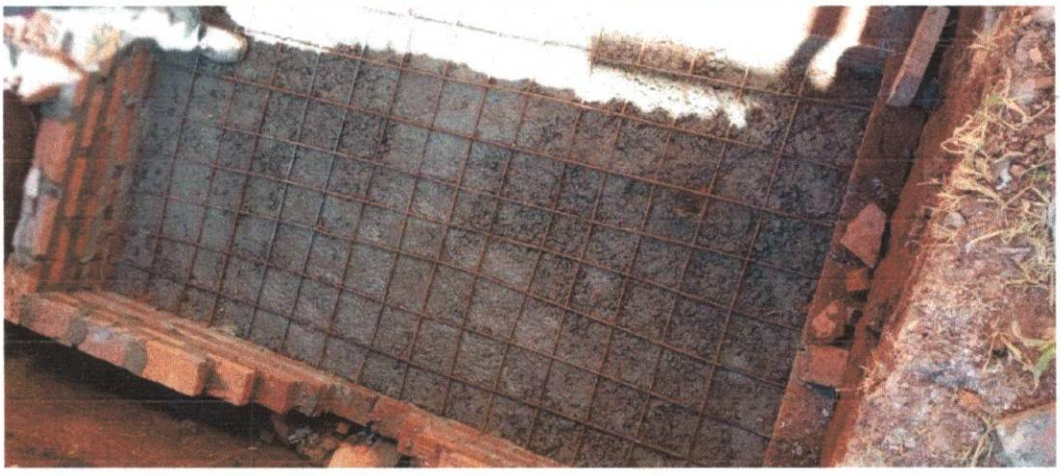

Abg. Patricio Ortiz Cantero
Secretario de Obras
Gobernación de Misiones

JOAPY S.A.
RUC: 80027137-8

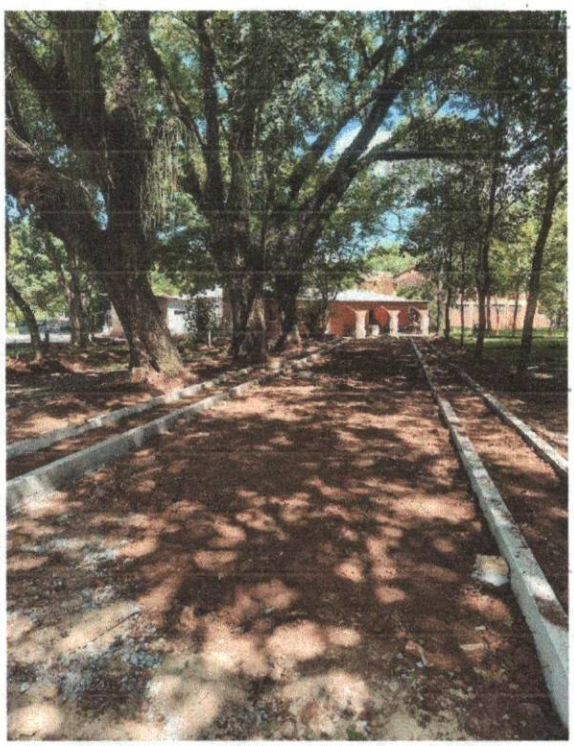

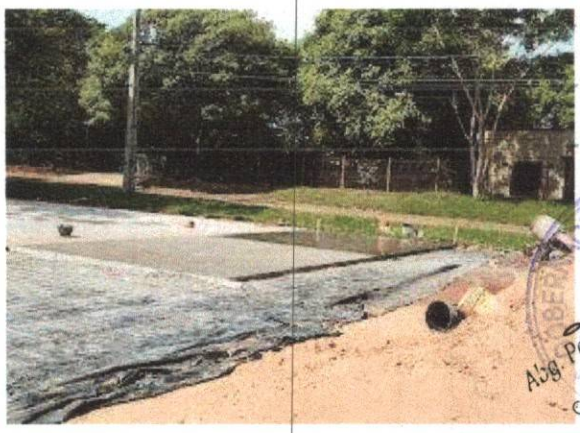

Arq. Pedro Ortiz Cantero
Secretario de Obras
Gobernación de Misiones

JOAPY S.A.
RUC: 80027137-8

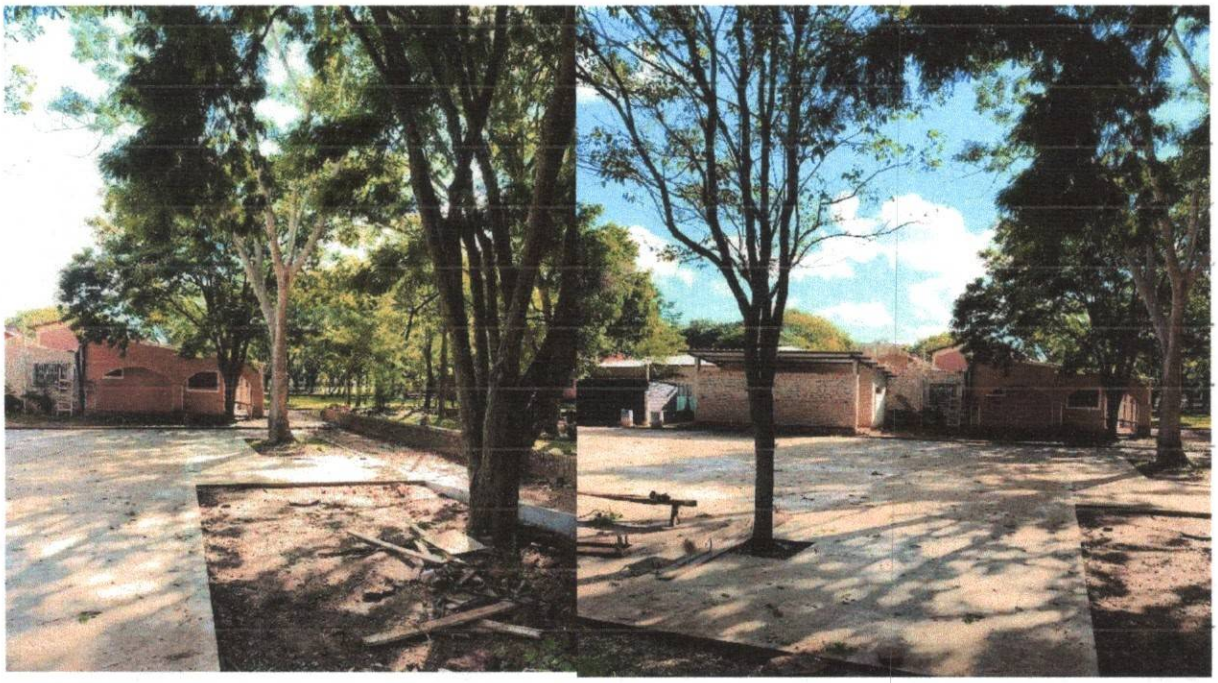

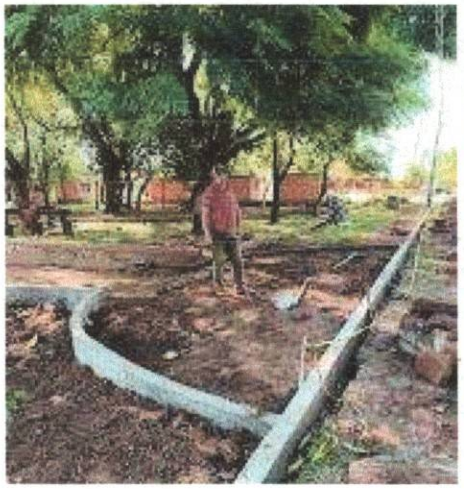

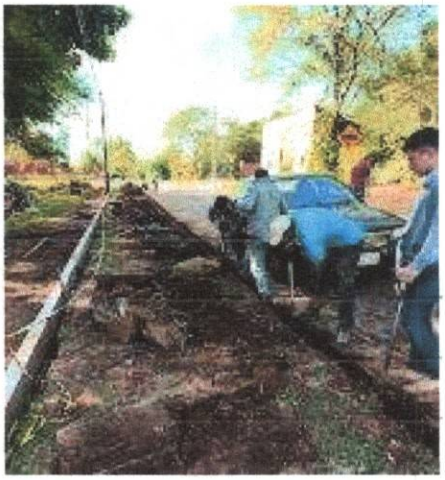

Abg. Patricio Ortiz Cantero
Secretario de Obras
Gobernación de Misiones

JOAPY S.A.
RUC: 80027137-8

GOBERNACIÓN DE MISIONES - CERTIFICACION 02 - LOTE 4

CONSTRUCCION DE OBRAS VARIAS EN EL DEPARTAMENTO (SEGUNDA PARTE) ID Nº 473,404

CONTRATO Nº 30 /2025

MONTO DE CONTRATO GS. 4,765,485,368.-

MONTO POR ANTICIPO DE MATERIALES: 1.102.300.000./ Gs

CONTRATISTA: JOAPY S.A

FECHA: 03 de abril de 2.026

Item	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total		CANTIDAD CERTIFICADA			PRECIO CERTIFICACIÓN			% DE AVANCE
							ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADA	ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADA	
Grupo 1 - Mejoramiento de Espacio Público en la Plaza Teniente Pedro Brusquetti de la ciudad de San Ignacio													
1	CARTEL DE OBRA Y PLANCHA DE GRANITO	Unidad	1,00	7.260.385	7.260.385		0,50		0,50	3.630.193	0	3.630.193	50,00%
2	OBRADOR	Unidad	1,00	16.964.860	16.964.860		1,00		1,00	16.964.860	0	16.964.860	100,00%
3	LIMPIEZA DE TERRENO.BAÑOS PUBLICOS	Metros cuadrados	57,75	8.603	496.823		57,75		57,75	496.823	0	496.823	100,00%
4	MARCACION Y REPLANTEO DE OBRA. BAÑOS PUBLICOS	cuadrados	40,25	6.447	259.491		40,25		40,25	259.491	0	259.491	100,00%
5	EXCAVACIÓN DEL TERRENO. BAÑOS PUBLICOS	Metros cúbicos	8,66	58.342	505.241		0,00	8,66	8,66	0	505.242	505.242	100,00%
6	ZAPATAS DE HORMIGON ARMADO. BAÑOS PUBLICOS	Metros cúbicos	1,80	3.201.471	5.762.647		0,00	1,80	1,80	0	5.762.648	5.762.648	100,00%
7	RELLENO Y COMPACTACION. BAÑOS PUBLICOS	Metros cúbicos	8,66	120.767	1.045.842		0,00	8,66	8,66	0	1.045.842	1.045.842	100,00%
8	PILAR DE HORMIGON ARMADO. BAÑOS PUBLICOS	Metro lineal	19,50	285.898	5.575.011		0,00	19,50	19,50	0	5.575.011	5.575.011	100,00%
9	VIGA DE FUNDACION DE HORMIGON ARMADO. BAÑOS PUBLICOS	Metros cúbicos	2,83	4.108.248	11.626.341		0,00	2,83	2,83	0	11.626.342	11.626.342	100,00%
10	VIGAS SUPERIORES DE HORMIGON ARMADO. BAÑOS PUBLICOS	Metros cúbicos	2,59	4.108.248	10.640.362		0,00	2,59	2,59	0	10.640.362	10.640.362	100,00%
11	AISLACION HORIZONTAL DE PAREDES 0,15M. BAÑOS PUBLICOS	Metro lineal	26,60	32.205	856.653		0,00	26,60	26,60	0	856.653	856.653	100,00%
12	AISLACION HORIZONTAL DE PAREDES 0,30M. BAÑOS PUBLICOS	Metro lineal	8,30	46.103	382.654		0,00	8,30	8,30	0	382.655	382.655	100,00%
13	MAMPOSTERIA DE NIVELACION DE 0,30M CON LADRILLO COMUN. BAÑOS PUBLICOS	Metros cuadrados	3,49	248.800	867.614		0,00	3,49	3,49	0	867.614	867.614	100,00%
14	MAMPOSTERIA DE ELEVACION DE 0,15M CON LADRILLO COMUN A REVOCAR AMBAS CARAS. BAÑOS PUBLICOS	Metros cuadrados	85,51	174.106	14.887.804		0,00	85,51	85,51	0	14.887.804	14.887.804	100,00%
15	MAMPOSTERIA DE ELEVACION DE 030M CON LADRILLO COMUN. BAÑOS PUBLICOS	Metros cuadrados	26,25	264.120	6.933.150		0,00	26,25	26,25	0	6.933.150	6.933.150	100,00%
16	ENVARILLADO DE MAMPOSTERIAS. BAÑOS PUBLICOS	Metro lineal	19,10	50.075	956.432		0,00	19,10	19,10	0	956.433	956.433	100,00%
17	REVESTIMIENTO DE PAREDES CON LADRILLO COMÚN PRENSADO COLORADO Y QUEMADOS. BAÑOS PUBLICOS	Metros cuadrados	54,30	185.739	10.085.627		0,00		0,00	0	0	0	0,00%
18	TECHO DE CHAPA TERMOACUSTICA TRAPEZOIDAL SOBRE ESTRUCTURA METALICA. BAÑOS PUBLICOS	Metros cuadrados	58,71	462.939	27.179.148		0,00	58,71	58,71	0	27.179.149	27.179.149	100,00%
19	REVOQUE INTERIOR - EXTERIOR. BAÑOS PUBLICOS	Metros cuadrados	223,52	53.264	11.905.569		0,00	223,52	223,52	0	11.905.569	11.905.569	100,00%
20	CONTRAPISO DE HORMIGON DE CASCOTES ESP 10CM. BAÑOS PUBLICOS	Metros cuadrados	33,50	60.971	2.042.528		0,00	33,50	33,50	0	2.042.529	2.042.529	100,00%
21	PISO CERAMICO. BAÑOS PUBLICOS	Metros cuadrados	33,50	166.954	5.592.959		0,00		0,00	0	0	0	0,00%
22	ZOCALO CERAMICO. BAÑOS PUBLICOS	Metro lineal	8,75	72.307	632.686		0,00		0,00	0	0	0	0,00%
23	REVESTIMIENTO TIPO AZULEJOS ALTURA: 1,60M. BAÑOS PUBLICOS	Metros cuadrados	50,40	139.851	7.048.490		0,00		0,00	0	0	0	0,00%
24	MESADA DE GRANITO. BAÑOS PUBLICOS	Metros cuadrados	1,08	2.178.116	2.352.365		0,00		0,00	0	0	0	0,00%
25	PUERTA METALICA DE UNA HOJA DE ABRIR DE 1,00X210M. BAÑOS PUBLICOS	Unidad	4,00	1.896.326	7.585.304		0,00	2,00	2,00	0	3.792.652	3.792.652	50,00%
26	VENTANA EN VIDRIO TEMPLADO DE 8MM. BAÑOS PUBLICOS	Metros cuadrados	1,26	1.024.362	1.290.696		0,00		0,00	0	0	0	0,00%
27	INSTALACION DE DESAGUE CLOACAL EN BAÑOS. BAÑOS PUBLICOS	Unidad	4,00	1.109.251	4.437.004		0,00	4,00	4,00	0	4.437.004	4.437.004	100,00%
28	CAÑO DE VENTILACION EN PVC DE 50MM. BAÑOS PUBLICOS	Metro lineal	9,00	41.549	373.941		0,00	9,00	9,00	0	373.941	373.941	100,00%
29	CAÑO DE DESAGUE CLOACAL EN PVC DE 100MM. BAÑOS PUBLICOS	Metro lineal	8,00	84.106	672.848		0,00	8,00	8,00	0	672.848	672.848	100,00%
30	REGISTRO DE INSPECCION DE 060X060M. BAÑOS PUBLICOS	Unidad	3,00	633.786	1.901.358		0,00	3,00	3,00	0	1.901.358	1.901.358	100,00%
31	CAMARA SEPTICA.BAÑOS PUBLICOS	Unidad	1,00	3.133.633	3.133.633		0,00	1,00	1,00	0	3.133.633	3.133.633	100,00%
32	POZO ABSORBENTE. BAÑOS PUBLICOS	Unidad	1,00	4.172.205	4.172.205		0,00	1,00	1,00	0	4.172.205	4.172.205	100,00%
33	ALIMENTACION DE CANERIA DE AGUA CORRIENTE . BAÑOS PUBLICOS	Metro lineal	45,00	73.323	3.299.535		0,00	45,00	45,00	0	3.299.535	3.299.535	100,00%
34	INSTALACION DE AGUA CORRIENTE FRIO SOLO EN BAÑOS. BAÑOS PUBLICOS	Unidad	4,00	1.559.905	6.239.620		0,00	4,00	4,00	0	6.239.620	6.239.620	100,00%
35	ARTEFACTOS SANITARIOS EN BAÑOS. BAÑOS PUBLICOS	Unidad	2,00	3.773.963	7.547.926		0,00		0,00	0	0	0	0,00%
36	ARTEFACTOS SANITARIOS EN BAÑO MINUSVALIDOS. BAÑOS PUBLICOS	Unidad	2,00	4.032.749	8.065.498		0,00		0,00	0	0	0	0,00%
37	CANALETA DE CHAPA PLEGADA Nº24 DES 0,33m. BAÑOS PUBLICOS	Metro lineal	9,95	116.454	1.158.717		0,00		0,00	0	0	0	0,00%
38	BAJADA DE CHAPA PLEGADA Nº24 DES 0,33m. BAÑOS PUBLICOS	Metro lineal	7,60	116.454	885.050		0,00		0,00	0	0	0	0,00%
39	PINTURA DE PAREDES CON LATEX INTERIOR EXTERIOR. BAÑOS PUBLICOS	Metros cuadrados	118,82	35.044	4.163.928		0,00		0,00	0	0	0	0,00%
40	TRATAMIENTO DE MAMPOSTERIAS A LA VISTA. BAÑOS PUBLICOS	Metros cuadrados	54,30	32.313	1.754.596		0,00		0,00	0	0	0	0,00%
41	PINTURA DE ABERTURAS METALICAS CON ESMALTE SINTETICO. BAÑOS PUBLICOS	Metros cuadrados	18,92	46.438	878.606		0,00		0,00	0	0	0	0,00%
42	PINTURA DE TECHO CON ESMALTE SINTETICO. BAÑOS PUBLICOS	Metros cuadrados	58,71	45.447	2.668.193		0,00		0,00	0	0	0	0,00%
43	PINTURA DE CANALETAS Y BAJADAS CON ESMALTE SINTETICO. BAÑOS PUBLICOS	Metro lineal	17,55	33.704	591.505		0,00		0,00	0	0	0	0,00%
44	ALIMENTACION ELECTRICA SUBTERRANEA CON CABLE NYY Y PROTECCION ELECTRICA MECANICA DESDE EL PUESTO DE ALIMENTACION PRINCIPAL AL TP Y TS. BAÑOS PUBLICOS	Metro lineal	150,00	166.933	25.039.950		0,00		0,00	0	0	0	0,00%
45	TABLERO SECCIONAL. BAÑOS PUBLICOS	Unidad	1,00	4.266.582	4.266.582		0,00		0,00	0	0	0	0,00%
46	BOCA DE LUCES. BAÑOS PUBLICOS	Unidad	8,00	199.840	1.598.720		0,00		0,00	0	0	0	0,00%
47	ARTEFACTO DE ILUMINACION TIPO COLGANTE CON LAMPARA TIPO PLATO LED. BAÑOS PUBLICOS	Unidad	4,00	333.546	1.334.184		0,00		0,00	0	0	0	0,00%

JOAPY S.A.
RUC: 80027137-8

Abg. Patricio Ortiz Cantero
Secretario de Obras
Gobernación de Misiones

48	ARTEFACTO DE ILUMINACION TIPO APLIQUE DECORATIVO PARA EXTERIOR, BAÑOS PUBLICOS	Unidad	2,00	355.112	710.224		0,00		0,00	0	0	0	0,00%
49	ARTEFACTO DE ILUMINACION TIPO REFLECTOR LED IP66 PARA EXTERIOR, BAÑOS PUBLICOS	Unicad	2,00	717.412	1.434.824		0,00		0,00	0	0	0	0,00%
50	REGISTROS DE HORMIGON DE 40X40CM. BAÑOS PUBLICOS	Unidad	4,00	552.221	2.208.884		0,00		0,00	0	0	0	0,00%
51	SISTEMA DE FOTOCELULA PARA EXTERIOR, BAÑOS PUBLICOS	Global	1,00	1.876.199	1.876.199		0,00		0,00	0	0	0	0,00%
52	SISTEMA DE PUESTA A TIERRA, BAÑOS PUBLICOS	Global	1,00	2.722.045	2.722.045		0,00		0,00	0	0	0	0,00%
53	LIMPIEZA FINAL DE OBRA Y RETIRO DE ESCOMBROS. BAÑOS PUBLICOS	Metros cuadrados	40,25	7.393	297.568		0,00		0,00	0	0	0	0,00%
54	LIMPIEZA DE TERRENO. VEREDA	Metros cuadrados	879,50	8.603	7.566.338		0,00	250,00	250,00	0	2.150.750	2.150.750	28,43%
55	MARCACION Y REPLANTEO DE OBRA. VEREDA	Metros cuadrados	879,50	6.447	5.670.136		0,00	250,00	250,00	0	1.611.750	1.611.750	28,43%
56	DEMOLICION DE PISO EXISTENTE. VEREDA	Metros cuadrados	879,50	45.342	39.878.289		0,00	250,00	250,00	0	11.335.500	11.335.500	28,43%
57	PISO PAVERS DE 20X10X6CM PARA EXTERIOR, INCLUYE CAMA DE ARENA. VEREDA	Metros cuadrados	879,50	166.066	146.055.047		0,00		0,00	0	0	0	0,00%
58	LINEA DE ADOQUIN TACTIL AMARILLO PARA LINEA DE VEREDAS, INCLUYE CAMA DE ARENA. VEREDA	Metro lineal	432,00	74.616	32.234.112		0,00		0,00	0	0	0	0,00%
59	CORDON DE HORMIGON DE 0,10X0,30X050M. VEREDA	Metro lineal	810,00	67.716	54.849.960		0,00	200,00	200,00	0	13.543.200	13.543.200	24,69%
60	RAMPA DE HORMIGÓN ARMADO IN SITU PARA MINUSVÁLICOS. VEREDA	Unidad	4,00	970.448	3.881.792		0,00		0,00	0	0	0	0,00%
61	LIMPIEZA DE TERRENO. AREA JUEGOS	Metros cuadrados	560,00	8.603	4.817.680		560,00		560,00	4.817.680	0	4.817.680	100,00%
62	JUEGOS INFANTILES SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS. AREA JUEGOS	Unidad	1,00	351.021.000	351.021.000		0,00		0,00	0	0	0	0,00%
63	HAMACA MAMÁ Y BEBE. AREA JUEGOS	Unidad	1,00	18.029.000	18.029.000		0,00		0,00	0	0	0	0,00%
64	COLUMPIO PARA SILLA DE RUEDAS. AREA JUEGOS	Unidad	1,00	35.090.000	35.090.000		0,00		0,00	0	0	0	0,00%
65	JUEGO RESORTE. AREA JUEGOS	Unidad	3,00	7.865.000	23.595.000		0,00		0,00	0	0	0	0,00%
66	CAPSULA SCANDERE. AREA JUEGOS	Unidad	1,00	17.182.000	17.182.000		0,00		0,00	0	0	0	0,00%
67	PISO DE HORMIGON ARMADO DE ESPESOR: 0,07m. AREA JUEGOS	Metros cuadrados	560,00	174.134	97.515.040		0,00	560,00	560,00	0	97.515.040	97.515.040	100,00%
68	PASTO SINTÉTICO, ESPESOR 50MM. AREA JUEGOS	Metros cuadrados	560,00	213.172	119.376.320		0,00		0,00	0	0	0	0,00%
69	PISO DE CAUCHO, ESPESOR 40MM. AREA JUEGOS	Metros cuadrados	40,00	832.907	33.316.280		0,00		0,00	0	0	0	0,00%
70	BARANDA METALICA PERIMETRAL ALTURA: 1,20m, INCLUYE PORTONES DE ACCESO Y PINTURA. AREA JUEGOS	Metro lineal	96,00	701.036	67.299.456		0,00		0,00	0	0	0	0,00%
71	ALIMENTACION ELECTRICA SUBTERRANEA CON CABLE NYY Y PROTECCION ELECTRICA MECANICA DESDE EL TP. AREA DE JUEGOS	Metro lineal	150,00	166.933	25.039.950		0,00		0,00	0	0	0	0,00%
72	ARTEFACTO DE ILUMINACION TIPO FAROL CON PEDESTAL INCLUYE BASE DE HORMIGÓN. AREA DE JUEGOS	Unidad	9,00	5.575.008	50.175.072		0,00		0,00	0	0	0	0,00%
73	ARTEFACTO DE ILUMINACION TIPO AP LED BRAZO DE 4M EN POSTE DE HORMIGON 9/150, INCLUYE BASE DE FUNDACIÓN	Unidad	4,00	3.098.244	12.392.976		0,00		0,00	0	0	0	0,00%
74	SISTEMA DE FOTOCELULA PARA EXTERIOR. AREA DE JUEGOS	Global	1,00	1.876.199	1.876.199		0,00		0,00	0	0	0	0,00%
75	SISTEMA DE PUESTA A TIERRA. AREA DE JUEGOS	Global	1,00	2.722.045	2.722.045		0,00		0,00	0	0	0	0,00%
76	REGISTROS DE HORMIGON DE 40X40CM. AREA JUEGOS	Unidad	2,00	552.221	1.104.442		0,00		0,00	0	0	0	0,00%
77	REGISTROS DE HORMIGON DE 35X35CM. AREA JUEGOS	Unidad	3,00	516.591	1.549.773		0,00		0,00	0	0	0	0,00%
78	CARTELERIA FIJA. AREA JUEGOS	Unidad	4,00	1.134.345	4.537.380		0,00		0,00	0	0	0	0,00%
79	BANCOS DE MADERA PLASTICA. AREA JUEGOS	Unidad	15,00	2.666.934	40.004.010		0,00		0,00	0	0	0	0,00%
80	LIMPIEZA DE TERRENO. AREA DE EJERCICIOS	Metros cuadrados	45,00	8.603	387.135		45,00		45,00	387.135	0	387.135	100,00%
81	RELLENO Y COMPACTACION. AREA DE EJERCICIOS	Metros cúbicos	4,50	120.767	543.451		0,00	4,50	4,50	0	543.452	543.452	100,00%
82	CONTRAPISO DE HORMIGON DE CASCOTES ESP 10CM. AREA EJERCICIOS	Metros cuadrados	45,00	60.971	2.743.695		0,00	45,00	45,00	0	2.743.695	2.743.695	100,00%
83	PISO ALISADO DE CEMENTO 3CM. AREA EJERCICIOS	Metros cuadrados	45,00	91.205	4.104.225		0,00	45,00	45,00	0	4.104.225	4.104.225	100,00%
84	PINTURA DE PISO CON PINTURA PARA CANCHA. AREA EJERCICIOS	Metros cuadrados	45,00	50.320	2.264.400		0,00		0,00	0	0	0	0,00%
85	SIMULADOR DE CAMINATA. AREA DE EJERCICIOS	Unidad	2,00	6.703.400	13.406.800		0,00		0,00	0	0	0	0,00%
86	BICICLETA ESTÁTICA. AREA DE EJERCICIOS	Unidad	1,00	10.514.900	10.514.900		0,00		0,00	0	0	0	0,00%
87	BARRA PARALELA. AREA DE EJERCICIOS	Unidad	1,00	7.792.400	7.792.400		0,00		0,00	0	0	0	0,00%
88	DORSALERA. AREA DE EJERCICIOS	Unidad	1,00	13.310.000	13.310.000		0,00		0,00	0	0	0	0,00%
89	BANCO ABDOMINAL. AREA DE EJERCICIOS	Unidad	1,00	5.590.200	5.590.200		0,00		0,00	0	0	0	0,00%
90	ALIMENTACION ELECTRICA SUBTERRANEA CON CABLE NYY Y PROTECCION ELECTRICA MECANICA. AREA DE EJERCICIOS	Metro lineal	75,00	166.933	12.519.975		0,00		0,00	0	0	0	0,00%
91	ARTEFACTO DE ILUMINACION TIPO FAROL CON PEDESTAL INCLUYE BASE DE HORMIGÓN. AREA DE EJERCICIOS	Unidad	4,00	5.575.008	22.300.032		0,00		0,00	0	0	0	0,00%
92	SISTEMA DE FOTOCELULA PARA EXTERIOR. AREA DE EJERCICIOS	Global	1,00	1.876.199	1.876.199		0,00		0,00	0	0	0	0,00%
93	SISTEMA DE PUESTA A TIERRA. AREA DE EJERCICIOS	Global	1,00	2.722.045	2.722.045		0,00		0,00	0	0	0	0,00%
94	REGISTROS DE HORMIGON DE 40X40CM. AREA DE EJERCICIOS	Unidad	2,00	552.221	1.104.442		0,00		0,00	0	0	0	0,00%
95	REGISTROS DE HORMIGON DE 35X35CM. AREA DE EJERCICIOS	Unidad	3,00	516.591	1.549.773		0,00		0,00	0	0	0	0,00%
96	LIMPIEZA DE TERRENO. CANCHA	Metros cuadrados	400,00	8.603	3.441.200		0,00	400,00	400,00	0	3.441.200	3.441.200	100,00%
97	RELLENO Y COMPACTACION. CANCHA	Metros cúbicos	92,40	120.767	11.158.870		0,00		0,00	0	0	0	0,00%
98	CONFORMACION DE BASE CANCHA	Metros cuadrados	924,00	81.086	74.923.464		0,00		0,00	0	0	0	0,00%
99	CESPED SINTETICO, DE 50MM, INCLUYE LINEAS BLANCAS DE MARCACION.CANCHA	Metros cuadrados	924,00	214.610	198.299.640		0,00		0,00	0	0	0	0,00%
100	REDES PERIMETRALES CON CAÑOS. ALTURA:5,00M. CANCHA	Metros cuadrados	640,00	34.792	22.266.880		0,00		0,00	0	0	0	0,00%
101	ARCOS DE FUTBOL, EL PAR INCLUYE RED.CANCHA	Metro lineal	1,00	8.253.836	8.253.836		0,00		0,00	0	0	0	0,00%
102	ALIMENTACION ELECTRICA SUBTERRANEA CON CABLE NYY Y PROTECCION ELECTRICA MECANICA. CANCHA	Metro lineal	160,00	129.393	20.702.880		0,00		0,00	0	0	0	0,00%
103	ARTEFACTO DE ILUMINACION TIPO REFLECTOR 2X300W EN POSTE DE HORMIGON 9/150, INCLUYE BASE DE FUNDACIÓN. CANCHA	Unidad	4,00	3.817.094	15.268.376		0,00		0,00	0	0	0	0,00%
104	SISTEMA DE FOTOCELULA PARA EXTERIOR. CANCHA	Global	1,00	1.876.199	1.876.199		0,00		0,00	0	0	0	0,00%
105	SISTEMA DE PUESTA A TIERRA. CANCHA	Global	1,00	2.722.045	2.722.045		0,00		0,00	0	0	0	0,00%
106	REGISTROS DE HORMIGON DE 40X40CM. CANCHA	Unidad	2,00	552.221	1.104.442		0,00		0,00	0	0	0	0,00%
107	REGISTROS DE HORMIGON DE 35X35CM. CANCHA	Unidad	2,00	516.591	1.033.182		0,00		0,00	0	0	0	0,00%

JOAPY S.A.
RUC: 80027137-8

Arq. Patricio Ortiz Cantero
Secretario de Obras
Gobernación de Misiones

108	LIMPIEZA DE TERRENO, ZONA TTE. BRUSQUETTI	Metros cuadrados	668,00	8.603	5.746.804		668,00		668,00	5.746.804	0	5.746.804	100,00%
109	MARCACION Y REPLANTEO DE OBRA.ZONA TTE. BRUSQUETTI	Metros cuadrados	668,00	6.447	4.306.596		0,00		0,00	0	0	0	0,00%
110	RELLENO Y COMPACTACION. ZONA TTE. BRUSQUETTI	Metros cúbicos	460,80	126,767	48.463,413		0,00		0,00	0	0	0	0,00%
111	CIMIENTO DE PIEDRA BRUTA COLOCADA, INCLUYE EXCAVACION. ZONA TTE. BRUSQUETTI	Metros cúbicos	13,50	580.544	7.837.344		0,00		0,00	0	0	0	0,00%
112	MAMPOSTERIA DE NIVELACION DE 0,30M CON LADRILLO COMUN. ZONA TTE. BRUSQUETTI	Metros cuadrados	20,00	248.600	4.972.000		0,00		0,00	0	0	0	0,00%
113	CONTRAPISO DE HORMIGON DE CASCOTES ESP 10CM. ZONA HOMENAJE AL TTE. BRUSQUETTI	Metros cuadrados	668,00	60.971	40.728.628		0,00		0,00	0	0	0	0,00%
114	PISO GRANITICO GRIS, BORDO, NEGRO 30X30CM ANTIDESLIZANTE PARA EXTERIOR. ZONA TTE. BRUSQUETTI	Metros cuadrados	687,20	227.516	156.348.995		0,00		0,00	0	0	0	0,00%
115	PISO CON LADRILLOS PICADOS Y GEOTEXTIL. ZONA TTE. BRUSQUETTI	Metros cuadrados	95,00	110.349	10.483.155		0,00		0,00	0	0	0	0,00%
116	PISO DE HORMIGON ARMADO DE ESPESOR: 0,07m. ZONA TTE. BRUSQUETTI	Metros cuadrados	33,50	174.134	5.833.489		0,00		0,00	0	0	0	0,00%
117	CONSTRUCCION DE ESCALERA DE MATERIAL. ZONA TTE. BRUSQUETTI	Global	1,00	10.718.896	10.718.896		0,00		0,00	0	0	0	0,00%
118	SERVICIO DE CONSTRUCCION DE MONUMENTO/ESCULTURA. ZONA TTE. BRUSQUETTI	Unidad	1,00	57.579.885	57.579.885		0,00		0,00	0	0	0	0,00%
119	ESTRUCTURA DE HORMIGON ARMADO, INCLUYE FUNDACION, PILAR, MOLDURAS. ZONA TTE. BRUSQUETTI	Unidad	1,00	22.864.565	22.864.565		0,00		0,00	0	0	0	0,00%
120	REVESTIMIENTO EN MARMOL. ZONA TTE. BRUSQUETTI	Metros cuadrados	4,41	2.922.844	12.889.742		0,00		0,00	0	0	0	0,00%
121	JARDINERÍA. ZONA TTE. BRUSQUETTI	Global	1,00	10.543.133	10.543.133		0,00		0,00	0	0	0	0,00%
122	BANCOS DE HORMIGON ARMADO DOBLE. ZONA TTE. BRUSQUETTI	Unidad	20,00	4.001.119	80.022.380		0,00		0,00	0	0	0	0,00%
123	PASTO EN PANES. ZONA TTE. BRUSQUETTI	Metros cuadrados	200,00	38.418	7.683.600		0,00		0,00	0	0	0	0,00%
124	BANCOS DE MATERIAL. ZONA TTE. BRUSQUETTI	Metro lineal	25,00	1.111.427	27.785.675		0,00		0,00	0	0	0	0,00%
125	ALIMENTACION ELECTRICA SUBTERRANEA CON CABLE NYY Y PROTECCION ELECTRICA MECANICA DESDE TP HASTA LOS ARTEFACTOS. ZONA TTE. BRUSQUETTI	Metro lineal	300,00	166.933	50.079.900		0,00		0,00	0	0	0	0,00%
126	ARTEFACTO DE ILUMINACION TIPO FAROL CON PEDESTAL INCLUYE BASE DE HORMIGÓN. ZONA TTE. BRUSQUETTI	Unidad	26,00	5.575.008	144.950.208		0,00		0,00	0	0	0	0,00%
127	ARTEFACTO DE ILUMINACION TIPO REFLECTOR LED IP66 PARA EXTERIOR EN ESCULTURA Y ARBOLES. ZONA TTE. BRUSQUETTI	Unidad	19,00	717.412	13.630.828		0,00		0,00	0	0	0	0,00%
128	ARTEFACTO DE ILUMINACION TIPO CINTA LED. ZONA TTE. BRUSQUETTI	Unidad	3,00	846.805	2.540.415		0,00		0,00	0	0	0	0,00%
129	SISTEMA DE FOTOCELULA PARA EXTERIOR. ZONA TTE. BRUSQUETTI	Global	1,00	1.876.199	1.876.199		0,00		0,00	0	0	0	0,00%
130	SISTEMA DE PUESTA A TIERRA. ZONA TTE. BRUSQUETTI	Global	1,00	2.722.045	2.722.045		0,00		0,00	0	0	0	0,00%
131	REGISTROS DE HORMIGON DE 40X40CM. ZONA TTE. BRUSQUETTI	Unidad	3,00	552.221	1.656.663		0,00		0,00	0	0	0	0,00%
132	REGISTROS DE HORMIGON DE 35X35CM. ZONA TTE. BRUSQUETTI	Unidad	6,00	516.591	3.099.546		0,00		0,00	0	0	0	0,00%
133	LIMPIEZA DE TERRENO. ACCESO VEHICULAR	Metros cuadrados	102,00	8.603	877.506		0,00		0,00	0	0	0	0,00%
134	DEMOLICIÓN DE PISO EXISTENTE. ACCESO VEHICULAR	Metros cuadrados	25,00	45.342	1.133.550		0,00		0,00	0	0	0	0,00%
135	MARCACION Y REPLANTEO DE OBRA. ACCESO VEHICULAR	Metros cuadrados	102,00	6.447	657.594		0,00		0,00	0	0	0	0,00%
136	PISO PAVERS DE 20X10X6CM PARA EXTERIOR, INCLUYE CAMA DE ARENA. ACCESO VEHICULAR	Metros cuadrados	102,00	165.966	16.938.732		0,00		0,00	0	0	0	0,00%
137	CORDON DE HORIGON SIMPLE PARA ADOQUINADO. ACCESO VEHICULAR	Metros cuadrados	93,00	67.716	6.297.588		0,00		0,00	0	0	0	0,00%
138	JARDINERÍA. ACCESO VEHICULAR	Global	1,00	4.217.253	4.217.253		0,00		0,00	0	0	0	0,00%
139	RAMPA DE HORMIGÓN ARMADO IN SITU PARA MINUSVÁLICOS. ACCESO VEHICULAR	Unidad	1,00	970.448	970.448		0,00		0,00	0	0	0	0,00%
140	CONTRAPISO DE HORMIGON DE CASCOTES ESP 10CM. ACCESO VEHICULAR	Metros cuadrados	95,00	60.971	5.792.245		0,00		0,00	0	0	0	0,00%
141	PISO GRANITICO GRIS 30X30CM ANTIDESLIZANTE PARA EXTERIOR. ACCESO VEHICULAR	Metros cuadrados	95,00	227.516	21.614.020		0,00		0,00	0	0	0	0,00%
142	PILASTRA DE ENERGIA ELECTRICA. ACCESO VEHICULAR	Unidad	1,00	7.138.294	7.138.294		0,00		0,00	0	0	0	0,00%
143	ALIMENTACION ELECTRICA SUBTERRANEA CON CABLE NYY Y PROTECCION ELECTRICA MECANICA. ACCESO VEHICULAR	Metro lineal	95,00	166.933	15.858.635		0,00		0,00	0	0	0	0,00%
144	TABLERO PRINCIPAL. ACCESO VEHICULAR	Unidad	1,00	8.104.606	8.104.606		0,00		0,00	0	0	0	0,00%
145	ARTEFACTO DE ILUMINACION TIPO FAROL CON PEDESTAL INCLUYE BASE DE HORMIGÓN. ACCESO VEHICULAR	Unidad	4,00	5.575.008	22.300.032		0,00		0,00	0	0	0	0,00%
146	ARTEFACTO DE ILUMINACION TIPO REFLECTOR LED IP66 PARA EXTERIOR. ACCESO VEHICULAR	Unidad	6,00	717.412	4.304.472		0,00		0,00	0	0	0	0,00%
147	SISTEMA DE FOTOCELULA PARA EXTERIOR. ACCESO VEHICULAR	Global	1,00	1.876.199	1.876.199		0,00		0,00	0	0	0	0,00%
148	SISTEMA DE PUESTA A TIERRA. ACCESO VEHICULAR	Global	1,00	2.722.045	2.722.045		0,00		0,00	0	0	0	0,00%
149	REGISTROS DE HORMIGON DE 40X40CM. ACCESO VEHICULAR	Unidad	3,00	552.221	1.656.663		0,00		0,00	0	0	0	0,00%
150	REGISTROS DE HORMIGON DE 35X35CM. ACCESO VEHICULAR	Unidad	6,00	516.591	3.099.546		0,00		0,00	0	0	0	0,00%
151	LIMPIEZA DE TERRENO. ACCESO MCAL LOPEZ	Metros cuadrados	665,00	8.603	5.720.995		0,00		0,00	0	0	0	0,00%
152	MARCACION Y REPLANTEO DE OBRA. ACCESO MCAL LOPEZ	Metros cuadrados	970,50	6.447	6.256.813		0,00		0,00	0	0	0	0,00%
153	DEMOLICION DE PISO EXISTENTE. ACCESO MCAL LOPEZ	Metros cuadrados	325,00	45.342	14.736.150		0,00		0,00	0	0	0	0,00%

JOAPY S.A.
RUC: 80027137-8

Arq. Patricio Ortiz Cantero
Secretario de Obras
Gobernación de Misiones

154	DEMOLICON DE MUROS CON SARDINEL EN CAMINEROS. ACCESO MCAL LOPEZ	Metro lineal	131,00	45.342	5.939.802		0,00		0,00	0	0	0	0,00%
155	CONTRAPISO DE HORMIGON DE CASCOTES ESP 10CM. ACCESO MCAL LOPEZ	Metros cuadrados	970,50	60.971	59.172.355		0,00		0,00	0	0	0	0,00%
156	PISO GRANITICO GRIS 30X30CM ANTIDESLIZANTE PARA EXTERIOR. ACCESO MCAL LOPEZ	Metros cuadrados	970,50	227.516	220.804.278		0,00		0,00	0	0	0	0,00%
157	PISO CON LADRILLOS PICADOS Y GEOTEXTIL. ACCESO MCAL LOPEZ	Metros cuadrados	260,00	110.349	28.690.740		0,00		0,00	0	0	0	0,00%
158	PISO PAVERS DE 20X10X6CM PARA EXTERIOR, INCLUYE CAMA DE ARENA. ACCESO MCAL LOPEZ	Metros cuadrados	138,50	166.066	23.000.141		0,00		0,00	0	0	0	0,00%
159	CORDON DE HORIGON SIMPLE PARA ADOQUINADO. ACCESO MCAL LOPEZ	Metros cuadrados	105,00	67.716	7.110.180		0,00		0,00	0	0	0	0,00%
160	BANCOS DE HORMIGON ARMADO. ACCESO MCAL LOPEZ	Unidad	14,00	2.471.406	34.599.684		0,00		0,00	0	0	0	0,00%
161	JARDINERÍA. ACCESO MCAL LOPEZ	Global	1,00	10.543.133	10.543.133		0,00		0,00	0	0	0	0,00%
162	ALIMENTACION ELECTRICA SUBTERRANEA CON CABLE NYY Y PROTECCION ELECTRICA MECANICA DESDE TP HASTA LOS ARTEFACTOS. ACCESO MCAL LOPEZ	Metro lineal	200,00	166.933	33.386.600		0,00		0,00	0	0	0	0,00%
163	RETIRO Y REUBICACION DE POSTE DE HORMIGON CON AP, INCLUYE REACONDICIONAMIENTO DE CABLEADO EXISTENTE. ACCESO MCAL LOPEZ	Unidad	1,00	4.162.142	4.162.142		0,00		0,00	0	0	0	0,00%
164	ARTEFACTO DE ILUMINACION TIPO FAROL CON PEDESTAL INCLUYE BASE DE HORMIGÓN. ACCESO MCAL LOPEZ	Unidad	14,00	5.575.008	78.050.112		0,00		0,00	0	0	0	0,00%
165	ARTEFACTO DE ILUMINACION TIPO REFLECTOR LED IP66 PARA EXTERIOR. ACCESO MCAL LOPEZ	Unidad	7,00	717.412	5.021.884		0,00		0,00	0	0	0	0,00%
166	SISTEMA DE FOTOCELULA PARA EXTERIOR. ACCESO MCAL LOPEZ	Global	1,00	1.876.199	1.876.199		0,00		0,00	0	0	0	0,00%
167	SISTEMA DE PUESTA A TIERRA. ACCESO MCAL LOPEZ	Global	1,00	4.355.272	4.355.272		0,00		0,00	0	0	0	0,00%
168	REGISTROS DE HORMIGON DE 40X40CM. ACCESO MCAL LOPEZ	Unidad	3,00	552.221	1.656.663		0,00		0,00	0	0	0	0,00%
169	REGISTROS DE HORMIGON DE 35X35CM. ACCESO MCAL LOPEZ	Unidad	6,00	516.591	3.099.546		0,00		0,00	0	0	0	0,00%
170	LIMPIEZA DE TERRENO. PISO BOSQUE	Metros cuadrados	632,00	8.603	5.437.096		632,00		632,00	5.437.096	0	5.437.096	100,00%
171	MARCACION Y REPLANTEO DE OBRA. PISO BOSQUE	Metros cuadrados	432,00	6.447	2.785.104		0,00		0,00	0	0	0	0,00%
172	DEMOLICION DE PISO EXISTENTE. PISO BOSQUE	Metros cuadrados	96,00	45.342	4.352.832		0,00		0,00	0	0	0	0,00%
173	DEMOLICON DE MUROS CON SARDINEL EN CAMINEROS. PISO BOSQUE	Metro lineal	68,00	45.342	3.083.256		0,00		0,00	0	0	0	0,00%
174	RELLENO Y COMPACTACION. PISO BOSQUE	Metros cúbicos	43,20	120.767	5.217.134		0,00		0,00	0	0	0	0,00%
175	PISO PAVERS DE 20X10X6CM PARA EXTERIOR, INCLUYE CAMA DE ARENA,. PISO BOSQUE	Metros cuadrados	432,00	166.066	71.740.512		0,00		0,00	0	0	0	0,00%
176	CORDON DE HORIGON SIMPLE PARA ADOQUINADO. PISO BOSQUE	Metro lineal	426,00	67.716	28.847.016		0,00		0,00	0	0	0	0,00%
177	PASTO EN PANES. PISO BOSQUE	Metros cuadrados	200,00	38.418	7.683.600		0,00		0,00	0	0	0	0,00%
178	BANCOS DE HORMIGON ARMADO. PISO BOSQUE	Unidad	10,00	2.471.406	24.714.060		0,00		0,00	0	0	0	0,00%
179	ALIMENTACION ELECTRICA SUBTERRANEA CON CABLE NYY Y PROTECCION ELECTRICA MECANICA DESDE EL TP. PISO BOSQUE	Metro lineal	200,00	128.410	25.682.000		0,00		0,00	0	0	0	0,00%
180	ARTEFACTO DE ILUMINACION TIPO REFLECTOR LED IP66 PARA EXTERIOR. PISO BOSQUE	Unidad	25,00	717.412	17.935.300		0,00		0,00	0	0	0	0,00%
181	SISTEMA DE FOTOCELULA PARA EXTERIOR. PISO BOSQUE	Global	1,00	1.876.199	1.876.199		0,00		0,00	0	0	0	0,00%
182	SISTEMA DE PUESTA A TIERRA. PISO BOSQUE	Global	1,00	6.260.704	6.260.704		0,00		0,00	0	0	0	0,00%
183	REGISTROS DE HORMIGON DE 40X40CM. PISO BOSQUE	Unidad	10,00	552.221	5.522.210		0,00		0,00	0	0	0	0,00%
184	REGISTROS DE HORMIGON DE 35X35CM. PISO BOSQUE	Unidad	23,00	516.591	11.881.593		0,00		0,00	0	0	0	0,00%
185	LIMPIEZA DE TERRENO. ACCESO CERRO CORA	Metros cuadrados	424,00	8.603	3.647.672		0,00	424,00	424,00	0	3.647.672	3.647.672	100,00%
186	MARCACION Y REPLANTEO DE OBRA. ACCESO CERRO CORA	Metros cuadrados	424,00	6.447	2.733.528		0,00	424,00	424,00	0	2.733.528	2.733.528	100,00%
187	DEMOLICION DE PISO EXISTENTE. ACCESO CERRO CORA	Metros cuadrados	514,00	22.671	11.652.894		0,00	514,00	514,00	0	11.652.894	11.652.894	100,00%
188	ESCALERA DE MATERIAL, INCLUYE DEMOLICION DE NIVELACION. ACCESO CERRO CORA	Metro lineal	10,00	214.577	2.145.770		0,00		0,00	0	0	0	0,00%
189	MAMPOSTERIA DE NIVELACION DE 030M CON LADRILLO COMUN. ACCESO CERRO CORA	Metros cuadrados	27,00	248.600	6.712.200		0,00	27,00	27,00	0	6.712.200	6.712.200	100,00%
190	CONTRAPISO DE HORMIGON DE CASCOTES ESP 10CM. ACCESO CERRO CORA	Metros cuadrados	424,00	121.942	51.703.408		0,00		0,00	0	0	0	0,00%
191	PISO GRANITICO GRIS 30X30CM ANTIDESLIZANTE PARA EXTERIOR. ACCESO CERRO CORA	Metros cuadrados	424,00	227.516	96.466.784		0,00		0,00	0	0	0	0,00%
192	PISO CON LADRILLOS PICADOS Y GEOTEXTIL. ACCESO CERRO CORA	Metros cuadrados	64,00	110.349	7.062.336		0,00		0,00	0	0	0	0,00%
193	PISO PAVERS DE 20X10X6CM PARA EXTERIOR, INCLUYE CAMA DE ARENA. ACCESO CERRO CORA	Metros cuadrados	425,00	166.066	70.578.050		0,00		0,00	0	0	0	0,00%
194	CORDON DE HORIGON SIMPLE PARA ADOQUINADO. ACCESO CERRO CORA	Metro lineal	252,00	67.716	17.064.432		0,00	252,00	252,00	0	17.064.432	17.064.432	100,00%
195	MURO DE PIEDRA BRUTA COLOCADA EN RAMPA. ACCESO CERRO CORA	Metros cúbicos	2,81	580.544	1.631.328		0,00		0,00	0	0	0	0,00%
196	ALIMENTACION ELECTRICA SUBTERRANEA CON CABLE NYY Y PROTECCION ELECTRICA MECANICA DESDE EL TP. ACCESO CERRO CORA	Metro lineal	210,00	128.410	26.966.100		0,00		0,00	0	0	0	0,00%
197	ARTEFACTO DE ILUMINACION TIPO FAROL CON PEDESTAL INCLUYE BASE DE HORMIGÓN. ACCESO CERRO CORA	Unidad	16,00	5.575.008	89.200.128		0,00		0,00	0	0	0	0,00%
198	ARTEFACTO DE ILUMINACION TIPO REFLECTOR LED IP66 PARA EXTERIOR. ACCESO MCAL LOPEZ	Unidad	10,00	717.412	7.174.120		0,00		0,00	0	0	0	0,00%
199	SISTEMA DE FOTOCELULA PARA EXTERIOR. ACCESO CERRO CORA	Global	1,00	1.876.199	1.876.199		0,00		0,00	0	0	0	0,00%
200	SISTEMA DE PUESTA A TIERRA. ACCESO CERRO CORA	Global	1,00	6.260.704	6.260.704		0,00		0,00	0	0	0	0,00%
201	REGISTROS DE HORMIGON DE 40X40CM. ACCESO CERRO CORA	Unidad	10,00	552.221	5.522.210		0,00		0,00	0	0	0	0,00%
202	REGISTROS DE HORMIGON DE 35X35CM. ACCESO CERRO CORA	Unidad	23,00	516.591	11.881.593		0,00		0,00	0	0	0	0,00%
203	BANCOS DE HORMIGON ARMADO. ACCESO CERRO CORA	Unidad	12,00	2.471.406	29.656.872		0,00		0,00	0	0	0	0,00%
204	JARDINERÍA. ACCESO CERRO CORA	Global	1,00	10.543.133	10.543.133		0,00		0,00	0	0	0	0,00%
205	PASTO EN PANES. ACCESO CERRO CORA	Metros cuadrados	100,00	38.418	3.841.800		0,00		0,00	0	0	0	0,00%
206	LIMPIEZA DE TERRENO. CAMINEROS CURVOS	Metros cuadrados	575,00	8.603	4.946.725		0,00	575,00	575,00	0	4.946.725	4.946.725	100,00%
207	REMOCION DE OBSTACULOS	Unidad	2,00	1.133.550	2.267.100		0,00		0,00	0	0	0	0,00%

JOAPY S.A.
RUC: 80027137-8

Arq. Patricio Ortiz Cantero
Secretario de Obras
Gobernación de Misiones

208	MARCACION Y REPLANTEO DE OBRA. CAMINEROS CURVOS	Metros cuadrados	575,00	6.447	3.707.025		0,00		0,00	0	0	0	0,00%
209	RELLENO Y COMPACTACIÓN. CAMINEROS CURVOS	Metros cúbicos	115,00	92.896	10.683.270		0,00		0,00	0	0	0	0,00%
210	MURO DE PIEDRA BRUTA COLOCADA EN RAMPA. CAMINEROS CURVOS	Metros cúbicos	2,81	580.544	1.631.328		0,00		0,00	0	0	0	0,00%
211	PISO DE ADOQUIN DE HORMIGON COLOR GRIS, INCLUYE CAMA DE ARENA. CAMINEROS CURVOS	Metros cuadrados	575,00	166.066	95.487.950		0,00		0,00	0	0	0	0,00%
212	CORDON DE HORICON SIMPLE PARA ADOQUINADO. CAMINEROS CURVOS	Metro lineal	670,00	67.716	45.369.720		0,00		0,00	0	0	0	0,00%
213	ALIMENTACION ELECTRICA SUBTERRANEA CON CABLE NYY Y PROTECCION ELECTRICA MECANICA DESDE EL TP. CAMINEROS CURVOS	Metro lineal	640,00	128.410	107.864.400		0,00		0,00	0	0	0	0,00%
214	ARTEFACTO DE ILUMINACION TIPO FAROL CON PEDESTAL PEQUEÑO ALT: 0,70M, INCLUYE BASE. CAMINEROS CURVOS	Unidad	61,00	717.412	43.762.132		0,00		0,00	0	0	0	0,00%
215	ARTEFACTO DE ILUMINACION TIPO REFLECTOR LED IP66 PARA EXTERIOR. CAMINEROS CURVOS	Unidad	40,00	717.412	28.696.480		0,00		0,00	0	0	0	0,00%
216	SISTEMA DE FOTOCELULA PARA EXTERIOR. CAMINEROS CURVOS	Global	1,00	1.876.199	1.876.199		0,00		0,00	0	0	0	0,00%
217	SISTEMA DE PUESTA A TIERRA. CAMINEROS CURVOS	Global	1,00	6.260.704	6.260.704		0,00		0,00	0	0	0	0,00%
218	REGISTROS DE HORMIGON DE 40X40CM. CAMINEROS CURVOS	Unidad	10,00	552.221	5.522.210		0,00		0,00	0	0	0	0,00%
219	REGISTROS DE HORMIGON DE 35X35CM. ACCESO CERRO CORA	Unidad	23,00	516.591	11.881.593		0,00		0,00	0	0	0	0,00%
220	PASTO EN PANES. CAMINEROS CURVOS	Metros cuadrados	1.005,00	38.418	38.610.090		0,00		0,00	0	0	0	0,00%
221	RETIRO DE EMPEDRADO EXISTENTE	Metros cuadrados	270,00	15.114	4.080.780		0,00		0,00	0	0	0	0,00%
222	PISO DE HORMIGON ARMADO DE ESPESOR: 0,07m CON TERMINACION RODILLADO	Metros cuadrados	270,00	174.134	47.016.180		0,00		0,00	0	0	0	0,00%
223	CORDON DE HORIGON SIMPLE	Metro lineal	108,00	67.716	7.313.328		0,00		0,00	0	0	0	0,00%
224	REPARACION DE MURO DE CONTENCIÓN Y SARDINEL DETRÁS DE CASETAS	Global	1,00	13.264.898	13.264.898		0,00		0,00	0	0	0	0,00%
225	BANCOS DE HORMIGON ARMADO.	Unidad	45,00	2.471.406	111.213.270		0,00		0,00	0	0	0	0,00%
226	MESA Y BANCO DE HORMIGON ARMADO	Unidad	6,00	8.901.622	53.409.732		0,00		0,00	0	0	0	0,00%
227	CARTELERIA FIJA	Unidad	4,00	4.004.417	16.017.668		0,00		0,00	0	0	0	0,00%
228	BASUREROS.	Unidad	22,00	2.257.189	49.658.158		0,00		0,00	0	0	0	0,00%
229	BOLARDOS	Unidad	50,00	552.077	27.603.850		0,00		0,00	0	0	0	0,00%
230	LIMPIEZA FINAL DE OBRA Y RETIRO DE ESCOMBROS.	Global	1,00	16.225.471	16.225.471		0,00		0,00	0	0	0	0,00%
				s/planilla	4.765.485.369					37.740.082	312.936.060	350.676.142	
				s/ contrato	4.765.485.368								

obs. Hay diferencias en la sumatoria de algun digito en redondeos del contrato o error de tipeo. No se alteran los precios unitarios y subtotales del contrato.

GOBERNIACIÓN DE MISIONES - RESUMEN DE CERTIFICACION 02

CONSTRUCCION DE OBRAS VARIAS EN EL DEPARTAMENTO (SEGUNDA PARTE) ID Nº 473,404

CONTRATO Nº 30 /2025

MONTO DE CONTRATO GS. 4,765,485,368.-

CONTRATISTA: JOAPY S.A.

FECHA: 03 de abril de 2.026

MONTO POR ANTICIPO DE MATERIALES:	1.102.300.000,00

ITEM	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Precio Total S/ CONTRATO	Precio Total S/ PLANILLA	monto por acopio de material	Certificado de Obras N°1	Certificado de Obras N°2	ACUMULADO	Avance %
1	Grupo 1 - Mejoramiento de Espacio Público en la Plaza Teniente Pedro Resquin de la Ciudad de San Ignacio	UN	1,00	4.765.485.368	4.765.485.368	4.765.485.369		37.740.082	312.936.060	350.676.142	7,36%
	monto por acopio de material						1.102.300.000			1.102.300.000	
					4.765.485.368	4.765.485.369	1.102.300.000	37.740.082	312.936.060	1.452.976.142	

RESUMEN GENERAL DEL 1ER. CERTIFICADO DEL 18 DE DICIEMBRE DE 2025		
MONTO TOTAL DE OBRA CONTRATADO		4.765.485.368
MONTO DE 1ER. CERTIFICADO		37.740.082
DESCUENTO FONDO DE REPARO 5% DE LA CERTIFICACION		1.887.004
TOTAL A COBRAR		35.853.078
MONTO FINAL A PAGAR CON EL DESCUENTO DE FONDOS DE REPARO		
MONTO TOTAL DE FACTURAS PRESENTADAS POR ACOPIO	23,13%	1.102.300.000
MONTO DEL CERTIFICADO CON DESCUENTO		35.853.078
MONTO GENERAL A PAGAR		1.138.153.078

RESUMEN GENERAL DEL 2do. CERTIFICADO DEL 21 de abril de 2025		
MONTO TOTAL DE OBRA CONTRATADO		4.765.485.368
MONTO DE 2do. CERTIFICADO		312.936.060
DESCUENTO FONDO DE REPARO 5% DE LA CERTIFICACION		15.646.803
TOTAL A COBRAR		297.289.257
Descuento por acopio de material	23,13%	68.765.702
MONTO GENERAL A PAGAR		228.523.555

Abg. Patricio Ortiz Cantero
Secretario de Obras
Gobernación de Misiones

JOAPY S.A.
RUC: 80027137-8

GOBERNACIÓN DE MISIONES - ACTA DE MEDICION CERTIFICACION 02 - LOTE 4

CONSTRUCCION DE OBRAS VARIAS EN EL DEPARTAMENTO (SEGUNDA PARTE) ID Nº 473,404

CONTRATO Nº 30 /2025

MONTO DE CONTRATO GS. 4,765,485,368.-

CONTRATISTA: JOAPY S.A

FECHA: 01 de abril de 2.026

MONTO POR ANTICIPO DE MATERIALES: 1.102.300.000./ Gs

Item	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total		CANTIDAD CERTIFICADA ANTERIOR	CANTIDAD CERTIFICADA ACTUAL	CANTIDAD CERTIFICADA ACUMULADA	% DE AVANCE
Grupo 1 - Mejoramiento de Espacio Público en la Plaza Teniente Pedro Brusquetti de la ciudad de San Ignacio										
1	CARTEL DE OBRA Y PLANCHA DE GRANITO	Unidad	1,00	7.260.385	7.260.385		0,50		0,50	50,00%
2	OBRADOR	Unidad	1,00	16.964.860	16.964.860		1,00		1,00	100,00%
3	LIMPIEZA DE TERRENO,BAÑOS PUBLICOS	Metros cuadracos	57,75	8.603	496.823		57,75		57,75	100,00%
4	MARCACION Y REPLANTEO DE OBRA, BAÑOS PUBLICOS	cuadracos	40,25	6.447	259.491		40,25		40,25	100,00%
5	EXCAVACION DEL TERRENO. BAÑOS PUBLICOS	Metros cúbicos	8,66	58.342	505.241		0,00	8,66	8,66	100,00%
6	ZAPATAS DE HORMIGON ARMADO. BAÑOS PUBLICOS	Metros cúbicos	1,80	3.201.471	5.762.647		0,00	1,80	1,80	100,00%
7	RELLENO Y COMPACTACION; BAÑOS PUBLICOS	Metros cúbicos	8,66	120.767	1.045.842		0,00	8,66	8,66	100,00%
8	PILAR DE HORMIGON ARMADO. BAÑOS PUBLICOS	Metro lineal	19,50	285.898	5.575.011		0,00	19,50	19,50	100,00%
9	VIGA DE FUNDACION DE HORMIGON ARMADO. BAÑOS PUBLICOS	Metros cúbicos	2,83	4.108.248	11.626.341		0,00	2,83	2,83	100,00%
10	VIGAS SUPERIORES DE HORMIGON ARMADO. BAÑOS PUBLICOS	Metros cúbicos	2,59	4.108.248	10.640.362		0,00	2,59	2,59	100,00%
11	AISLACION HORIZONTAL DE PAREDES 0,15M. BAÑOS PUBLICOS	Metro lineal	26,60	32.205	856.653		0,00	26,60	26,60	100,00%
12	AISLACION HORIZONTAL DE PAREDES 0,30M. BAÑOS PUBLICOS	Metro lineal	8,30	46.103	382.654		0,00	8,30	8,30	100,00%
13	MAMPOSTERIA DE NIVELACION DE 0,30M CON LADRILLO COMUN. BAÑOS PUBLICOS	Metros cuadracos	3,49	248.600	867.614		0,00	3,49	3,49	100,00%
14	MAMPOSTERIA DE ELEVACION DE 0,15M CON LADRILLO COMUN A REVOCAR AMBAS CARAS. BAÑOS PUBLICOS	Metros cuadracos	85,51	174.106	14.887.804		0,00	85,51	85,51	100,00%
15	MAMPOSTERIA DE ELEVACION DE 030M CON LADRILLO COMUN. BAÑOS PUBLICOS	Metros cuadracos	26,25	264.120	6.933.150		0,00	26,25	26,25	100,00%
16	ENVARILLADO DE MAMPOSTERIAS. BAÑOS PUBLICOS	Metro lineal	19,10	50.075	956.432		0,00	19,10	19,10	100,00%
17	REVESTIMIENTO DE PAREDES CON LADRILLO COMÚN PRENSADO COLORADO Y QUEMADOS. BAÑOS PUBLICOS	Metros cuadracos	54,30	185.739	10.085.627		0,00		0,00	0,00%
18	TECHO DE CHAPA TERMOACUSTICA TRAPEZOIDAL SOBRE ESTRUCTURA METALICA. BAÑOS PUBLICOS	Metros cuadracos	58,71	462.939	27.179.148		0,00	58,71	58,71	100,00%
19	REVOQUE INTERIOR - EXTERIOR. BAÑOS PUBLICOS	Metros cuadracos	223,52	53.264	11.905.569		0,00	223,52	223,52	100,00%
20	CONTRAPISO DE HORMIGON DE CASCOTES ESP 10CM. BAÑOS PUBLICOS	Metros cuadracos	33,50	60.971	2.042.528		0,00	33,50	33,50	100,00%
21	PISO CERAMICO. BAÑOS PUBLICOS	Metros cuadracos	33,50	166.954	5.592.959		0,00		0,00	0,00%
22	ZOCALO CERAMICO. BAÑOS PUBLICOS	Metro lineal	8,75	72.307	632.686		0,00		0,00	0,00%
23	REVESTIMIENTO TIPO AZULEJOS ALTURA: 1,80M. BAÑOS PUBLICOS	Metros cuadracos	50,40	139.851	7.048.490		0,00		0,00	0,00%
24	MESADA DE GRANITO. BAÑOS PUBLICOS	Metros cuadracos	1,08	2.178.116	2.352.365		0,00		0,00	0,00%
25	PUERTA METALICA DE UNA HOJA DE ABRIR DE 1,00X210M. BAÑOS PUBLICOS	Unidad	4,00	1.896.326	7.585.304		0,00	2,00	2,00	50,00%
26	VENTANA EN VIDRIO TEMPLADO DE 8MM. BAÑOS PUBLICOS	Metros cuadracos	1,26	1.024.362	1.290.896		0,00		0,00	0,00%
27	INSTALACION DE DESAGUE CLOACAL EN BAÑOS. BAÑOS PUBLICOS	Unidad	4,00	1.109.251	4.437.004		0,00	4,00	4,00	100,00%
28	CAÑO DE VENTILACION EN PVC DE 50MM. BAÑOS PUBLICOS	Metro lineal	9,00	41.549	373.941		0,00	9,00	9,00	100,00%
29	CAÑO DE DESAGUE CLOACAL EN PVC DE 100MM. BAÑOS PUBLICOS	Metro lineal	8,00	84.106	672.848		0,00	8,00	8,00	100,00%
30	REGISTRO DE INSPECCION DE 060X060M. BAÑOS PUBLICOS	Unidad	3,00	633.786	1.901.358		0,00	3,00	3,00	100,00%
31	CAMARA SEPTICA,BAÑOS PUBLICOS	Unidad	1,00	3.133.633	3.133.633		0,00	1,00	1,00	100,00%
32	POZO ABSORBENTE. BAÑOS PUBLICOS	Unidad	1,00	4.172.205	4.172.205		0,00	1,00	1,00	100,00%
33	ALIMENTACION DE CANERIA DE AGUA CORRIENTE . BAÑOS PUBLICOS	Metro lineal	45,00	73.323	3.299.535		0,00	45,00	45,00	100,00%
34	INSTALACION DE AGUA CORRIENTE FRIO SOLO EN BAÑOS. BAÑOS PUBLICOS	Unidad	4,00	1.559.905	6.239.620		0,00	4,00	4,00	100,00%
35	ARTEFACTOS SANITARIOS EN BAÑOS. BAÑOS PUBLICOS	Unidad	2,00	3.773.963	7.547.926		0,00		0,00	0,00%
36	ARTEFACTOS SANITARIOS EN BAÑO MINUSVALIDOS. BAÑOS PUBLICOS	Unidad	2,00	4.032.749	8.065.498		0,00		0,00	0,00%
37	CANALETA DE CHAPA PLEGADA Nº24 DES 0,33m. BAÑOS PUBLICOS	Metro lineal	9,95	116.454	1.158.717		0,00		0,00	0,00%
38	BAJADA DE CHAPA PLEGADA Nº24 DES 0,33m. BAÑOS PUBLICOS	Metro lineal	7,60	116.454	885.050		0,00		0,00	0,00%
39	PINTURA DE PAREDES CON LATEX INTERIOR EXTERIOR. BAÑOS PUBLICOS	Metros cuadracos	118,82	35.044	4.163.928		0,00		0,00	0,00%
40	TRATAMIENTO DE MAMPOSTERIAS A LA VISTA. BAÑOS PUBLICOS	Metros cuadracos	54,30	32.313	1.754.596		0,00		0,00	0,00%
41	PINTURA DE ABERTURAS METALICAS CON ESMALTE SINTETICO. BAÑOS PUBLICOS	Metros cuadracos	18,92	46.438	878.606		0,00		0,00	0,00%
42	PINTURA DE TECHO CON ESMALTE SINTETICO. BAÑOS PUBLICOS	Metros cuadracos	58,71	45.417	2.668.193		0,00		0,00	0,00%
43	PINTURA DE CANALETAS Y BAJADAS CON ESMALTE SINTETICO. BAÑOS PUBLICOS	Metro lineal	17,55	33.704	591.505		0,00		0,00	0,00%
44	ALIMENTACION ELECTRICA SUBTERRANEA CON CABLE NYY Y PROTECCION ELECTRICA MECANICA DESDE EL PUESTO DE ALIMENTACION PRINCIPAL AL TP Y TS. BAÑOS PUBLICOS	Metro lineal	150,00	166.933	25.039.950		0,00		0,00	0,00%
45	TABLERO SECCIONAL. BAÑOS PUBLICOS	Unidad	1,00	4.265.582	4.265.582		0,00		0,00	0,00%
46	BOCA DE LUCES. BAÑOS PUBLICOS	Unidad	8,00	199.840	1.598.720		0,00		0,00	0,00%
47	ARTEFACTO DE ILUMINACION TIPO COLGANTE CON LAMPARA TIPO PLATO LED. BAÑOS PUBLICOS	Unidad	4,00	333.546	1.334.184		0,00		0,00	0,00%

JOAPY S.A.
RUC: 80027137-8

Abg. Pedro Ortiz Cantero
Secretario de Obras
Gobernación de Misiones

48	ARTEFACTO DE ILUMINACION TIPO APLIQUE DECORATIVO PARA EXTERIOR, BAÑOS PUBLICOS	Unidad	2,00	355.112	710.224		0,00		0,00	0,00%
49	ARTEFACTO DE ILUMINACION TIPO REFLECTOR LED IP66 PARA EXTERIOR, BAÑOS PUBLICOS	Unidad	2,00	717.412	1.434.824		0,00		0,00	0,00%
50	REGISTROS DE HORMIGON DE 40X40CM. BAÑOS PUBLICOS	Unidad	4,00	552.221	2.208.884		0,00		0,00	0,00%
51	SISTEMA DE FOTOCELULA PARA EXTERIOR, BAÑOS PUBLICOS	Global	1,00	1.876.199	1.876.199		0,00		0,00	0,00%
52	SISTEMA DE PUESTA A TIERRA, BAÑOS PUBLICOS	Global	1,00	2.722.045	2.722.045		0,00		0,00	0,00%
53	LIMPIEZA FINAL DE OBRA Y RETIRO DE ESCOMBROS, BAÑOS PUBLICOS	Metros cuadrados	40,25	7.393	297.568		0,00		0,00	0,00%
54	LIMPIEZA DE TERRENO. VEREDA	Metros cuadrados	879,50	8.603	7.566.338		0,00	250,00	250,00	28,43%
55	MARCACION Y REPLANTEO DE OBRA. VEREDA	Metros cuadrados	879,50	6.447	5.670.136		0,00	250,00	250,00	28,43%
56	DEMOLICION DE PISO EXISTENTE. VEREDA	Metros cuadrados	879,50	45.342	39.878.289		0,00	250,00	250,00	28,43%
57	PISO PAVERS DE 20X10X6CM PARA EXTERIOR, INCLUYE CAMA DE ARENA. VEREDA	Metros cuadrados	879,50	166.066	146.055.047		0,00		0,00	0,00%
58	LINEA DE ADOQUIN TACTIL AMARILLO PARA LINEA DE VEREDAS, INCLUYE CAMA DE ARENA. VEREDA	Metro lineal	432,00	74.616	32.234.112		0,00		0,00	0,00%
59	CORDON DE HORMIGON DE 0,10X0,30X050M. VEREDA	Metro lineal	810,00	67.716	54.849.960		0,00	200,00	200,00	24,69%
60	RAMPA DE HORMIGÓN ARMADO IN SITU PARA MINUSVÁLICOS. VEREDA	Unidad	4,00	970.448	3.881.792		0,00		0,00	0,00%
61	LIMPIEZA DE TERRENO. AREA JUEGOS	Metros cuadrados	560,00	8.603	4.817.680		560,00		560,00	100,00%
62	JUEGOS INFANTILES SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS. AREA JUEGOS	Unidad	1,00	351.021.000	351.021.000		0,00		0,00	0,00%
63	HAMACA MAMÁ Y BEBE. AREA JUEGOS	Unidad	1,00	18.029.000	18.029.000		0,00		0,00	0,00%
64	COLUMPIO PARA SILLA DE RUEDAS. AREA JUEGOS	Unidad	1,00	35.090.000	35.090.000		0,00		0,00	0,00%
65	JUEGO RESORTE. AREA JUEGOS	Unidad	3,00	7.865.000	23.595.000		0,00		0,00	0,00%
66	CAPSULA SCANDERE. AREA JUEGOS	Unidad	1,00	17.182.000	17.182.000		0,00		0,00	0,00%
67	PISO DE HORMIGON ARMADO DE ESPESOR: 0,07m. AREA JUEGOS	Metros cuadrados	560,00	174.134	97.515.040		0,00	560,00	560,00	100,00%
68	PASTO SINTÉTICO, ESPESOR 50MM. AREA JUEGOS	Metros cuadrados	560,00	213.172	119.376.320		0,00		0,00	0,00%
69	PISO DE CAUCHO, ESPESOR 40MM. AREA JUEGOS	Metros cuadrados	40,00	832.907	33.316.280		0,00		0,00	0,00%
70	BARANDA METÁLICA PERIMETRAL ALTURA: 1,20m, INCLUYE PORTONES DE ACCESO Y PINTURA. AREA JUEGOS	Metro lineal	96,00	701.036	67.299.456		0,00		0,00	0,00%
71	ALIMENTACION ELECTRICA SUBTERRANEA CON CABLE NYY Y PROTECCION ELECTRICA MECANICA DESDE EL TP, AREA DE JUEGOS	Metro lineal	150,00	166.933	25.039.950		0,00		0,00	0,00%
72	ARTEFACTO DE ILUMINACION TIPO FAROL CON PEDESTAL INCLUYE BASE DE HORMIGÓN, AREA DE JUEGOS	Unidad	9,00	5.575.008	50.175.072		0,00		0,00	0,00%
73	ARTEFACTO DE ILUMINACION TIPO AP LED BRAZO DE 4M EN POSTE DE HORMIGON 9/150, INCLUYE BASE DE FUNDACIÓN	Unidad	4,00	3.098.244	12.392.976		0,00		0,00	0,00%
74	SISTEMA DE FOTOCELULA PARA EXTERIOR. AREA DE JUEGOS	Global	1,00	1.876.199	1.876.199		0,00		0,00	0,00%
75	SISTEMA DE PUESTA A TIERRA. AREA DE JUEGOS	Global	1,00	2.722.045	2.722.045		0,00		0,00	0,00%
76	REGISTROS DE HORMIGON DE 40X40CM. AREA JUEGOS	Unidad	2,00	552.221	1.104.442		0,00		0,00	0,00%
77	REGISTROS DE HORMIGON DE 35X35CM. AREA JUEGOS	Unidad	3,00	516.591	1.549.773		0,00		0,00	0,00%
78	CARTELERIA FIJA. AREA JUEGOS	Unidad	4,00	1.134.345	4.537.380		0,00		0,00	0,00%
79	BANCOS DE MADERA PLASTICA. AREA JUEGOS	Unidad	15,00	2.666.934	40.004.010		0,00		0,00	0,00%
80	LIMPIEZA DE TERRENO. AREA DE EJERCICIOS	Metros cuadrados	45,00	8.603	387.135		45,00		45,00	100,00%
81	RELLENO Y COMPACTACION. AREA DE EJERCICIOS	Metros cubicos	4,50	120.767	543.451		0,00	4,50	4,50	100,00%
82	CONTRAPISO DE HORMIGON DE CASCOTES ESP 10CM. AREA EJERCICIOS	Metros cuadrados	45,00	60.971	2.743.695		0,00	45,00	45,00	100,00%
83	PISO ALISADO DE CEMENTO 3CM. AREA EJERCICIOS	Metros cuadrados	45,00	91.205	4.104.225		0,00	45,00	45,00	100,00%
84	PINTURA DE PISO CON PINTURA PARA CANCHA. AREA EJERCICIOS	Metros cuadrados	45,00	50.320	2.264.400		0,00		0,00	0,00%
85	SIMULADOR DE CAMINATA, AREA DE EJERCICIOS	Unidad	2,00	6.703.400	13.406.800		0,00		0,00	0,00%
86	BICICLETA ESTÁTICA, AREA DE EJERCICIOS	Unidad	1,00	10.514.900	10.514.900		0,00		0,00	0,00%
87	BARRA PARALELA, AREA DE EJERCICIOS	Unidad	1,00	7.792.400	7.792.400		0,00		0,00	0,00%
88	DORSALERA, AREA DE EJERCICIOS	Unidad	1,00	13.310.000	13.310.000		0,00		0,00	0,00%
89	BANCO ABDOMINAL, AREA DE EJERCICIOS	Unidad	1,00	5.590.200	5.590.200		0,00		0,00	0,00%
90	ALIMENTACION ELECTRICA SUBTERRANEA CON CABLE NYY Y PROTECCION ELECTRICA MECANICA. AREA DE EJERCICIOS	Metro lineal	75,00	166.933	12.519.975		0,00		0,00	0,00%
91	ARTEFACTO DE ILUMINACION TIPO FAROL CON PEDESTAL INCLUYE BASE DE HORMIGÓN. AREA DE EJERCICIOS	Unidad	4,00	5.575.008	22.300.032		0,00		0,00	0,00%
92	SISTEMA DE FOTOCELULA PARA EXTERIOR, AREA DE EJERCICIOS	Global	1,00	1.876.199	1.876.199		0,00		0,00	0,00%
93	SISTEMA DE PUESTA A TIERRA, AREA DE EJERCICIOS	Global	1,00	2.722.045	2.722.045		0,00		0,00	0,00%
94	REGISTROS DE HORMIGON DE 40X40CM. AREA DE EJERCICIOS	Unidad	2,00	552.221	1.104.442		0,00		0,00	0,00%
95	REGISTROS DE HORMIGON DE 35X35CM. AREA DE EJERCICIOS	Unidad	3,00	516.591	1.549.773		0,00		0,00	0,00%
96	LIMPIEZA DE TERRENO. CANCHA	Metros cuadrados	400,00	8.603	3.441.200		0,00	400,00	400,00	100,00%
97	RELLENO Y COMPACTACION. CANCHA	Metros cubicos	92,40	120.767	11.158.870		0,00		0,00	0,00%
98	CONFORMACION DE BASE CANCHA	Metros cuadrados	924,00	81.086	74.923.464		0,00		0,00	0,00%
99	CESPED SINTETICO. DE 50MM, INCLUYE LINEAS BLANCAS DE MARCACION,CANCHA	Metros cuadrados	924,00	214.810	198.499.840		0,00		0,00	0,00%
100	REDES PERIMETRALES CON CAÑOS, ALTURA:5,00M. CANCHA	Metros cuadrados	640,00	34.792	22.266.880		0,00		0,00	0,00%
101	ARCOS DE FUTBOL, EL PAR INCLUYE RED.CANCHA	Metro lineal	1,00	8.253.836	8.253.836		0,00		0,00	0,00%
102	ALIMENTACION ELECTRICA SUBTERRANEA CON CABLE NYY Y PROTECCION ELECTRICA MECANICA, CANCHA	Metro lineal	160,00	129.393	20.702.880		0,00		0,00	0,00%
103	ARTEFACTO DE ILUMINACION TIPO REFLECTOR 2X300W EN POSTE DE HORMIGON 9/150, INCLUYE BASE DE FUNDACIÓN, CANCHA	Unidad	4,00	3.817.094	15.268.376		0,00		0,00	0,00%
104	SISTEMA DE FOTOCELULA PARA EXTERIOR, CANCHA	Global	1,00	1.876.199	1.876.199		0,00		0,00	0,00%
105	SISTEMA DE PUESTA A TIERRA, CANCHA	Global	1,00	2.722.045	2.722.045		0,00		0,00	0,00%
106	REGISTROS DE HORMIGON DE 40X40CM, CANCHA	Unidad	2,00	552.221	1.104.442		0,00		0,00	0,00%
107	REGISTROS DE HORMIGON DE 35X35CM, CANCHA	Unidad	2,00	516.591	1.033.182		0,00		0,00	0,00%

JOAPY S.A.
RUC: 80027137-8

Abg. Pablo Ortiz Cantero
Secretario de Obras
Gobernación de Misiones

GOBERNACIÓN DE MISIONES
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS

108	LIMPIEZA DE TERRENO, ZONA TTE. BRUSQUETTI	Metros cuadrados	668,00	8.603	5.746.804		668,00		668,00	100,00%
109	MARCACION Y REPLANTEO DE OBRA.ZONA TTE. BRUSQUETTI	Metros cuadrados	668,00	6.447	4.306.596		0,00		0,00	0,00%
110	RELLENO Y COMPACTACION. ZONA TTE. BRUSQUETTI	Metros cúbicos	400,80	120.767	48.403.413		0,00		0,00	0,00%
111	CIMIENTO DE PIEDRA BRUTA COLOCADA, INCLUYE EXCAVACION. ZONA TTE. BRUSQUETTI	Metros cúbicos	13,50	580.544	7.837.344		0,00		0,00	0,00%
112	MAMPOSTERIA DE NIVELACION DE 0,30M CON LADRILLO COMUN. ZONA TTE. BRUSQUETTI	Metros cuadrados	20,00	248.600	4.972.000		0,00		0,00	0,00%
113	CONTRAPISO DE HORMIGON DE CASCOTES ESP 10CM. ZONA HOMENAJE AL TTE. BRUSQUETTI	Metros cuadrados	668,00	60.971	40.728.628		0,00		0,00	0,00%
114	PISO GRANITICO GRIS, BORDO, NEGRO 30X30CM ANTIDESLIZANTE PARA EXTERIOR. ZONA TTE. BRUSQUETTI	Metros cuadrados	687,20	227.516	156.348.995		0,00		0,00	0,00%
115	PISO CON LADRILLOS PICADOS Y GEOTEXTIL. ZONA TTE. BRUSQUETTI	Metros cuadrados	95,00	110.349	10.483.155		0,00		0,00	0,00%
116	PISO DE HORMIGON ARMADO DE ESPESOR: 0,07m. ZONA TTE. BRUSQUETTI	Metros cuadrados	33,50	174.134	5.833.489		0,00		0,00	0,00%
117	CONSTRUCCION DE ESCALERA DE MATERIAL. ZONA TTE. BRUSQUETTI	Global	1,00	10.718.898	10.718.898		0,00		0,00	0,00%
118	SERVICIO DE CONSTRUCCION DE MONUMENTO/ESCULTURA. ZONA TTE. BRUSQUETTI	Unidad	1,00	57.579.885	57.579.885		0,00		0,00	0,00%
119	ESTRUCTURA DE HORMIGON ARMADO, INCLUYE FUNDACION, PILAR, MOLDURAS. ZONA TTE. BRUSQUETTI	Unidad	1,00	22.864.565	22.864.565		0,00		0,00	0,00%
120	REVESTIMIENTO EN MARMOL. ZONA TTE. BRUSQUETTI	Metros cuadrados	4,41	2.922.844	12.889.742		0,00		0,00	0,00%
121	JARDINERÍA. ZONA TTE. BRUSQUETTI	Global	1,00	10.543.133	10.543.133		0,00		0,00	0,00%
122	BANCOS DE HORMIGON ARMADO DOBLE. ZONA TTE. BRUSQUETTI	Unidad	20,00	4.001.119	80.022.380		0,00		0,00	0,00%
123	PASTO EN PANES. ZONA TTE. BRUSQUETTI	Metros cuadrados	200,00	38.418	7.683.600		0,00		0,00	0,00%
124	BANCOS DE MATERIAL. ZONA TTE. BRUSQUETTI	Metro lineal	25,00	1.111.427	27.785.675		0,00		0,00	0,00%
125	ALIMENTACION ELECTRICA SUBTERRANEA CON CABLE NYY Y PROTECCION ELECTRICA MECANICA DESDE TP HASTA LOS ARTEFACTOS. ZONA TTE. BRUSQUETTI	Metro lineal	300,00	166.933	50.079.900		0,00		0,00	0,00%
126	ARTEFACTO DE ILUMINACION TIPO FAROL CON PEDESTAL INCLUYE BASE DE HORMIGÓN. ZONA TTE. BRUSQUETTI	Unidad	26,00	5.575.008	144.950.208		0,00		0,00	0,00%
127	ARTEFACTO DE ILUMINACION TIPO REFLECTOR LED IP66 PARA EXTERIOR EN ESCULTURA Y ARBOLES. ZONA TTE. BRUSQUETTI	Unidad	19,00	717.412	13.630.828		0,00		0,00	0,00%
128	ARTEFACTO DE ILUMINACION TIPO CINTA LED. ZONA TTE. BRUSQUETTI	Unidad	3,00	846.805	2.540.415		0,00		0,00	0,00%
129	SISTEMA DE FOTOCELULA PARA EXTERIOR. ZONA TTE. BRUSQUETTI	Global	1,00	1.876.199	1.876.199		0,00		0,00	0,00%
130	SISTEMA DE PUESTA A TIERRA. ZONA TTE. BRUSQUETTI	Global	1,00	2.722.045	2.722.045		0,00		0,00	0,00%
131	REGISTROS DE HORMIGON DE 40X40CM. ZONA TTE. BRUSQUETTI	Unidad	3,00	552.221	1.656.663		0,00		0,00	0,00%
132	REGISTROS DE HORMIGON DE 35X35CM. ZONA TTE. BRUSQUETTI	Unidad	6,00	516.591	3.099.546		0,00		0,00	0,00%
133	LIMPIEZA DE TERRENO, ACCESO VEHICULAR	Metros cuadrados	102,00	8.603	877.506		0,00		0,00	0,00%
134	DEMOLICIÓN DE PISO EXISTENTE, ACCESO VEHICULAR	Metros cuadrados	25,00	45.342	1.133.550		0,00		0,00	0,00%
135	MARCACION Y REPLANTEO DE OBRA. ACCESO VEHICULAR	Metros cuadrados	102,00	6.447	657.594		0,00		0,00	0,00%
136	PISO PAVERS DE 20X10X8CM PARA EXTERIOR, INCLUYE CAMA DE ARENA; ACCESO VEHICULAR	Metros cuadrados	102,00	166.008	16.938.732		0,00		0,00	0,00%
137	CORDON DE HORIGON SIMPLE PARA ADOQUINADO. ACCESO VEHICULAR	Metros cuadrados	93,00	67.716	6.297.588		0,00		0,00	0,00%
138	JARDINERÍA, ACCESO VEHICULAR	Global	1,00	4.217.253	4.217.253		0,00		0,00	0,00%
139	RAMPA DE HORMIGÓN ARMADO IN SITU PARA MINUSVÁLICOS. ACCESO VEHICULAR	Unidad	1,00	970.448	970.448		0,00		0,00	0,00%
140	CONTRAPISO DE HORMIGON DE CASCOTES ESP 10CM. ACCESO VEHICULAR	Metros cuadrados	95,00	60.971	5.792.245		0,00		0,00	0,00%
141	PISO GRANITICO GRIS 30X30CM ANTIDESLIZANTE PARA EXTERIOR. ACCESO VEHICULAR	Metros cuadrados	95,00	227.516	21.614.020		0,00		0,00	0,00%
142	PILASTRA DE ENERGIA ELECTRICA. ACCESO VEHICULAR	Unidad	1,00	7.138.294	7.138.294		0,00		0,00	0,00%
143	ALIMENTACION ELECTRICA SUBTERRANEA CON CABLE NYY Y PROTECCION ELECTRICA MECANICA. ACCESO VEHICULAR	Metro lineal	95,00	166.933	15.858.635		0,00		0,00	0,00%
144	TABLERO PRINCIPAL, ACCESO VEHICULAR	Unidad	1,00	8.104.606	8.104.606		0,00		0,00	0,00%
145	ARTEFACTO DE ILUMINACION TIPO FAROL CON PEDESTAL INCLUYE BASE DE HORMIGÓN. ACCESO VEHICULAR	Unidad	4,00	5.575.008	22.300.032		0,00		0,00	0,00%
146	ARTEFACTO DE ILUMINACION TIPO REFLECTOR LED IP66 PARA EXTERIOR. ACCESO VEHICULAR	Unidad	6,00	717.412	4.304.472		0,00		0,00	0,00%
147	SISTEMA DE FOTOCELULA PARA EXTERIOR. ACCESO VEHICULAR	Global	1,00	1.876.199	1.876.199		0,00		0,00	0,00%
148	SISTEMA DE PUESTA A TIERRA. ACCESO VEHICULAR	Global	1,00	2.722.045	2.722.045		0,00		0,00	0,00%
149	REGISTROS DE HORMIGON DE 40X40CM. ACCESO VEHICULAR	Unidad	3,00	552.221	1.656.663		0,00		0,00	0,00%
150	REGISTROS DE HORMIGON DE 35X35CM. ACCESO VEHICULAR	Unidad	6,00	516.591	3.099.546		0,00		0,00	0,00%
151	LIMPIEZA DE TERRENO. ACCESO MCAL LOPEZ	Metros cuadrados	665,00	8.603	5.720.995		0,00		0,00	0,00%
152	MARCACIÓN Y REPLANTEO DE OBRA, ACCESO MCAL LOPEZ	Metros cuadrados	970,50	6.447	6.256.813		0,00		0,00	0,00%
153	DEMOLICION DE PISO EXISTENTE, ACCERO MCAL LOPEZ	Metros cuadrados	325,00	45.342	14.736.150		0,00		0,00	0,00%

GOBERNACION DE MISIONES · SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

Abg. Patricio Ortiz Cartero
Secretario de Obras
Gobierno de Misiones

JOAPY S.A.
RUC: 80027137-8

154	DEMOLICON DE MUROS CON SARDINEL EN CAMINEROS. ACCESO MCAL LOPEZ	Metro lineal	131,00	45.342	5.939.802		0,00		0,00	0,00%
155	CONTRAPISO DE HORMIGON DE CASCOTES ESP 10CM. ACCESO MCAL LOPEZ	Metros cuadrados	970,50	60.971	59.172.355		0,00		0,00	0,00%
156	PISO GRANITICO GRIS 30X30CM ANTIDESLIZANTE PARA EXTERIOR. ACCESO MCAL LOPEZ	Metros cuadrados	970,50	227.516	220.804.278		0,00		0,00	0,00%
157	PISO CON LADRILLOS PICADOS Y GEOTEXTIL. ACCESO MCAL LOPEZ	Metros cuadrados	260,00	110.349	28.690.740		0,00		0,00	0,00%
158	PISO PAVERS DE 20X10X6CM PARA EXTERIOR, INCLUYE CAMA DE ARENA. ACCESO MCAL LOPEZ	Metros cuadrados	136,50	166.066	23.000.141		0,00		0,00	0,00%
159	CORDON DE HORIGON SIMPLE PARA ADOQUINADO. ACCESO MCAL LOPEZ	Metros cuadrados	105,00	67.716	7.110.180		0,00		0,00	0,00%
160	BANCOS DE HORMIGON ARMADO. ACCESO MCAL LOPEZ	Unidad	14,00	2.471.406	34.599.684		0,00		0,00	0,00%
161	JARDINERÍA, ACCESO MCAL LOPEZ	Global	1,00	10.543.133	10.543.133		0,00		0,00	0,00%
162	ALIMENTACION ELECTRICA SUBTERRANEA CON CABLE NYY Y PROTECCION ELECTRICA MECANICA DESDE TP HASTA LOS ARTEFACTOS. ACCESO MCAL LOPEZ	Metro lineal	200,00	166.933	33.386.600		0,00		0,00	0,00%
163	RETIRO Y REUBICACION DE POSTE DE HORMIGON CON AP, INCLUYE REACONDICIONAMIENTO DE CABLEADO EXISTENTE. ACCESO MCAL LOPEZ	Unidad	1,00	4.182.142	4.182.142		0,00		0,00	0,00%
164	ARTEFACTO DE ILUMINACION TIPO FAROL CON PEDESTAL INCLUYE BASE DE HORMIGÓN. ACCESO MCAL LOPEZ	Unidad	14,00	5.575.008	78.050.112		0,00		0,00	0,00%
165	ARTEFACTO DE ILUMINACION TIPO REFLECTOR LED IP66 PARA EXTERIOR. ACCESO MCAL LOPEZ	Unidad	7,00	717.412	5.021.884		0,00		0,00	0,00%
166	SISTEMA DE FOTOCELULA PARA EXTERIOR. ACCESO MCAL LOPEZ	Global	1,00	1.876.199	1.876.199		0,00		0,00	0,00%
167	SISTEMA DE PUESTA A TIERRA. ACCESO MCAL LOPEZ	Global	1,00	4.355.272	4.355.272		0,00		0,00	0,00%
168	REGISTROS DE HORMIGON DE 40X40CM. ACCESO MCAL LOPEZ	Unidad	3,00	552.221	1.656.663		0,00		0,00	0,00%
169	REGISTROS DE HORMIGON DE 35X35CM. ACCESO MCAL LOPEZ	Unidad	6,00	516.591	3.099.546		0,00		0,00	0,00%
170	LIMPIEZA DE TERRENO. PISO BOSQUE	Metros cuadrados	632,00	8.603	5.437.096		632,00		632,00	100,00%
171	MARCACION Y REPLANTEO DE OBRA. PISO BOSQUE	Metros cuadrados	432,00	6.447	2.785.104		0,00		0,00	0,00%
172	DEMOLICION DE PISO EXISTENTE. PISO BOSQUE	Metros cuadrados	96,00	45.342	4.352.832		0,00		0,00	0,00%
173	DEMOLICON DE MUROS CON SARDINEL EN CAMINEROS. PISO BOSQUE	Metro lineal	68,00	45.342	3.083.256		0,00		0,00	0,00%
174	RELLENO Y COMPACTACION. PISO BOSQUE	Metros cúbicos	43,20	120.767	5.217.134		0,00		0,00	0,00%
175	PISO PAVERS DE 20X10X6CM PARA EXTERIOR, INCLUYE CAMA DE ARENA,. PISO BOSQUE	Metros cuadrados	432,00	166.066	71.740.512		0,00		0,00	0,00%
176	CORDON DE HORIGON SIMPLE PARA ADOQUINADO. PISO BOSQUE	Metro lineal	426,00	67.716	28.847.016		0,00		0,00	0,00%
177	PASTO EN PANES. PISO BOSQUE	Metros cuadrados	200,00	38.418	7.683.600		0,00		0,00	0,00%
178	BANCOS DE HORMIGON ARMADO. PISO BOSQUE	Unidad	10,00	2.471.406	24.714.060		0,00		0,00	0,00%
179	ALIMENTACION ELECTRICA SUBTERRANEA CON CABLE NYY Y PROTECCION ELECTRICA MECANICA DESDE EL TP. PISO BOSQUE	Metro lineal	200,00	128.410	25.682.000		0,00		0,00	0,00%
180	ARTEFACTO DE ILUMINACION TIPO REFLECTOR LED IP66 PARA EXTERIOR. PISO BOSQUE	Unidad	25,00	717.412	17.935.300		0,00		0,00	0,00%
181	SISTEMA DE FOTOCELULA PARA EXTERIOR. PISO BOSQUE	Global	1,00	1.876.199	1.876.199		0,00		0,00	0,00%
182	SISTEMA DE PUESTA A TIERRA. PISO BOSQUE	Global	1,00	6.260.704	6.260.704		0,00		0,00	0,00%
183	REGISTROS DE HORMIGON DE 40X40CM. PISO BOSQUE	Unidad	10,00	552.221	5.522.210		0,00		0,00	0,00%
184	REGISTROS DE HORMIGON DE 35X35CM. PISO BOSQUE	Unidad	23,00	516.591	11.881.593		0,00		0,00	0,00%
185	LIMPIEZA DE TERRENO. ACCESO CERRO CORA	Metros cuadrados	424,00	8.603	3.647.672		0,00	424,00	424,00	100,00%
186	MARCACION Y REPLANTEO DE OBRA. ACCESO CERRO CORA	Metros cuadrados	424,00	6.447	2.733.528		0,00	424,00	424,00	100,00%
187	DEMOLICION DE PISO EXISTENTE. ACCESO CERRO CORA	Metros cuadrados	514,00	22.671	11.652.894		0,00	514,00	514,00	100,00%
188	ESCALERA DE MATERIAL. INCLUYE DEMOLICION DE NIVELACION. ACCESO CERRO CORA	Metro lineal	10,00	214.577	2.145.770		0,00		0,00	0,00%
189	MAMPOSTERIA DE NIVELACION DE 030M CON LADRILLO COMUN. ACCESO CERRO CORA	Metros cuadrados	27,00	248.600	6.712.200		0,00	27,00	27,00	100,00%
190	CONTRAPISO DE HORMIGON DE CASCOTES ESP 10CM. ACCESO CERRO CORA	Metros cuadrados	424,00	121.942	51.703.408		0,00		0,00	0,00%
191	PISO GRANITICO GRIS 30X30CM ANTIDESLIZANTE PARA EXTERIOR. ACCESO CERRO CORA	Metros cuadrados	424,00	227.516	96.466.784		0,00		0,00	0,00%
192	PISO CON LADRILLOS PICADOS Y GEOTEXTIL. ACCESO CERRO CORA	Metros cuadrados	64,00	110.349	7.062.336		0,00		0,00	0,00%
193	PISO PAVERS DE 20X10X6CM PARA EXTERIOR, INCLUYE CAMA DE ARENA. ACCESO CERRO CORA	Metros cuadrados	425,00	166.066	70.578.050		0,00		0,00	0,00%
194	CORDON DE HORIGON SIMPLE PARA ADOQUINADO. ACCESO CERRO CORA	Metro lineal	252,00	67.716	17.064.432		0,00	252,00	252,00	100,00%
195	MURO DE PIEDRA BRUTA COLOCADA EN RAMPA. ACCESO CERRO CORA	Metros cúbicos	2,81	580.544	1.631.328		0,00		0,00	0,00%
196	ALIMENTACION ELECTRICA SUBTERRANEA CON CABLE NYY Y PROTECCION ELECTRICA MECANICA DESDE EL TP. ACCESO CERRO CORA	Metro lineal	210,00	128.410	26.966.100		0,00		0,00	0,00%
197	ARTEFACTO DE ILUMINACION TIPO FAROL CON PEDESTAL INCLUYE BASE DE HORMIGÓN. ACCESO CERRO CORA	Unidad	16,00	5.575.008	89.200.128		0,00		0,00	0,00%
198	ARTEFACTO DE ILUMINACION TIPO REFLECTOR LED IP66 PARA EXTERIOR. ACCESO MCAL LOPEZ	Unidad	10,00	717.412	7.174.120		0,00		0,00	0,00%
199	SISTEMA DE FOTOCELULA PARA EXTERIOR. ACCESO CERRO CORA	Global	1,00	1.876.199	1.876.199		0,00		0,00	0,00%
200	SISTEMA DE PUESTA A TIERRA. ACCESO CERRO CORA	Global	1,00	6.260.704	6.260.704		0,00		0,00	0,00%
201	REGISTROS DE HORMIGON DE 40X40CM. ACCESO CERRO CORA	Unidad	10,00	552.221	5.522.210		0,00		0,00	0,00%
202	REGISTROS DE HORMIGON DE 35X35CM. ACCESO CERRO CORA	Unidad	23,00	516.591	11.881.593		0,00		0,00	0,00%
203	BANCOS DE HORMIGON ARMADO. ACCESO CERRO CORA	Unidad	12,00	2.471.406	29.656.872		0,00		0,00	0,00%
204	JARDINERÍA, ACCESO CERRO CORA	Global	1,00	10.543.133	10.543.133		0,00		0,00	0,00%
205	PASTO EN PANES. ACCESO CERRO CORA	Metros cuadrados	100,00	38.418	3.841.800		0,00		0,00	0,00%
206	LIMPIEZA DE TERRENO. CAMINEROS CURVOS	Metros cuadrados	575,00	8.603	4.946.725		0,00	575,00	575,00	100,00%
207	REMOCION DE OBSTACULOS	Unidad	2,00	1.133.550	2.267.100		0,00		0,00	0,00%

JOAPY S.A.
RUC: 80027137-8

GOBERNACIÓN DEL PARAGUAY
Secretaría de Obras
Gobernación de Misiones
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS

208	MARCACION Y REPLANTEO DE OBRA. CAMINEROS CURVOS	Metros cuadrados	575,00	6.447	3.707.025		0,00		0,00	0,00%
209	RELLENO Y COMPACTACIÓN. CAMINEROS CURVOS	Metros cúbicos	115,00	92.898	10.683.270		0,00		0,00	0,00%
210	MURO DE PIEDRA BRUTA COLOCADA EN RAMPA. CAMINEROS CURVOS	Metros cúbicos	2.81	580.544	1.631.326		0,00		0,00	0,00%
211	PISO DE ADOQUÍN DE HORMIGON COLOR GRIS, INCLUYE CAMA DE ARENA. CAMINEROS CURVOS	Metros cuadrados	575,00	166.066	95.487.950		0,00		0,00	0,00%
212	CORDON DE HORIGON SIMPLE PARA ADOQUINADO. CAMINEROS CURVOS	Metro lineal	670.00	67.716	45.389.720		0,00		0,00	0,00%
213	ALIMENTACION ELECTRICA SUBTERRANEA CON CABLE NYY Y PROTECCION ELECTRICA MECANICA DESDE EL TP. CAMINEROS CURVOS	Metro lineal	840,00	128.410	107.864.400		0,00		0,00	0,00%
214	ARTEFACTO DE ILUMINACION TIPO FAROL CON PEDESTAL PEQUEÑO ALT: 0,70M, INCLUYE BASE. CAMINEROS CURVOS	Unidad	61,00	717.412	43.762.132		0,00		0,00	0,00%
215	ARTEFACTO DE ILUMINACION TIPO REFLECTOR LED IP66 PARA EXTERIOR. CAMINEROS CURVOS	Unidad	40,00	717.412	28.696.480		0,00		0,00	0,00%
216	SISTEMA DE FOTOCELULA PARA EXTERIOR. CAMINEROS CURVOS	Global	1,00	1.876.199	1.876.199		0,00		0,00	0,00%
217	SISTEMA DE PUESTA A TIERRA. CAMINEROS CURVOS	Global	1,00	6.260.704	6.260.704		0,00		0,00	0,00%
218	REGISTROS DE HORMIGON DE 40X40CM. CAMINEROS CURVOS	Unidad	10,00	552.221	5.522.210		0,00		0,00	0,00%
219	REGISTROS DE HORMIGON DE 35X35CM, ACCESO CERRO CORA	Unidad	23,00	516.591	11.881.593		0,00		0,00	0,00%
220	PASTO EN PANES. CAMINEROS CURVOS	Metros cuadrados	1.065,00	36.418	38.610.090		0,00		0,00	0,00%
221	RETIRO DE EMPEDRADO EXISTENTE	Metros cuadrados	270,00	15.114	4.080.780		0,00		0,00	0,00%
222	PISO DE HORMIGON ARMADO DE ESPESOR: 0,07m CON TERMINACION RODRILLADO	Metros cuadrados	270,00	174.134	47.016.180		0,00		0,00	0,00%
223	CORDON DE HORIGON SIMPLE	Metro lineal	108,00	67.716	7.313.328		0,00		0,00	0,00%
224	REPARACION DE MURO DE CONTENCIÓN Y SARDINEL DETRÁS DE CASETAS	Global	1,00	13.264.898	13.264.898		0,00		0,00	0,00%
225	BANCOS DE HORMIGON ARMADO.	Unidad	45,00	2.471.406	111.213.270		0,00		0,00	0,00%
226	MESA Y BANCO DE HORMIGON ARMADO	Unidad	6,00	8.901.622	53.409.732		0,00		0,00	0,00%
227	CARTELERIA FIJA	Unidad	4,00	4.004.417	16.017.668		0,00		0,00	0,00%
228	BASUREROS.	Unidad	22,00	2.257.189	49.658.158		0,00		0,00	0,00%
229	BOLARDOS	Unidad	50,00	552.077	27.603.850		0,00		0,00	0,00%
230	LIMPIEZA FINAL DE OBRA Y RETIRO DE ESCOMBROS.	Global	1,00	16.225.471	16.225.471		0,00		0,00	0,00%
				s/planilla	4.765.485.369					

La presente medición fue presentada por el contratista y verificada en presencia del mismo; con la presencia de representante de la Secretaria de Obras Publicas PATRICIO ORTIZ. Los datos registrados corresponden a cantidades de obras implantadas conforme a las EETT consignadas en el PBC del llamado. Verificando las planillas del contrato hemos enontrado diferncias en la sumatoria general que arrojan por demas o de menos en digitos. que probablemente sea por error involuntario de redondeos, decimales o mal tipeo, no alteran los precios unitarios ni las cantidades. Esta acta de medición fue consignada en tres copias, en fecha 01 de ABRIL de 2026, en el sitio de obra .

obs. Hay diferencias en la sumatoria de algun digito en redondeos del contrato o error de tipeo. No se alteran los precios unitarios y subtotales del contrato.

JOAPY S.A.
RUC: 80027137-8

Arq. Patricio Ortiz Cantero
Secretario de Obras
Gobernación de Misiones
