C.I.V.S.A.
Constructora Isacio Vallejos S.A.
Construyendo con Ud. al País

NOTA N°: 20/2025.
Asunción, 9 de julio de 2025.

Señor:
ING. GUSTAVO ROBADIN;
DIRECCION DE VIALIDAD;
MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS (M.O.P.C.)
Presente:

Ref.: LLAMADO MOPC N° 98/2021 LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL DE EMPRESAS CONSTRUCTORAS VIALES ESPECIALIZADAS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA CIRCUNVALACIÓN DE LA CIUDAD DE CURUGUATY. ID 402.398.

Asunto: CRONOGRAMA REPROGRAMADO SEGÚN ORDEN DE EJECUCION N°07 CM3.

Tengo el agrado de dirigirme a Ud., a los efectos de remitir adjunto a la presente el CRONOGRAMA Y CURVA FISICO-FINANCIERO REPROGRAMADO según Orden de Ejecución N°07 +CM3..

Se adjunta uno (1) copia en formato físico.

Sin otro particular le saludo atentamente.

Ing. Isacio E. Vallejos A.
Representante Legal
C.I.V.S.A.
Constructora Isacio Vallejos S.A.
Construyendo con Ud. al País

Ing. Isacio E. Vallejos A.
Representante legal.

RECIBIDO
09 JUL 2025
DIRECCION DE VIALIDAD
12:43

C.I.V.S.A.
Consorcio Isacio Vallejos S.A
Construyendo con Ud. al País

CRONOGRAMA DE OBRA REPROGRAMADO SEGÚN ORDEN DE EJECUCION N°07 + CMN°03

LLAMADO MOPC N° 98/2021 LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL DE EMPRESAS CONSTRUCTORAS VIALES ESPECIALIZADAS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA CIRCUNVALACIÓN DE LA CIUDAD DE CURUGUATY. ID 402.398

				MOTIVOS DE FUERZA MAYOR			DESARROLLO DE LA OBRA																									
Nº ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD CMN°03	MES 1 - 22 MARZO 2023	MES 2-ABRIL 2023	MES 3- MAYO 2023	MES 4 - 9 JUNIO 2023	MES 5- JULIO 2023	MES 6- AGOSTO 2023	MES 7- SETIEMBRE 2023	MES 8- OCTUBRE 2023	MES 9 - NOVIEMBRE 2023	MES 10- DICIEMBRE 2023	MES 11- ENERO 2024	MES 12- FEBRERO 2024	MES 13- MARZO 2023	MES 14- ABRIL 2024	MES 15- MAYO 2024	MES 16- JUNIO 2024	MES 17 - JULIO 2024	MES 18 - AGOSTO 2024	MES 19 - SEPTIEMBRE 2024	MES 20 - OCTUBRE 2024	MES 21 - NOVIEMBRE 2024	MES 22 - DICIEMBRE 2024	MES 23 - ENERO 2024	MES 24 - FEBRERO 2025	MES 25 - MARZO 2025	MES 26 - ABRIL 2025	MES 27 - MAYO 2025	MES 28 - JUNIO 2025	MES 29 - JULIO 2025	MES 30 - 28 AGOSTO 2025
	MOVIMIENTO DE SUELO																															
1	Desbosque, Desbrose y Despeje	ha	31,00				11,81%	17,74%	17,03%	3,55%	2,77%	5,71%	3,74%						16,13%							1,52%							
2	Excavación no Clasificada	m3	65.213,44						1,22%		36,55%	8,62%									8,94%	8,94%	8,94%	8,94%	8,94%	8,94%							
3	Excavación de Bolsones	m3	38.308,96					20,00%	20,00%	20,00%															20,00%	20,00%							
4	Excavación zanjas de drenaje	m3	2.387,28						30,65%	27,46%											5,98%	5,98%	5,98%	5,98%	5,98%	5,98%	5,98%						
5	Terraplén	m3	311.414,70					10,93%	16,47%	10,95%	10,49%	2,61%		3,43%	3,85%	3,85%	3,85%	3,85%	6,42%								23,27%						
6	Excavación Estructural	m3	1.180,60															50,00%	50,00%														
	PAVIMENTO																																
7	Sub rasante mejorada CBR 15%	m3	34.254,80																10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%					
8	Riego de Imprimación	L	127.896,63																			10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	12,00%	12,00%	15,00%	15,00%	6,00%			
9	Riego de Liga	L	39.352,81																											20,00%	30,00%	50,00%	
10	Sub Base Cementada Rc7 ≤ 2.8 Mpa (e=20 cm)	m3	20.989,62																		10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	12,00%	12,00%	13,00%	13,00%				
11	Base Granular CBR 100	m3	19.689,40																			10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	12,00%	12,00%	15,00%	15,00%	6,00%			
12	Carpeta de Concreto Asfáltico en banquina	m3	1.535,30																											20,00%	20,00%	30,00%	30,00%
13	Carpeta de Concreto Asfáltico en caliente (polimero)	m3	3.249,37																											20,00%	20,00%	30,00%	30,00%
14	Pavimento tipo empedrado (Arranques)	m2	26.003,16																		7,50%	7,50%	7,50%	7,50%	7,50%	7,50%	7,50%	7,50%	7,50%	7,50%	7,50%	8,50%	9,00%
	OBRAS DE ARTE																																
	Alcantarillas Tubulares de Hormigón Armado																																
15	Alcantarilla Tubular Simple D= 0,80 m	ml	71,00											22,54%			22,54%	22,54%	28,17%	2,11%	2,11%												
16	Alcantarilla Tubular Simple D= 1,00 m	ml	16,00																		25,00%	25,00%	25,00%	25,00%									
17	Alcantarilla Tubular Simple D= 1,20 m	ml	122,00								16,39%						83,61%																
18	Alcantarilla Tubular Doble D= 0,80 m	ml	43,00															33,33%	33,33%	33,33%													
19	Alcantarilla Tubular Triple D= 1,20 m	ml	34,00									44,12%					55,88%																
	Alcantarillas Celulares de Hormigón Armado																																
20	Alcantarilla Celular Simple de H"A" 1,50x1,50m	ml	33,00								30,30%	33,30%		12,30%										15,00%	9,10%								
21	Alcantarilla Celular Simple de H"A" 3,00x3,00m	ml	23,00															33,33%	33,33%	33,33%													
22	Alcantarilla Celular Doble H"A" 1,50x1,50m	ml	39,00								51,28%						48,72%																
23	Alcantarilla Celular Doble H"A" 2,00x2,00m	ml	35,00															33,33%	33,33%	33,33%													
24	Alcantarilla Celular Triple H"A" 1,50x1,50m	ml	72,00																20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%										
	OBRAS COMPLEMENTARIAS																																
25	Señalización vertical	m2	99,51																													50,00%	50,00%
26	Señalización Horizontal	m2	3.825,95																													50,00%	50,00%
27	Baranda metalica de contención vehicular	ml	-																														
28	Tachas bidireccionales	un	1.970,00																														100,00%
29	Cordón Cuneta	ml	7.892,82																		10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%			
30	Mojones de kilometraje	m2	14,00																														100,00%
31	Empastado	m2	51.249,15																		10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%			
32	Traslado de estructuras de servicio publico	un	16,00																10,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	10,00%									
33	Construcción de Alambrado	m	13.902,00					4,00%	4,00%	5,00%	5,00%						10,00%	10,00%	10,00%	8,67%	8,67%	8,67%	8,67%	8,67%	8,67%								
34	Pórtico de señalización	un	2,00																												50,00%	50,00%	
35	Cuneta Revestida de Hormigón	ml	7.800,00																10,00%	10,00%	10,00%	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	10,00%							
36	Disipadores de hormigón	m3	33,49																			10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	15,00%	15,00%			
37	Canaleta de bajada	ml	390,00																								20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%		
38	Cordón de hormigón	ml	1.620,00																	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%				
39	Cajas de captación ATS0,80	m3	34,01																												50,00%	50,00%	
40	Cajas de captación ACT1,50X1,50	m3	-																														
41	Gradas disipadoras	m3	22,03																								20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%		
42	Canalizacion de muro de piedra bruta	m3	-																														
43	Darsenas y casetas para Refugio de Pasajeros	un	2,00																												50,00%	50,00%	
44	Protección de Areas de Préstamos	un	3,00																														100,00%
45	Iluminación con artefactos	un	39,00																												50,00%	50,00%	
	INSTALACION Y SERVICIOS ESPECIALIZADOS																																
46	Instalacion y Servicios Especializados	Mes	22,00				4,55%	4,55%	4,55%	4,55%	4,55%	4,55%	4,55%	4,55%	4,55%	4,55%	4,55%	4,55%	4,55%	4,55%	4,55%	4,55%	4,55%	4,55%	4,55%	4,55%	4,55%	4,55%					
	MOVILIZACION																																
47	Movilizacion	Gl	1,00				50,00%	30,00%	20,00%																								
	PLAN DE GESTION SOCIO AMBIENTAL PGA																																
48	Plan de gestion socio ambiental PGA	Gl	1,00																9,73%		9,73%		9,73%		9,73%					20,36%	20,36%	20,36%	
	INDEMNIZACION																																
49	Indemnizacion	Gl	-																														
	RUBROS NUEVOS - CM N° 02																																
50	Baranda metalica de contención vehicular H1AW2	ml	4.060,00																												50,00%	50,00%	
	RUBROS NUEVOS - CM N° 03																																
51	Relleno granular	m3	61,74														25,00%	25,00%	25,00%	25,00%													
52	Dren Profundo	ml	3.627,00															10,00%	10,00%	10,00%	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	10,00%								
53	Paso de ganado	un	2,00																					25,00%	25,00%	25,00%	15,00%					10,00%	
54	Alcantarilla Celular Triple H"A" 1,50x1,50m - e= 25 cm	ml	43,00																					25,00%	25,00%	25,00%	25,00%						
55	Baden de H°	ml	271,00																				20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%						
56	Excavacion en Roca	m3	6.884,00																	60,00%	40,00%												
				0,00%	0,00%	0,00%	1,14%	3,87%	4,95%	3,17%	4,10%	1,42%	0,11%	1,02%	1,01%	1,01%	2,72%	2,28%	4,07%	3,16%	4,59%	4,85%	5,39%	5,76%	6,10%	5,45%	9,96%	3,84%	3,49%	5,35%	11,49%	13,72%	5,97%
				0,00%	0,00%	0,00%	1,14%	5,01%	9,96%	13,14%	17,24%	18,66%	18,77%	19,78%	20,79%	21,80%	24,51%	26,80%	30,87%	34,02%	38,61%	43,45%	48,84%	54,60%	60,70%	66,15%	76,11%	79,95%	83,45%	88,79%	100,29%	114,01%	119,98%

Ing. Isacio L. Vallejos A.
Representante Legal
C.I.V.S.A.
Consorcio Isacio Vallejos S.A
Construyendo con Ud. al País

CURVA DE AVANCE FISICO - FINANCIERO REPROGRAMADA SEGÚN ORDEN DE EJECUCION NRO 07+ CMN°03

CONTRATISTA: CIVSA

Contrato SG Ministro N° 180/2022

Llamado MOPC No.: 98/2021

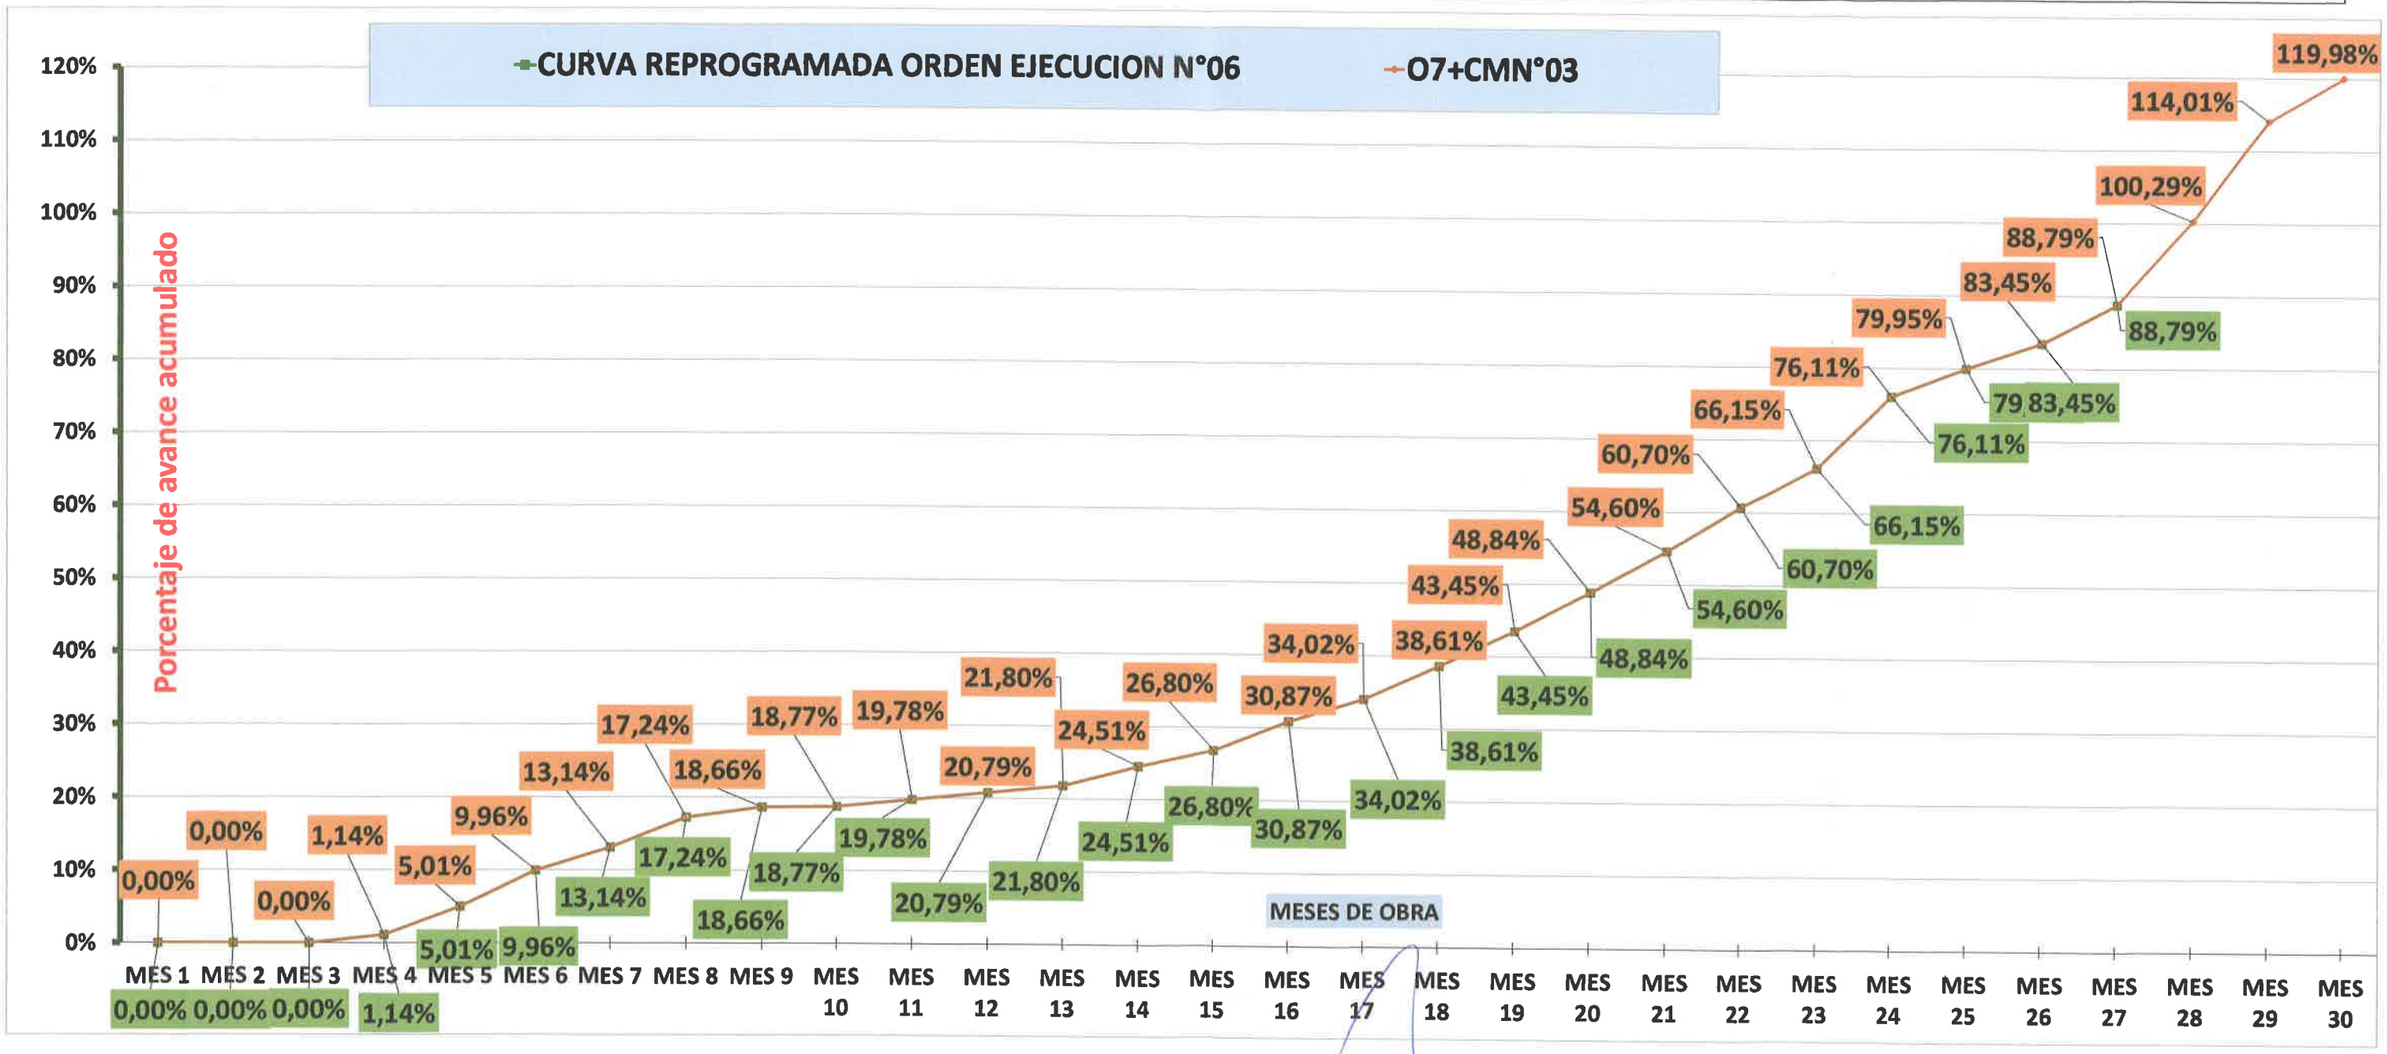

Ing. Isacio L. Vallejos A.
Representante Legal
C.I.V.S.A.
Constructora Isacio Vallejos S.A
Construyendo con Ud. al País
