MUNICIPALIDAD DE MINGA GUAZÚ

OBRA: ***Construcción de pavimento tipo empedrado***

DISTRITO: Minga Guazú **DEPTO:** Alto Paraná

UBICACIÓN: km17,5 Monday / Fracción universitaria

CERTIFICADO DE OBRAS N° 01						CERTIFICADOS ACTUAL		
Nº	Descripción	Un	Cant.	P. Unit.	Total	ACUMULADO EN CANTIDADES	% EN CANTIDADES	ACUMULADO EN MONTO
	Trabajos Preliminares							
1	Cartel de obra (2,00x1,80mts)	m2	3,60	495.000	1.782.000	3,60	100	1.782.000
2	Replanteo: Levantamiento plani-altimétrico y marcación	m2	1.812,00	2.400	4.348.800	1.812,00	100	4.348.800
3	Preparación de suelo con Motoniveladora.	m2	1.812,00	3.160	5.725.920	1.812,00	100	5.725.920
	Pavimento Tipo Empedrado con colchón de tierra colorada					-	100	0
4	Colchón: Tierra Colorada (12cm de espesor)	m3	217,44	26.000	5.653.440	217,44	100	5.653.440
5	Piedra bruta basáltica (0,20m3/m2)	m2	1.812,00	36.500	66.138.000	1.812,00	100	66.138.000
6	Enripiado: Triturada tipo VI: (0,02 tn/m2)	m2	1.812,00	3.800	6.885.600	1.812,00	100	6.885.600
	Cordón de Hº					-	100	0
7	Cordón prefabricado de Ho. 10x50x30(cm) c/ protección lateral	ml	53,00	39.000	2.067.000	53,00	100	2.067.000
8	Cordón cuneta	ml	400,00	109.000	43.600.000	400,00	100	43.600.000
	Compactación					-	100	0
9	Compactación preliminar	m2	1.812,00	2.950	5.345.400	1.812,00	100	5.345.400
10	Compactación final	m2	1.812,00	3.100	5.617.200	1.812,00	100	5.617.200
	Limpieza final					-	100	0
11	Limpieza final	m2	1.812,00	1.500	2.718.000	1.812,00	100	2.718.000
TOTAL SEGÚN CONTRATO SEGÚN CONTRATO N° 31/2023				Total	₵ 149.881.360	TOTAL SEGÚN CERTIFICADO		₵ 149.881.360

un unidad
m metro
m2 metro cuadrado
m3 metro cúbico

Municipalidad de Minga Guazú
Dirección Obras y Servicios
Periodo 2021-2025

Monto de Certificado	149.881.360
Descuento de Anticipo	
Fondo de Reparo	7.494.068
Total a Pagar por Certificado	142.387.292

Constructora Dos Hermanos
Ing. Diego Franco
Representante

MUNICIPALIDAD DE
MINGA GUAZÚ

Municipalidad de Minga Guazú
Dirección de Obras

Avda. Mcal. Estigarribia Esq. Bernardino Caballero– Km. 16 Minga Guazú
ALTO PARANÁ – PARAGUAY
Teléf. (0644) 20666 Fax. (0644) 21397

ACTA DE RECEPCION PROVISORIA.

VERIFICACION Y CUMPLIMENTO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS

ACTA N° 1

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO PARA EL DISTRITO DE MINGA GUAZU - CONTRATO N° 32 /2.023-ID: N° 422.716.

CONTRATISTA: SR. DIEGO GUILLERMO FRANCO – CONSTRUCTORA DOS HERMANOS -RUC: 4013685-0

En la ciudad de Minga Guazú, Decimo Departamento de Alto Paraná, a los cinco días del mes de octubre del año dos mil veintitrés, siendo las nueve horas. Yo Arq. Miguel Cáceres en mi carácter de Director de Obras en representación de la Municipalidad de Minga Guazú y en común acuerdo con la empresa contratista me constituyo en el sitio de la obra **"CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO PARA EL DISTRITO DE MINGA GUAZU - CONTRATO N° 32 /2.023-ID: N° 422.716 : LOTE N° 02 Construcción de Pavimento Tipo Empedrado- km 17,5 Monday-Fracción Universitaria"** para la RECEPCION PROVISORIA de los trabajos previstos en las especificaciones de obras de la empresa contratista del **SR. DIEGO GUILLERMO FRANCO – CONSTRUCTORA DOS HERMANOS -RUC: 4013685-0 .**

Por tanto, la Municipalidad a través de esta Fiscalización RECIBE EN FORMA PROVISORIA en todo de acuerdo a las especificaciones y calidades de obra requeridas, quedando todavía bajo la responsabilidad del contratista los vicios ocultos que puedan surgir a posterior.

Sin otro particular, la saludo atentamente.

Municipalidad de Minga Guazú
Dirección Obras y Servicios
Periodo 2021-2025

Arq. Miguel Cáceres
Director de Obras y Servicios

Constructora Dos Hermanos
Arq. Diego Franco
Representante

CONSTRUCTORA DOS HERMANOS

De: Diego Guillermo Franco Vargas

Construcción de edificios - Construcción de proyectos de servicios públicos
Actividades de servicios de mantenimiento a edificios e instalaciones
Fabricación de productos metálicos para uso estructural - Instalación de calefacción y aire acondicionado
Construcción de carreteras y vías férreas, puentes y túneles

Km. 9 Acaray A 400 Metros De La Ruta Internacional N°7
Tel.:(0986) 301 007 - Ciudad Del Este - Alto Paraná - Paraguay

FACTURA

Número de Timbrado: 16653929
Fecha Inicio Vigencia: 05/09/2023
Fecha Fin Vigencia: 30/09/2024

RUC: 4013685 - 0

001-002- 0000887

Fecha de Emisión: 05 / Octubre /2023 | CONDICIÓN DE VENTA: CONTADO ☐ CRÉDITO ☒

Nombre o Razón Social: Municipalidad de Minga Guazú R.UC. C/I.: 80010478-1

Dirección: Nota de Remisión Nº: Tel.:

Cant.	Descripción	Precio Unitario	VALOR DE VENTA EXENTAS	IVA 5%	IVA 10%
	Pago por segunda Certificación construcción de pavimento tipo Empedrado para el distrito de Minga Guazú - ID Nº 412276 - Lote Nº 2 construcción de Pavimento tipo Empedrado km 17,5 Monday Fracción Universitaria y Lote Nº 14 construcción de Pavimento tipo Empedrado km 16 Acaray - Costado del Cementerio Municipal.	356.604.115			356.604.115
SUB - TOTALES					356.604.115

TOTAL A PAGAR Gs ☒ U$ ☐ (En letras): trescientos cincuenta y seis millones seiscientos cuatro mil, ciento quince 356.604.115

LIQUIDACIÓN DEL IVA: (5%) (10%) 32.418.556 TOTAL IVA: 32.418.556

Gráfica Caracol DE FELICIANO LÓPEZ ROMERO - Av. Cruz del Chaco c/ Arturo Garcete (al Costado de la Terminal) Barrio Obrero
R.U.C.: 2620787- 7 - Nº HAB. 1457 - Tel.: (061) 509387 | 01 Tls. 50x3 - 876 al 925 | Septiembre / 2023

ORIGINAL: Cliente
DUPLICADO: Arch. Tribut.
TRIPLICADO: No valido c/ Comp. Fiscal

Ministerio de
INDUSTRIA
Y COMERCIO

GOBIERNO
NACIONAL

Paraguay
de la gente

CONSTANCIA DE REGISTRO DE PRESTADORES DE SERVICIOS - REPSE

Ruc : 40136850 DIEGO GUILLERMO FRANCO VARGAS

Teléfono/s : (0986)301007 **Website** :

Fax : **Email Corp.:** diegofrancosoy@hotmail.com

Dirección : CALLE, KM. 9 ACARAY A 400 METROS DE LA RUTA INTERNACIONAL N?7 //CASA - ALTO PARANA - CIUDAD DEL ESTE(PLANTA URBANA)

Estado : Activo

Se registró en REPSE bajo el N° 013191

Conforme al Decreto N° 6866/11 y Normativas Vigentes. Este registro tiene fecha de vencimiento el 11/07/2025

Otorgado en Asunción, el 11/07/2017

Renovado el 13/09/2023

Este certificado no implica la habilitación para la obtención de licencias, permisos o registros que puedan ser exigidos por otras reparticiones o instituciones gubernamentales.

Para mayor información ingresar, con la clave y usuario correspondientes, al Sistema Electrónico VUE - Página Web www.vue.org.py

40136850

13092023 1629 40136850 40136850

013191

Lote 5667659433 , Cons.: 1

DIRECCIÓN NACIONAL DE INGRESOS TRIBUTARIOS

GERENCIA GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS

NUMERO 4270163774078

FORM.427-1

FECHA 17/10/2023

CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO TRIBUTARIO

DATOS DEL SOLICITANTE

RUC	4013685	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL
DV	0	FRANCO VARGAS DIEGO GUILLERMO

A LA FECHA DE EXPEDICIÓN DEL PRESENTE DOCUMENTO EL CONTRIBUYENTE HA CUMPLIDO CON SUS OBLIGACIONES ANTE LA ADMINISTRACIÓN Y SE EMITE EL PRESENTE CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO TRIBUTARIO EN CARÁCTER NORMAL EN VIRTUD A LO ESTABLECIDO EN EL ART. Nº 194 DE LA LEY Nº 125/91 Y SU MODIFICACIÓN CON LA LEY Nº 2421/04 Y DEMÁS DISPOSICIONES VIGENTES.

VALIDO HASTA: 16/11/2023 NÚMERO DE CONTROL : 8F090853

DIRECCIÓN NACIONAL DE INGRESOS TRIBUTARIOS

427140136858F090853

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
DIRECCION DE APORTE OBRERO PATRONAL
CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO
CON EL SEGURO SOCIAL

Paraguay de la gente

USUARIO EMISION: 4013685

NRO. CERTIFICADO: 400706

FECHA EMISION: 14-09-2023

VENCIMIENTO: 14-10-2023

DATOS DEL EMPLEADOR

Nro. Ruc: 4013685

Nro. Certificado: 400706

Razon Social: FRANCO VARGAS DIEGO GUILLERMO

Actividad(es): CONSTRUCCION DE PROYECTOS DE SERVICIOS PUBLICOS
SERVICIO DOMESTICO

Fecha de Inscripcion: 11-04-2017

Cantidad de Asegurados: 1

Nro. Patronal(es): 0505-40-0547 -

CONSTE QUE EL(LOS) EMPLEADOR(ES), A LA FECHA DE EMISION DEL PRESENTE CERTIFICADO NO ADEUDA(N) EN CONCEPTO DE APORTE OBRERO PATRONAL

Se expide el presente Certificado sin perjuicio de las facultades de Fiscalizacion y Control otorgadas a la Direccion Aporte Obrero Patronal.
Nota: Cualquier correccion no salvada en el texto invalida el presente certificado. "El presente instrumento solo certifica estar al dia en el pago del aporte Obrero-Patronal del/los personal/es declarado/s, no eximiendo la responsabilidad patronal sobre los no declarados.".

La validez de este documento se puede confirmar, ingresando el número de ruc y certificado a traves de nuestro sitio:
http://servicios.ips.gov.py/constancia/

DNCP
DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Formulario de Informe de Servicios Personales - FIS

Proveedor Adjudicado

DIEGO GUILLERMO FRANCO VARGAS

RUC

4013685-0

Entidad Contratante

Municipalidad de Minga Guazú

Descripción del llamado / Contrato

ID: 422716 / LICITACION PUBLICA NACIONAL 01/23 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO PARA EL DISTRITO DE MINGA GUAZÚ

Monto del contrato

485.080.828

Año: 2023 **Periodo:** Setiembre

Empleados vinculados al contrato

Nro.	Nombres	Apellidos	Funciones Exclusivas	Remuneración	Relación	Estado
1	BERNARDA	GAONA DE SOSA	Cumplio	2550307	Contratista	Activo

Busqueda rápida

DNCP Marco Legal Planificación Procesos Módulos Información Servicios Cambiar contrasena Salir

Mas usados: Búsqueda de Llamados

Formulario de Identificación del Personal

Convocante - Código SICP 1143

Formulario de Identificació

En esta sección podrá administrar los Formulari

ID Llamado: 422716

Llamado: LICITACION PUB CONSTRUCCIÓN EMPEDRADO PA GUAZÚ

Nombre

BERNARDA

Tipo Documento:	Cédula de Identidad
Documento:	1051744
Apellidos:	GAONA DE SOSA
Nombres:	BERNARDA
Fecha Nacimiento:	12/03/1967
Género:	Femenino
País de Nacimiento:	Paraguay
Dirección:	Km 8 Acaray
Dedicación a ejecución del contrato:	Parcial
Relación de:	Dependencia Laboral
Relación con:	Contratista

DNCP

E.E.U.U. 961 c/ Tte. Fariña. Asunción, Paraguay - Tel. y Fax 415 - 4000 - dncp@contrataciones.gov.py
Horario de Atención: Lunes a Viernes de 07:00 a 15:00 horas
Preguntas Frecuentes | Mesa de Ayuda y Sugerencias

CONSTRUCTORA DOS HERMANOS
Arq. Diego Franco
Representante

CONSTRUCTORA DOS HERMANOS
Arq. Diego Franco
Representante

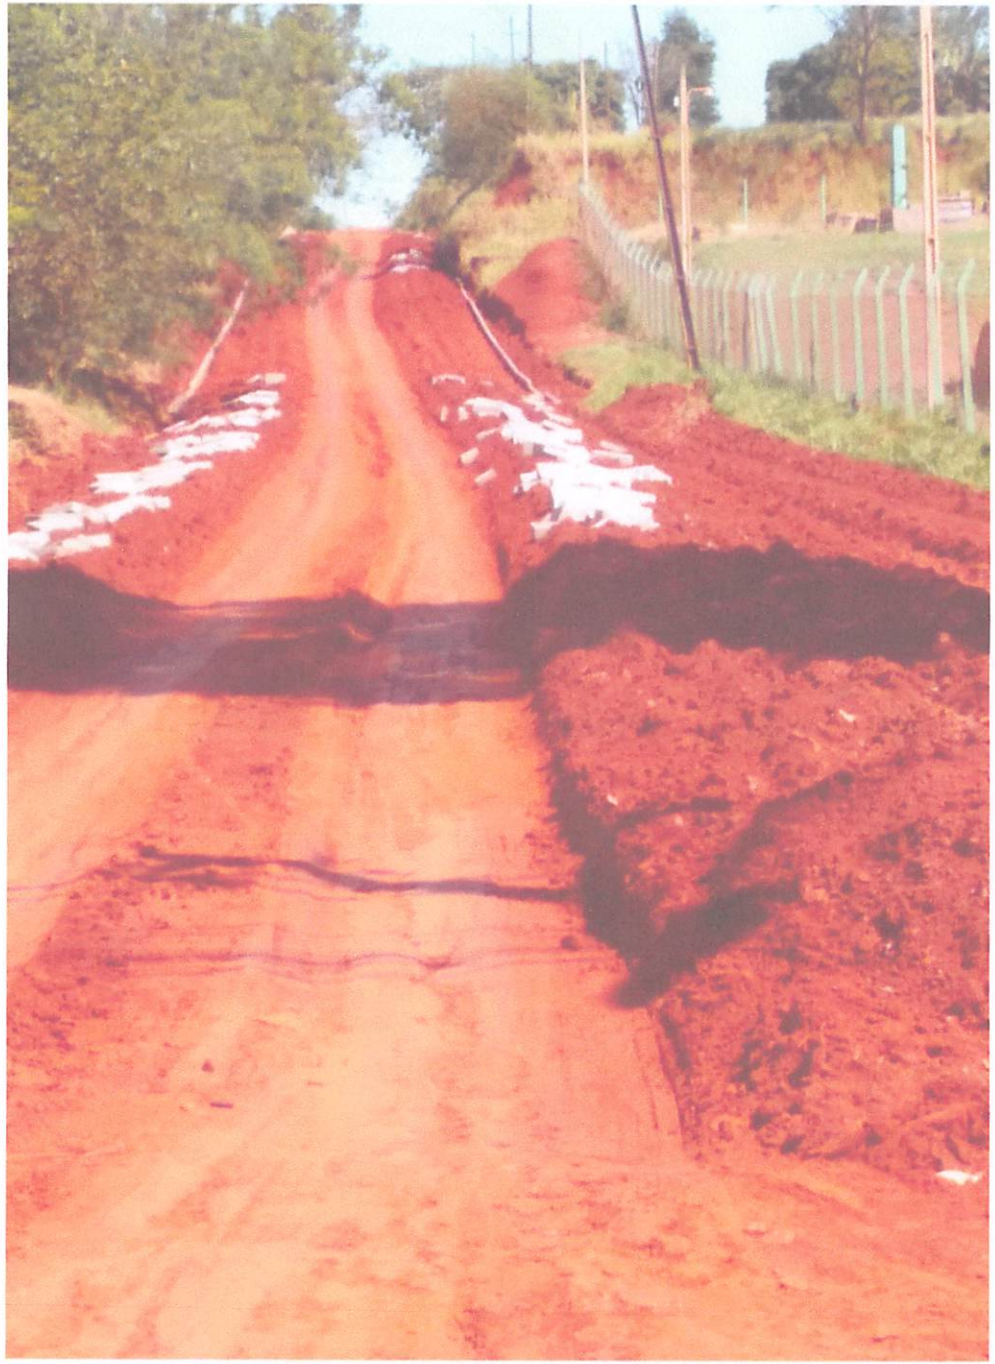

CONSTRUCTORA DOS HERMANOS
Arq. Diego Franco
Representante

CONSTRUCTORA DOS HERMANOS
Arq. Diego Franco
Representante

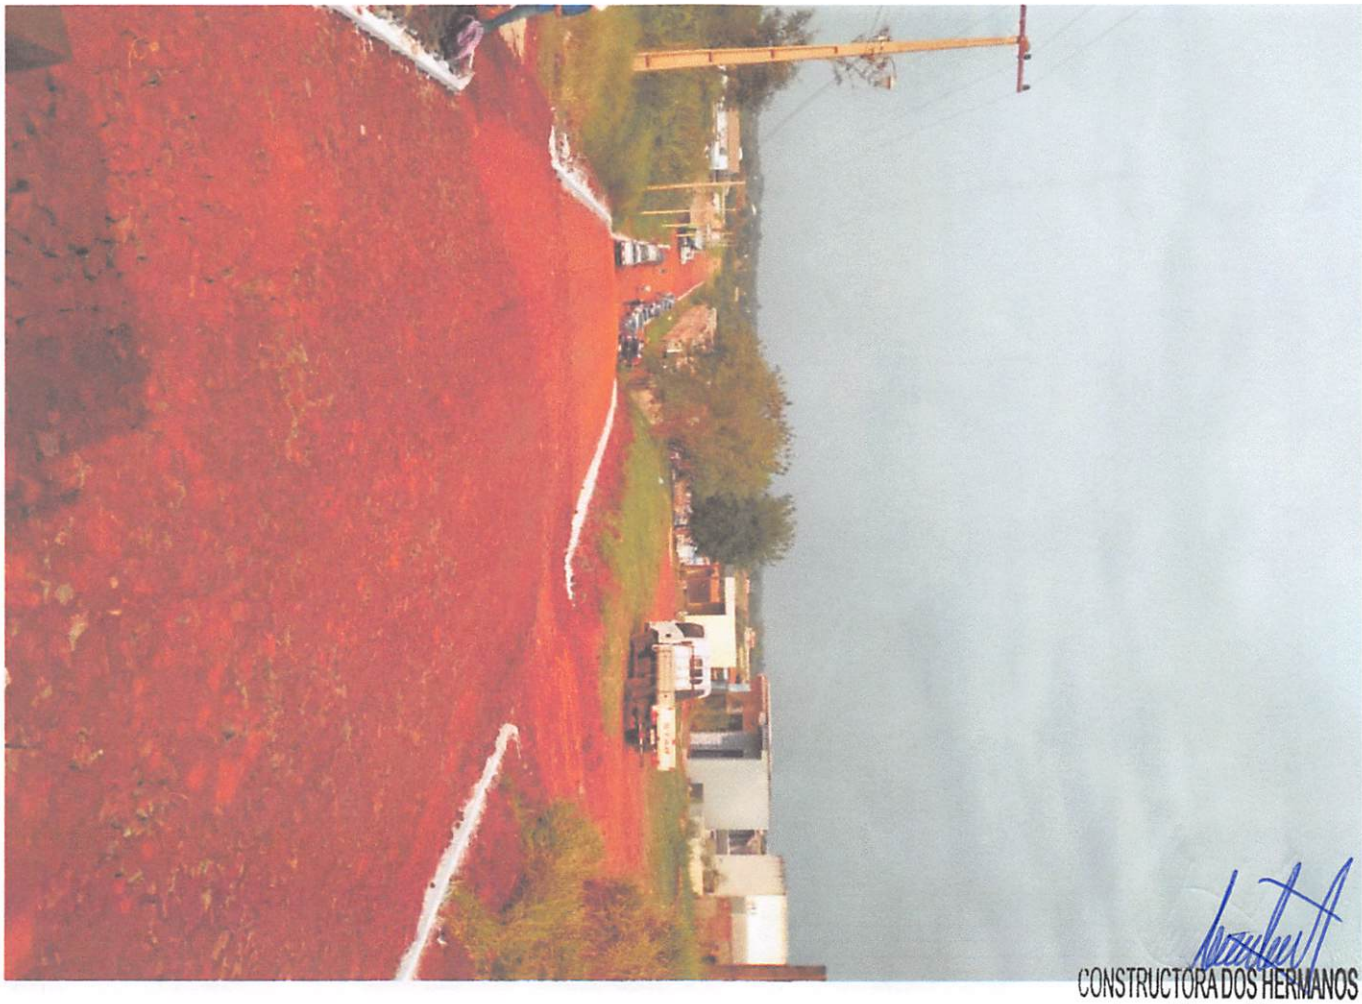

CONSTRUCTORA DOS HERMANOS
Arq. Diego Franco
Representante

CONSTRUCTORA DOS HERMANOS
Arq. Diego Franco
Representante

CONSTRUCTORA DOS HERMANOS
Arq. Diego Franco
Representante

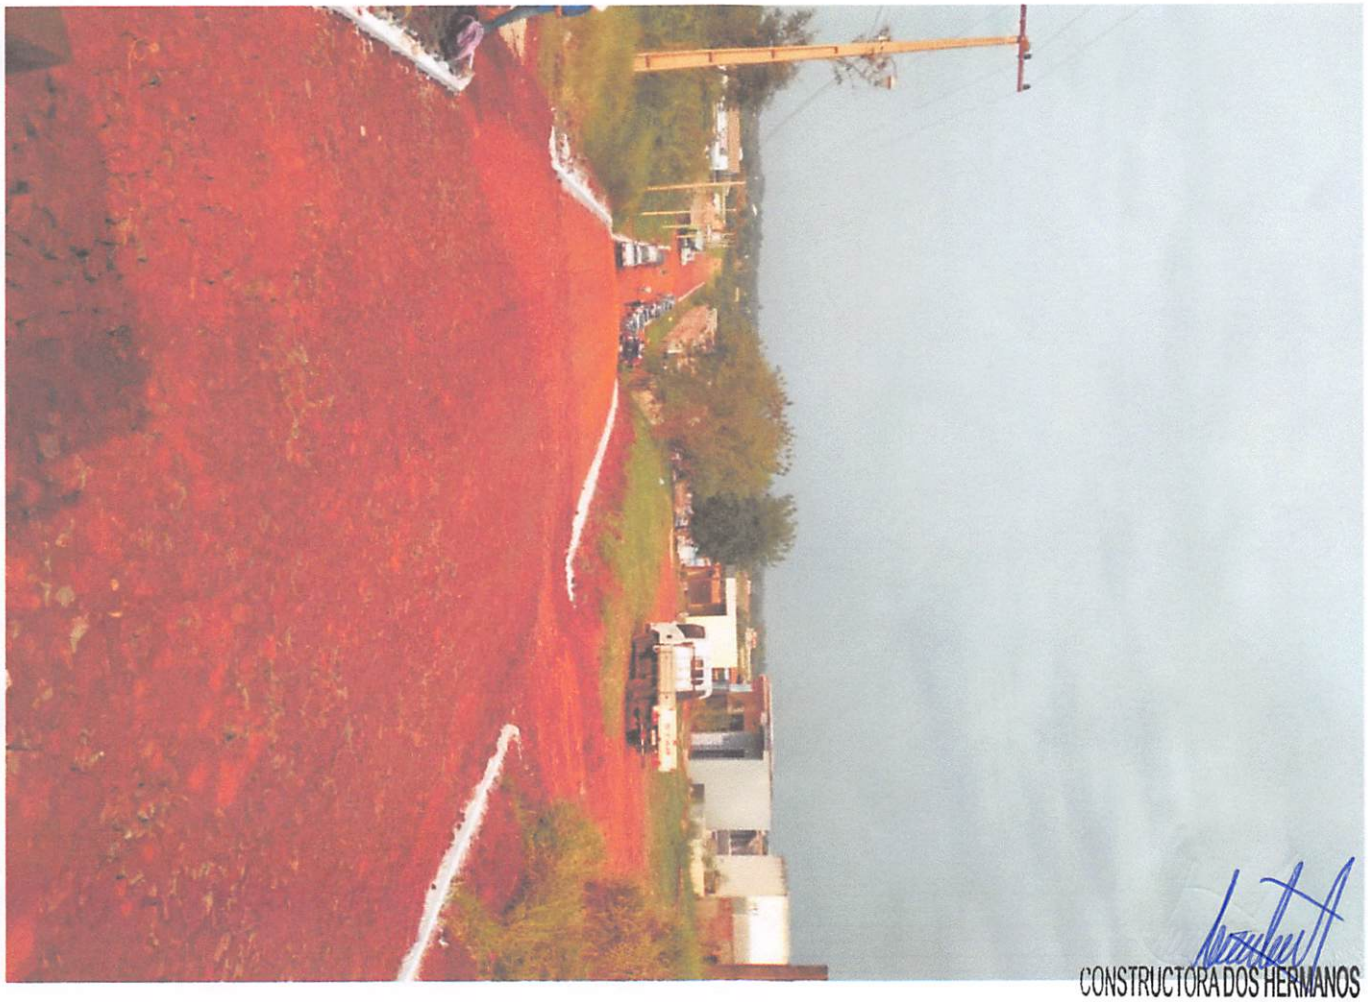

CONSTRUCTORA DOS HERMANOS
Arq. Diego Franco
Representante

CONSTRUCTORA DOS HERMANOS
Arq. Diego Franco
Representante

LIBRO DE OBRA

Hoja N°: 10

CONTRATO DE OBRAS N°:	CONTRATO N° 32/2023 - ID N° 422.716
OBRA:	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO - LOTE N° 02
CONTRATANTE:	MUNICIPALIDAD DE MINGA GUAZÚ
CONTRATISTA:	CONSTRUCTURA DOS HERMANOS
UBICACIÓN:	KM 17,5 MONDAY / FRACCIÓN UNIVERSITARIA

OBSERVACIONES

ESTADO DEL TIEMPO:

FECHA: 16/08/2023

TRABAJOS REALIZADOS:

A los efectos de realizar un control de la obra se establece la necesidad de contar con un libro de obra que quedara en custodia y responsabilidad del contratista cuyas páginas serán enumeradas y cada una de ellas firmadas por el Fiscal designado por la Municipalidad.
En dicho libro de obra se dejara constancia del control de todos los trabajos desde preparación de la obra hasta la recepción definitiva.
Por lo tanto en el día de la fecha nos constatamos en el lugar de la obra correspondiente al contrato N° 32/2023, adjudicado a la empresa Constructora dos Hermanos
Así habiendo realizado la apertura del libro de obra, se ha iniciado los trabajos de preparación de la obra.

Municipalidad de Minga Guazú
Dirección Obras y Servicios
Periodo 2021-2026

Fiscal de Obras

Contratista
CONSTRUCTORA DOS HERMANOS
Arq. Diego Franco
Representante

LIBRO DE OBRA

Hoja N°: 2

CONTRATO DE OBRAS Nº:	CONTRATO N° 32/2023 - ID N° 422.716
OBRA:	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO - LOTE N° 02
CONTRATANTE:	MUNICIPALIDAD DE MINGA GUAZÚ
CONTRATISTA:	CONSTRUCTURA DOS HERMANOS
UBICACIÓN:	KM 17,5 MONDAY / FRACCIÓN UNIVERSITARIA

OBSERVACIONES

ESTADO DEL TIEMPO:

FECHA: 16/08/2023

TRABAJOS REALIZADOS:

- Colocación de cartel de obra 2 x 1,80 m
- Replanteo: Levantamiento plani-altimetrico y marcación
- Preparación de suelo con motoniveladora

* Fecha: 17/08/2023
- Trabajos de replanteo y marcación
- Preparación de suelo con motoniveladora

* Fecha: 18/08/2023
- Trabajos de preparación para colocación de cordón de H°
- Trabajos de preparación para cordón cuneta de H°
- Fiscal verifica los trabajos realizados y captura varias Fotografias

Municipalidad de Minga Guazú
Dirección Obras y Servicios
Periodo 2021-2026

.....
Fiscal de Obras

.....
Contratista
CONSTRUCTORA DOS HERMANOS
Arq. Diego Franco
Representante

LIBRO DE OBRA

Hoja N°: 3

CONTRATO DE OBRAS Nº:	CONTRATO N° 32/2023 - ID N° 422.716
OBRA:	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO - LOTE N° 02
CONTRATANTE:	MUNICIPALIDAD DE MINGA GUAZÚ
CONTRATISTA:	CONSTRUCTURA DOS HERMANOS
UBICACIÓN:	KM 17,5 MONDAY / FRACCIÓN UNIVERSITARIA

OBSERVACIONES

ESTADO DEL TIEMPO:

FECHA: 21/08/2023

TRABAJOS REALIZADOS:

- Preparación de tierra colorada para colocación de cordón de H°, preparación de tierra colorada para colchón, colocación de cordón de H° y cargamento de cordón cuneta de H°.

* Fecha: 22/08/2023
- Trabajos de colocación de cordón de H° y cargamento de H° para cordón cuneta.

* Fecha: 23/08/2023
- Preparación de tierra colorada para colocación de cordón de H°, preparación de tierra colorada para colchón, colocación de cordón de H° y cargamento de H° para cordón cuneta.

* Fecha: 24/08/2023
- Preparación de tierra colorada para colocación de cordón de H°, preparación de tierra colorada para colchón, colocación de cordón de H° y cargamento de H° para cordón cuneta.

* Fecha: 25/08/2023
- Preparación de tierra colorada para colocación de cordón de H°, preparación de tierra colorada para colchón, colocación de cordón de H° y colocación de piedra a mano y martillo.
- Fiscal de Obra verifica los trabajos realizados y captura varias fotografías.

Municipalidad de Minga Guazú
Dirección Obras y Servicios
Periodo 2021-2025

.....
Fiscal de Obras

.....
Contratista
CONSTRUCTORA DOS HERMANOS
Arq. Diego Franco
Representante

LIBRO DE OBRA

Hoja N°: 4

CONTRATO DE OBRAS N°:	CONTRATO N° 32/2023 - ID N° 422.716
OBRA:	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO - LOTE N° 02
CONTRATANTE:	MUNICIPALIDAD DE MINGA GUAZÚ
CONTRATISTA:	CONSTRUCTURA DOS HERMANOS
UBICACIÓN:	KM 17,5 MONDAY / FRACCIÓN UNIVERSITARIA

OBSERVACIONES

ESTADO DEL TIEMPO:

FECHA: 28/08/2023

TRABAJOS REALIZADOS:

- Preparación de tierra colorada para colocación de cordón de H°, preparación de tierra colorada para colchón, colocación de cordón de H° y colocación de piedra a mano y martillo.

* Fecha: 29/08/2023
- Preparación de tierra colorada para colocación de cordón de H°, preparación de tierra colorada para colchón, colocación de cordón de H° y colocación de piedra a mano y martillo.

* Fecha: 30/08/2023
- Preparación de tierra colorada para colchón, colocación de cordón de H° y colocación de piedra a mano y martillo.

* Fecha: 31/08/2023
- Preparación de tierra colorada para colchón, colocación de cordón de H° y colocación de piedra a mano y martillo.

* Fecha: 01/09/2023
- Preparación de tierra colorada para colchón, colocación de cordón de H° y colocación de piedra a mano y martillo.
- Esparcido de tierra colorada sobre empedrado
- Fiscal de obra verificó los trabajos realizados y captura varias fotografías.

Municipalidad de Minga Guazú
Dirección Obras y Servicios
Periodo 2021-2025

.....
Fiscal de Obras

.....
Contratista
CONSTRUCTORA DOS HERMANOS
Arq. Diego Franco
Representante

LIBRO DE OBRA

Hoja N°: 5

CONTRATO DE OBRAS N°:	CONTRATO N° 32/2023 - ID N° 422.716
OBRA:	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO - LOTE N° 02
CONTRATANTE:	MUNICIPALIDAD DE MINGA GUAZÚ
CONTRATISTA:	CONSTRUCTURA DOS HERMANOS
UBICACIÓN:	KM 17,5 MONDAY / FRACCIÓN UNIVERSITARIA

OBSERVACIONES

ESTADO DEL TIEMPO:

FECHA: 04/09/2023

TRABAJOS REALIZADOS:

- Preparación de tierra colorada para colchón, colocación de cordón de H° y colocación de piedra a mano y martillo.

* Fecha: 05/09/2023
- Preparación de tierra colorada para colocación de cordón de H°, preparación de tierra colorada para colchón, colocación de cordón de H° y colocación de piedra a mano y martillo.

* Fecha: 06/09/2023
- Preparación de tierra colorada para colocación de cordón de H°, preparación de tierra colorada para colchón, colocación de cordón de H° y colocación de piedra a mano y martillo.

* Fecha: 07/09/2023
- Preparación de tierra colorada para colchón, colocación de cordón de H° y colocación de piedra a mano y martillo.

* Fecha: 08/09/2023
- Preparación de tierra colorada para colchón, colocación de cordón de H° y colocación de piedra a mano y martillo.
- Esparcido de tierra colorada sobre empedrado
- Fiscal de obra verifica los trabajos realizados y captura varias fotografías

Municipalidad de Minga Guazú
Dirección Obras y Servicios
Periodo 2021-2025

.....
Fiscal de Obras

.....
Contratista
CONSTRUCTORA DOS HERMANOS
Arq. Diego Franco
Representante

LIBRO DE OBRA

Hoja N°: 6

CONTRATO DE OBRAS N°:	CONTRATO N° 32/2023 - ID N° 422.716
OBRA:	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO - LOTE N° 02
CONTRATANTE:	MUNICIPALIDAD DE MINGA GUAZÚ
CONTRATISTA:	CONSTRUCTURA DOS HERMANOS
UBICACIÓN:	KM 17,5 MONDAY / FRACCIÓN UNIVERSITARIA

OBSERVACIONES

ESTADO DEL TIEMPO:

FECHA: 11/09/2023

TRABAJOS REALIZADOS:

- Preparación de tierra colorada para colocación de cordón de H°, preparación de tierra colorada para colchón, colocación de cordón de H° y colocación de piedra a mano y martillo.

* Fecha: 12/09/2023
- Preparación de tierra colorada para colocación de cordón de H°, preparación de tierra colorada para colchón, colocación de cordón de H° y colocación de piedra a mano y martillo.

* Fecha: 13/09/2023
- Preparación de tierra colorada para colchón, colocación de cordón de H° y colocación de piedra a mano y martillo.

* Fecha: 14/09/2023
- Preparación de tierra colorada para colchón, colocación de cordón de H° y colocación de piedra a mano y martillo.

* Fecha: 15/09/2023
- Preparación de tierra colorada para colchón, colocación de cordón de H° y colocación de piedra a mano y martillo.
- Esparcido de tierra colorada sobre empedrado.
- Fiscal de Obra verifica los trabajos realizados y captura varias fotografías

Municipalidad de Minga Guazú
Dirección Obras y Servicios
Periodo 2021-2025

.....
Fiscal de Obras

.....
Contratista
CONSTRUCTORA DOS HERMANOS
Arq. Diego Franco
Representante

LIBRO DE OBRA

Hoja N°: 7

CONTRATO DE OBRAS Nº:	CONTRATO N° 32/2023 - ID N° 422.716
OBRA:	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO - LOTE N° 02
CONTRATANTE:	MUNICIPALIDAD DE MINGA GUAZÚ
CONTRATISTA:	CONSTRUCTURA DOS HERMANOS
UBICACIÓN:	KM 17,5 MONDAY / FRACCIÓN UNIVERSITARIA

OBSERVACIONES

ESTADO DEL TIEMPO:

FECHA: 18/09/2023

TRABAJOS REALIZADOS:

- Preparación de tierra colorada para colocación de cordón de H°, preparación de tierra colorada para colchón, colocación de cordón de H° y colocación de piedra a mano y martillo.

* Fecha: 19/09/2023
- Preparación de tierra colorada para colocación de cordón de H°, preparación de tierra colorada para colchón, colocación de cordón de H° y colocación de piedra a mano y martillo.

* Fecha: 20/09/2023
- Preparación de tierra colorada para colchón, colocación de cordón de H° y colocación de piedra a mano y martillo.

* Fecha: 21/09/2023
- Preparación de tierra colorada para colchón, colocación de cordón de H° y colocación de piedra a mano y martillo

* Fecha: 22/09/2023
- Preparación de tierra colorada para colchón, colocación de cordón de H° y colocación de piedra a mano y martillo.
- Esparcido de tierra colorada sobre empedrado
- Fiscal de obra verifica los trabajos y captura varias fotografías

Municipalidad de Minga Guazú
Dirección Obras y Servicios
Periodo 2021-2025

Fiscal de Obras

Contratista

CONSTRUCTORA DOS HERMANOS
Arq. Diego Franco
Representante

LIBRO DE OBRA

Hoja N°: 8

CONTRATO DE OBRAS Nº:	CONTRATO N° 32/2023 - ID N° 422.716
OBRA:	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO - LOTE N° 02
CONTRATANTE:	MUNICIPALIDAD DE MINGA GUAZÚ
CONTRATISTA:	CONSTRUCTURA DOS HERMANOS
UBICACIÓN:	KM 17,5 MONDAY / FRACCIÓN UNIVERSITARIA

OBSERVACIONES

ESTADO DEL TIEMPO:

FECHA: 25/09/2023

TRABAJOS REALIZADOS:

- Preparación de tierra colorada para colocación de cordón de H°, preparación de tierra colorada para colchón, colocación de cordón de H° y colocación de piedra a mano y martillo.

* Fecha: 26/09/2023
- Preparación de tierra colorada para colchón, colocación de cordón de H° y colocación de piedra a mano y martillo.

* Fecha: 27/09/2023
- Preparación de tierra colorada para colchón, colocación de cordón de H° y colocación de piedra a mano y martillo.

* Fecha: 28/09/2023
- Preparación de tierra colorada para colchón, colocación de cordón de H° y colocación de piedra a mano y martillo.
- Esparcido de tierra colorada sobre empedrado

* Fecha: 02/10/2023
- Se realiza trabajos de compactación preliminar y Final
- Trabajos de enripiado con triturada VI 0,02 tn/m²
- Trabajos de limpieza Final
- Trabajos de medición.
- Fiscal de obra verifica la conclusión de los trabajos y captura varias fotografias.

Municipalidad de Minga Guazú
Dirección Obras y Servicios
Periodo 2021-2025

.....
Fiscal de Obras

.....
Contratista
CONSTRUCTORA DOS HERMANOS
Arq. Diego Franco
Representante
