GOBERNACION DEL DEPARTAMENTO DE ITAPUA

RESUMEN DEL CERTIFICADO BASICO Nº: 2-

MES: MARZO, ABRIL, MAYO, JUNIO Y JULIO 2020

OBRA: Construcción de Polideportivo en el Distrito de Fram - Primera Etapa - Plurianual con ID: 372.082

Posición	Conceptos	Importes Autorizados		IMPORTES CERTIFICADOS					
				Certificado Anterior		Presente Certificado		Total a la Fecha	
		%	(1) Monto Gs.	%	(2) Monto Gs.	%	(3) Monto Gs.	%	(2) + (3) Monto Gs.
A	Certificaciones por Obra Ejecutada								
A1	**Construcción de Polideportivo en el Distrito de Fram - Primera Etapa - Plurianual**	100	1.524.475.960	1,66%	25.261.076	4,48%	68.232.000	6,13%	93.493.076
	Total	100	1.524.475.960	**1,66%**	**25.261.076**	**4,48%**	**68.232.000**	**6,13%**	**93.493.076**

Certificado Basico N° 2

MES: MARZO, ABRIL, MAYO, JUNIO Y JULIO 2020

Contrato N°: 69/2019

Monto Básico: 1.524.475.960

Contratista: Constructora Victoria S.R.L

Fecha de Inicio: 23/1/2020

Plazo de Ejecución:(Días) 300

Fecha de Terminación: 23/10/2020

B	Deducciones Totales por Contrato			Certificado Anterior	Presente Certificado	Total a la Fecha
B1	Devolucion de Anticipo	20%	304.895.192	5.052.215	13.646.400	18.698.615
	Total deducciones		304.895.192	5.052.215	**13.646.400**	**18.698.615**

Gobernación de Itapua

Secretaría de Obras Públicas y Transporte

Mesa de Entrada

C1	Importe liquido a pagar según presente certificado (A - B)	54.585.600
C2	Multas	0
C	**Importe Neto a pagar según presente certificado (C1 - C2)**	**54.585.600**

Son Guaraníes: Cincuenta y cuatro millones quinientos ochenta y cinco mil seiscientos.

GOBERNACION DE ITAPUA
Secretario Departamental

GOBERNACION DEPARTAMENTAL ITAPUA Fiscalización de Obras

Ing. Carlos Javier Amarilla
Fiscal de Obras
Gobernación de Itapúa

GOBERNACIÓN DE ITAPUA
Fiscalización
Secretaría de Obras Públicas y Transporte

CONSTRUCTORA VICTORIA S.R.L
Contratista
Representante Legal

CONSTRUCTORA VICTORIA S.R.L. Ruc: 80045040-0

2

GOBERNACION DEL DEPARTAMENTO DE ITAPUA										CERTIF. BASICO N°	2
										PLANILLA I	
Monto Básico: 1.524.475.960										Plazo de Ejecución: (Días)	300
PLANILLA DE MEDICION PORCENTUAL										Mes: MARZO, ABRIL, MAYO, JUNIO Y JULIO	
Contrato N° 69/2019					Contratista: CONSTRUCTORA VICTORIA S.R.L						
OBRA: Construcción de Polideportivo en el Distrito de Fram - Primera Etapa - Plurianual											
N°	RUBRO	UNIDAD	CANTIDAD	INCIDENCIA	OBRA EJECUTADA EN PORCENTAJE (%)			OBRA EJECUTADA EN INCIDENCIA			
					ANTERIOR	PRESENTE	ACTUAL	ANTERIOR	PRESENTE	ACTUAL	
1	**Preparacion de obra - trabajos Preliminares**										
1.1	Replanteo y limpieza de la obra	m2	2.590,00	0,0066	100,00%	0,00%	100,00%	0	-	0,0066	
1.2	Cartel	gl.	1,00	0,0008	100,00%	0,00%	100,00%	0	-	0,0008	
1.3	Obrador de obra	gl.	1,00	0,0084	100,00%	0,00%	100,00%	0	-	0,0084	
2	**Preparacion de obra - Movimiento de suelos**										
2.1	Excavación para zapata y encadenados	m3	274,80	0,0074	10,00%	90,00%	100,00%	0	0,0067	0,0074	
2.2	Relleno y Compactación	m3	1.280,00	0,0411	0,00%	10,00%	10,00%	-	0,0041	0,0041	
3	**Colocacion de hormigon armado - Estructura de Hormigon armado**				0,00%						
3.1	Zapatas	m3	165,00	0,1732	0,00%	22,03%	22,03%	-	0,0382	0,0382	
3.2	Encadenado inferior 20 x 50	m3	43,28	0,0454	0,00%	0,00%	0,00%	-	-	-	
3.3	Viga superior 15x60	m3	46,25	0,0485	0,00%	0,00%	0,00%	-	-	-	
3.4	Encadenado superior 20x60	m3	19,75	0,0207	0,00%	0,00%	0,00%	-	-	-	
3.5	Columnas de Hormigon armado de 0.30x0.70	m3	47,50	0,0499	0,00%	5,00%	5,00%	-	0,0025	0,0025	
4	**Aislacion horizontal pared 0.15m**	ml	425,00	0,0081	0,00%	0,00%	0,00%	-	-	-	
5	**Mamposteria de nivelación de ladrillo común de 0.30 m en todo el borde perimetral, muro de contención, nivelación de paredes exteriores**	m2	36,00	0,0030	0,00%	0,00%	0,00%	-	-	-	
6	**Construccion/Colocacion de techo/tinglado**										
6.1	Techo de chapa trapezoidal sobre estructura de perfiles metalicos	m2	2.530,00	0,3913	0,00%	0,00%	0,00%	-	-	-	
6.2	Extractores eolicos de 24" de diametro	un.	12,00	0,0035	0,00%	0,00%	0,00%	-	-	-	
7	**Colocacion de pisos - contrapisos**										
7.1	Piso de hormigon e: 12 cm con tratamiento de pavicrom, terminación helicoptero	m2	1.196,00	0,0960	0,00%	0,00%	0,00%	-	-	-	
7.2	Contrapiso de cascote e: 10cm	m2	2.046,00	0,0417	0,00%	0,00%	0,00%	-	-	-	
7.3	Carpeta Cementicia, e:2cm	m2	850,00	0,0162	0,00%	0,00%	0,00%	-	-	-	

GOBERNACION DEPARTAMENTAL DE ITAPUA
Fiscalización de Obras

Ing. Carlos Javier Amarilla
Fiscal de Obras
Gobernación de Itapúa

CONSTRUCTORA VICTORIA S.R.L.
Ruc: 80045040-0

8	**Servicio de pintura**									
8.1	De vigas, pilares y muchetas exteriores con pintura sintetica	m2	680	0,0113	0,00%	0,00%	0,00%	-	-	-
8.2	Pintura para piso sector cancha	m2	1.222,00	0,0249	0,00%	0,00%	0,00%	-	-	-
9	**Limpieza de obra**	gl.	1,00	0,0019	0,00%	0,00%	0,00%	-	-	-
	TOTAL GENERAL			1,0000				0,0166	0,0514	0,0680

CONSTRUCTORA VICTORIA S.R.L
Contratista
Representante Legal

CONSTRUCTORA VICTORIA S.R.L.
Ruc: 80045040-0

GOBERNACIÓN DE ITAPÚA
Fiscalización de Obras

GOBERNACIÓN DE ITAPÚA
Fiscalización
Secretaría de Obras Públicas y Transporte

Ing. Carlos Javier Amarilla
Fiscal de Obras
Gobernación de Itapúa

GOBERNACION DEL DEPARTAMENTO DE ITAPUA	CERTIF. BASICO Nº	2
	PLANILLA I	
Monto Básico: 1.524.475.960	Plazo de Ejecución: (Días)	300
PLANILLA DE CERTIFICADO	Mes: MARZO, ABRIL, MAYO Y JUNIO	
Contrato Nº 69/2019	Contratista: CONSTRUCTORA VICTORIA S.R.L	

OBRA: Construcción de Polideportivo en el Distrito de Fram - Primera Etapa - Plurianual

Nº	RUBRO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO DE OFERTA		OBRA EJECUTADA EN CANTIDADES			OBRA EJECUTADA EN MONTO		
				F.	P. TOTAL	ANTERIOR	PRESENTE	ACTUAL	ANTERIOR	PRESENTE	ACTUAL
1	**Preparacion de obra - trabajos Preliminares**										
1.1	Replanteo y limpieza de la obra	m2	2.590,00	3.900	10.101.000	2590,00	0,00	2590,00	10.101.000	-	10.101.000
1.2	Cartel	gl.	1,00	1.274.900	1.274.900	1,00	0,00	1,00	1.274.900	-	1.274.900
1.3	Obrador de obra	gl.	1,00	12.753.000	12.753.000	1,00	0,00	1,00	12.753.000	-	12.753.000
2	**Preparacion de obra - Movimiento de suelos**										
2.1	Excavación para zapata y encadenados	m3	274,80	41.200	11.321.760	27,48	0,00	27,48	1.132.176	-	1.132.176
2.2	Relleno y Compactación	m3	1.280,00	49.000	62.720.000	0,00	128,00	128,00	-	6.272.000	6.272.000
3	**Colocacion de hormigon armado - Estructura de Hormigon armado**										
3.1	Zapatas	m3	165,00	1.600.000	264.000.000	0,00	36,35	36,35	-	58.160.000	58.160.000
3.2	Encadenado inferior 20 x 50	m3	43,28	1.600.000	69.248.000	0,00	0,00	0,00	-	-	0
3.3	Viga superior 15x60	m3	46,25	1.600.000	74.000.000	0,00	0,00	0,00	-	-	0
3.4	Encadenado superior 20x60	m3	19,75	1.600.000	31.600.000	0,00	0,00	0,00	-	-	0
3.5	Columnas de Hormigon armado de 0.30x0.70	m3	47,50	1.600.000	76.000.000	0,00	2,38	2,38	-	3.800.000	3.800.000
4	**Aislacion horizontal pared 0.15m**	ml	425,00	29.100	12.367.500	0,00	0,00	0,00	-	-	0
5	**Mamposteria de nivelación de ladrillo común de 0.30 m en todo el borde perimetral, muro de contención, nivelación de paredes exteriores**	m2	36,00	126.150	4.541.400	0,00	0,00	0,00	-	-	0
6	**Construccion/Colocacion de techo/tinglado**										
6.1	Techo de chapa trapezoidal sobre estructura de perfiles metalicos	m2	2.530,00	235.800	596.574.000	0,00	0,00	0,00	-	-	0
6.2	Extractores eolicos de 24" de diametro	un.	12,00	446.300	5.355.600	0,00	0,00	0,00	-	-	0
7	**Colocacion de pisos - contrapisos**										
7.1	Piso de hormigon e: 12 cm con tratamiento de pavicrom, terminación helicoptero	m2	1.196,00	122.350	146.330.600	0,00	0,00	0,00	-	-	0
7.2	Contrapiso de cascote e: 10cm	m2	2.046,00	31.050	63.528.300	0,00	0,00	0,00	-	-	0
7.3	Carpeta Cementicia, e:2cm	m2	850,00	29.100	24.735.000	0,00	0,00	0,00	-	-	0

CONSTRUCTORA VICTORIA S.R.L.
Ruc: 80045040-0

GOBERNACION DEPARTAMENTAL DE ITAPUA
Fiscalizacion de Obras

Ing. Carlos Javier Amarilla
Fiscal de Obras
Gobernación de Itapúa

8	**Servicio de pintura**										
8.1	De vigas, pilares y muchetas exteriores con pintura sintetica	m2	680	25.250	17.170.000	0,00	0,00	0,00	-	-	0
8.2	Pintura para piso sector cancha	m2	1.222,00	31.050	37.943.100	0,00	0,00	0,00	-	-	0
9	**Limpieza de obra**	gl.	1,00	2.911.800	2.911.800	0,00	0,00	0,00	-	-	0
	TOTAL GENERAL				**1.524.475.960**				**25.261.076**	**68.232.000**	**93.493.076**

CONSTRUCTORA VICTORIA S.R.L.
Ruc: 80045040-0

CONSTRUCTORA VICTORIA S.R.L
Contratista
Representante Legal

GOBERNACIÓN DEPARTAMENTAL DE ITAPÚA
Fiscalización de Obras

Ing. Carlos Javier Amarilla
Fiscal de Obras
Gobernación de Itapúa

GOBERNACIÓN DE ITAPÚA
Fiscalización
Secretaría de Obras Públicas y Transporte

Contrato N°: 69/19

Certificado Basico N°2

OBRA: Construcción de Polideportivo en el Distrito de Fram - Primera Etapa - Plurianual con ID: 372.082

Monto del Contrato:	**1.524.475.960 Gs.**	**Term. Prevista:**	**23/10/2020**
Plazo Contractual:	**300 Días Calendario**	**Ampliaciones:**	
Inicio de Obra:	**23/1/2020**	**Mes:MARZO, ABRIL, MAYO, JUNIO y JULIO**	

CUADRO DE AVANCE

Contrato N°: 69/19

MES	PREVISTO Gs		EJECUTADO Gs		PREVISTO %		EJECUTADO %	
	Mensual	Acumulado	Mensual	Acumulado	Mensual	Acumulado	Mensual	Acumulado
INICIO								
Febrero	6.269.283	6.269.283	25.261.076	25.261.076	0,41%	0,41%	1,66%	1,66%
Marzo	22.026.653	28.295.937	12.793.500	38.054.576	1,44%	1,86%	0,84%	2,50%
Abril	90.238.892	118.534.829	4.264.500	42.319.076	5,92%	7,78%	0,28%	2,78%
Mayo	168.366.395	286.901.224	7.928.558	50.247.634	11,04%	18,82%	0,52%	3,30%
Junio	185.656.262	472.557.486	28.145.700	78.393.334	12,18%	31,00%	1,85%	5,14%
Julio	282.635.326	755.192.812	15.099.742	93.493.076	18,54%	49,54%	0,99%	6,13%
Agosto	297.691.319	1.052.884.131	0	93.493.076	19,53%	69,07%	0,00%	6,13%
Septiembre	368.952.898	1.421.837.029	0	93.493.076	24,20%	93,27%	0,00%	6,13%
Octubre	75.977.561	1.497.814.590	0	93.493.076	4,98%	98,25%	0,00%	6,13%
Noviembre	26.661.370	1.524.475.960	0	93.493.076	1,75%	100,00%	0,00%	6,13%

CURVA DE AVANCE

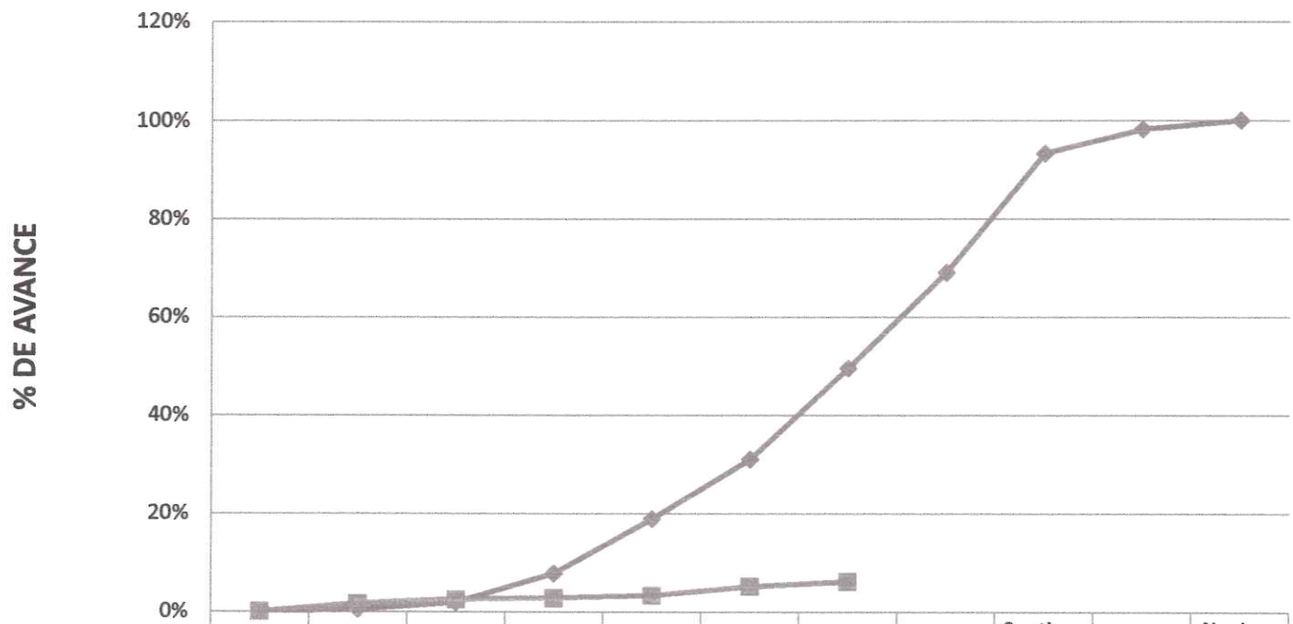

	INICIO	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre
PROYECTADO	0,00%	0,41%	1,86%	7,78%	18,82%	31,00%	49,54%	69,07%	93,27%	98,25%	100,00%
EJECUTADO	0,00%	1,66%	2,50%	2,78%	3,30%	5,14%	6,13%				

CONSTRUCTORA VICTORIA S.R.L.
Ruc: 80045040-0

Contratista
Ing. José Maria Caballero
Representante Legal

Ing. Carlos Javier Amarilla
Fiscal de Obras
Gobernación de Itapúa

Gobernacion de Itapua
Fiscalización
Secretaría de Obras Públicas y Transporte

Ítems del llamado Construcción de Polideportivo en el Distrito de Fram - Primera Etapa - Plurianual con ID: 372082

CRONOGRAMA FISICO FINANCIERO

CRONOGRAMA FINANCIERO

Items	Descripción del Bien	MES 1	MES 2	MES 3	MES 4	MES 5	MES 6	MES 7	MES 8	MES 9	MES 10
1	Preparacion de obra - trabajos Preliminares	₲ -	₲ -	₲ -	₲ -	₲ -	₲ -	₲ -	₲ -	₲ -	₲ -
1.1	Replanteo y limpieza de la obra	₲ 4.994.383	₲ 5.106.617	₲ -	₲ -	₲ -	₲ -	₲ -	₲ -	₲ -	₲ -
1.2	Cartel	₲ 1.274.900	₲ -	₲ -	₲ -	₲ -	₲ -	₲ -	₲ -	₲ -	₲ -
1.3	Obrador de obra		₲ 12.753.000	₲ -	₲ -	₲ -	₲ -	₲ -	₲ -	₲ -	₲ -
2	Preparacion de obra - Movimiento de suelos		₲ -	₲ -	₲ -	₲ -	₲ -	₲ -	₲ -	₲ -	₲ -
2.1	Excavacion para zapatas y encadenados		₲ 4.167.037	₲ 5.881.025	₲ 1.273.698	₲ -	₲ -	₲ -	₲ -	₲ -	₲ -
2.2	Relleno y Compactación					₲ 7.123.753	₲ 29.037.037	₲ 26.559.210	₲ -	₲ -	₲ -
3	Colocacion de hormigon armado - Estructura de Hormigon armado			₲ -	₲ -	₲ -	₲ -	₲ -	₲ -	₲ -	₲ -
3.1	Zapatas			₲ 68.200.000	₲ 95.822.222	₲ 78.466.667	₲ 21.511.111	₲ -	₲ -	₲ -	₲ -
3.2	Encadenado inferior 20 x 50			₲ 16.157.867	₲ 33.512.612	₲ 19.577.521	₲ -	₲ -	₲ -	₲ -	₲ -
3.3	Viga superior 15x60				₲ 11.967.901	₲ 29.325.926	₲ 32.706.173	₲ -	₲ -	₲ -	₲ -
3.4	Encadenado superior 20x60				₲ 5.110.617	₲ 12.522.963	₲ 13.966.420	₲ -	₲ -	₲ -	₲ -
3.5	Columnas de Hormigon armado de 0.30x0.70				₲ 12.291.358	₲ 30.118.519	₲ 33.590.123	₲ -	₲ -	₲ -	₲ -
4	Aislacion horizontal pared 0.15m				₲ 7.592.271	₲ 4.775.229	₲ -	₲ -	₲ -	₲ -	₲ -
5	Mamposteria de nivelación de ladrillo común de 0.30 m en todo el borde perimetral, muro de contención, nivelación de paredes exteriores				₲ 795.715	₲ 3.745.685	₲ -	₲ -	₲ -	₲ -	₲ -
6	Construccion/Colocacion de techo/tinglado						₲ -	₲ -	₲ -	₲ -	₲ -
6.1	Techo de chapa trapezoidal sobre estructura de perfiles metalicos						₲ 149.143.500	₲ 190.903.680	₲ 256.526.820	₲ -	₲ -
6.2	Extractores eolicos de 24" de diametro						₲ 281.004	₲ 5.074.596	₲ -	₲ -	₲ -
7	Colocacion de pisos - contrapisos						₲ -	₲ -	₲ -	₲ -	₲ -
7.1	Piso de hormigon e: 12 cm con tratamiento de pavicrom, terminación helicoptero								₲ 84.546.569	₲ 61.784.031	₲ -
7.2	Contrapiso de cascote e: 10cm						₲ 2.399.958	₲ 57.740.166	₲ 3.388.176	₲ -	₲ -
7.3	Carpeta Cementicia, e:2cm							₲ 13.521.800	₲ 11.213.200	₲ -	₲ -
8	Servicio de pintura							₲ -	₲ -	₲ -	₲ -
8.1	De vigas, pilares y muchetas exteriores con pintura sintetica							₲ 3.891.867	₲ 13.278.133	₲ -	₲ -
8.2	Pintura para piso sector cancha									₲ 14.193.530	₲ 23.749.570
9	Limpieza de obra										₲ 2.911.800
	MONTO MENSUAL	**₲ 6.269.283**	**₲ 22.026.653**	**₲ 90.238.892**	**₲ 168.366.395**	**₲ 185.656.262**	**₲ 282.635.326**	**₲ 297.691.319**	**₲ 368.952.898**	**₲ 75.977.561**	**₲ 26.661.370**
	MONTO ACUMULADO	**₲ 6.269.283**	**₲ 28.295.937**	**₲ 118.534.829**	**₲ 286.901.224**	**₲ 472.557.486**	**₲ 755.192.812**	**₲ 1.052.884.131**	**₲ 1.421.837.029**	**₲ 1.497.814.590**	**₲ 1.524.475.960**

Ing. Carlos Javier Amarilla
Fiscal de Obras
Gobernación de Itapúa

CONSTRUCTORA VICTORIA
80045040-0
Ing. José María Caballero
Representante Legal

CRONOGRAMA FISICO

Items	Descripción del Bien	MES 1	MES 2	MES 3	MES 4	MES 5	MES 6	MES 7	MES 8	MES 9	MES 10
1	Preparacion de obra - trabajos Preliminares										
1.1	Replanteo y limpieza de la obra	49,44%	50,56%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
1.2	Cartel	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
1.3	Obrador de obra	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
2	Preparacion de obra - Movimiento de suelos										
2.1	Excavacion para zapatas y encadenados	0,00%	36,81%	51,94%	11,25%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
2.2	Relleno y Compactación	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	11,36%	46,30%	42,35%	0,00%	0,00%	0,00%
3	Colocacion de hormigon armado - Estructura de Hormigon armado										
3.1	Zapatas	0,00%	0,00%	25,83%	36,30%	29,72%	8,15%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
3.2	Encadenado inferior 20 x 50	0,00%	0,00%	23,33%	48,40%	28,27%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
3.3	Viga superior 15x60	0,00%	0,00%	0,00%	16,17%	39,63%	44,20%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
3.4	Encadenado superior 20x60	0,00%	0,00%	0,00%	16,17%	39,63%	44,20%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
3.5	Columnas de Hormigon armado de 0.30x0.70	0,00%	0,00%	0,00%	16,17%	39,63%	44,20%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
4	Aislacion horizontal pared 0.15m	0,00%	0,00%	0,00%	61,39%	38,61%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
5	Mamposteria de nivelación de ladrillo común de 0.30 m en todo el borde perimetral, muro de contención, nivelación de paredes exteriores	0,00%	0,00%	0,00%	17,52%	82,48%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
6	Construccion/Colocacion de techo/tinglado										
6.1	Techo de chapa trapezoidal sobre estructura de perfiles metalicos	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	25,00%	32,00%	43,00%	0,00%	0,00%
6.2	Extractores eolicos de 24" de diametro	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	5,25%	94,75%	0,00%	0,00%	0,00%
7	Colocacion de pisos - contrapisos										
7.1	Piso de hormigon e: 12 cm con tratamiento de pavicrom, terminación helicoptero	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	57,78%	42,22%	0,00%
7.2	Contrapiso de cascote e: 10cm	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	3,78%	90,89%	5,33%	0,00%	0,00%
7.3	Carpeta Cementicia, e:2cm	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	54,67%	45,33%	0,00%	0,00%
8	Servicio de pintura										
8.1	De vigas, pilares y muchetas exteriores con pintura sintetica	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	22,67%	77,33%	0,00%	0,00%
8.2	Pintura para piso sector cancha	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	37,41%	62,59%
9	Limpieza de obra	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
	MONTO MENSUAL	**0,41%**	**1,44%**	**5,92%**	**11,04%**	**12,18%**	**18,54%**	**19,53%**	**24,20%**	**4,98%**	**1,75%**
	MONTO ACUMULADO	**0,41%**	**1,86%**	**7,78%**	**18,82%**	**31,00%**	**49,54%**	**69,07%**	**93,27%**	**98,25%**	**100,00%**

GOBERNACIÓN DEPARTAMENTAL DE ITAPÚA
Fiscalización de Obras

Ing. Carlos Javier Amarilla
Fiscal de Obras
Gobernación de Itapúa

CONSTRUCTORA VICTORIA
Ruc 80045040-0

Ing. José María Caballero
Representante Legal

CURVA DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO

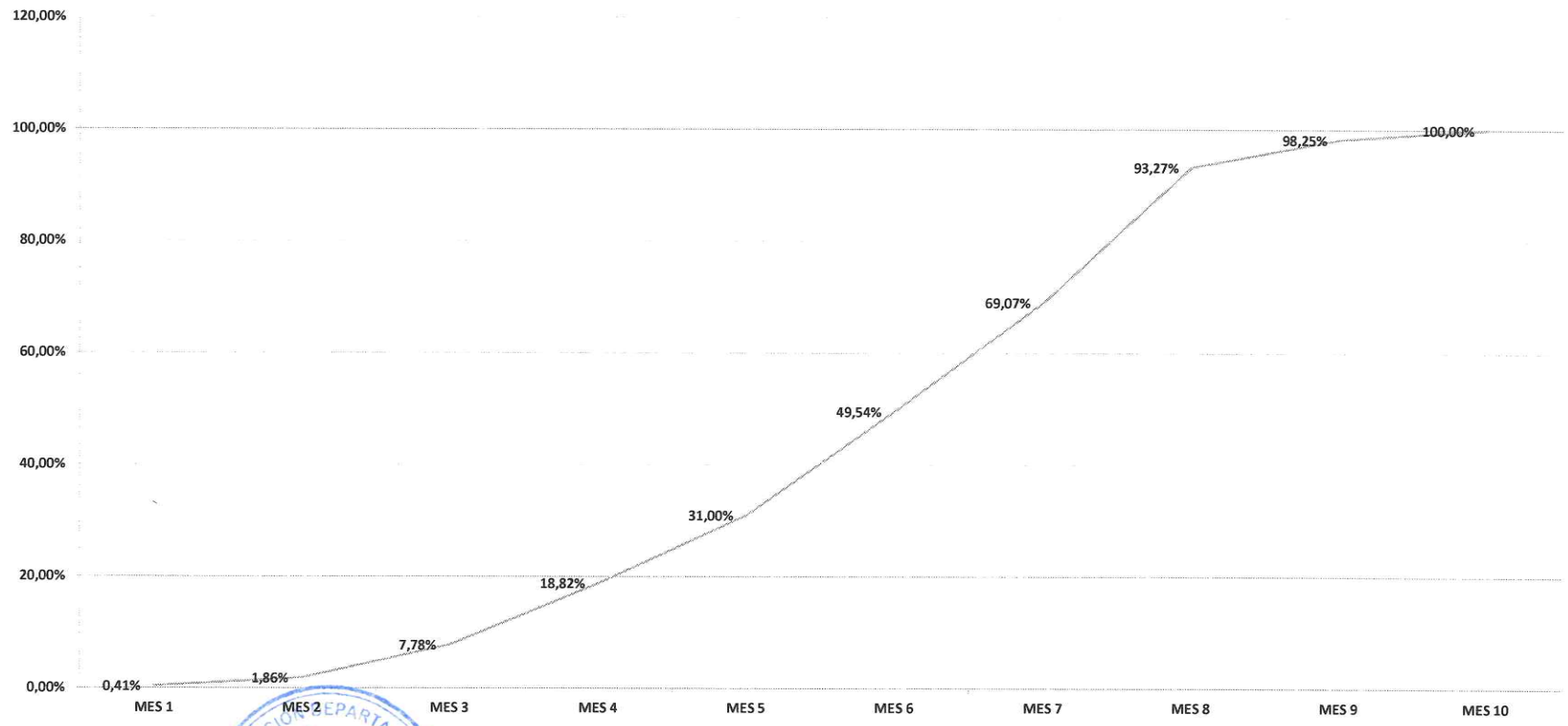

Ing. Carlos Javier Amarilla
Fiscal de Obras
Gobernación de Itapúa

CONSTRUCTORA VICTORIA
RUC 80045040-0

Ing. José María Caballe
Representante Legal
