REPÚBLICA DEL PARAGUAY
PODER JUDICIAL
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
CONTRALORIA INTERNA

DEPARTAMENTO DE CONTROL FINANCIERO

Compromiso con la gente

GUIA BASICA PARA CONTROL DE EXPEDIENTES ADMINISTRATIVOS
Res. C.G.R. Nº 236/2020

Vigencia Octubre/2020

EXPEDIENTE Nº **23015** PROVEEDOR: **APONTE LATORRE S.A.**

	Bienes		Servicios		Serv. Postales	
Solicitud de pago del Proveedor c/Sello recibido M.E.----------	1		1		1	
Factura----------	2		2		2	
Formulario de Verificacion de Documentos----------	3		3		3	
Nota de pedido del Ambito solicitante (si corresp.)----------			4		4	
Nota de Remisión ----------	4					
Nota de Presupuesto (si corresp.)----------	5		5			
Orden de Inspección (si corresp.)----------			6			
Solicitud de Servicios (si corresp.)----------	6		7		5	
Verificación/Retiro de Equipos----------			8			
Orden de Imputación (si corresp.)----------			9			
Aprob. de Presup. de Servicios (Res.2602/14) (si corresp.)----			10			
Orden de Servicios/Compra----------	7		11		6	
Hoja de Ingreso de Bienes en depósito----------	8					
Listado o Resumen de trasl. de encomiendas y/o valores--------					7	
Acta de Recepción Parcial/Definitiva----------	9		12			
Acta de Inicio de Obra (si corresponde)----------			13			
Certificado de Obras (si corresponde)----------			14			
Inf.Técnico de Verificación(ITV)Dpto.Control Técnico---------			15			
Acta de Aprobación Técnica(si corresp.)----------			16			
Acta de Recepcion de Bienes reparados (si corresponde)-----			17			
Formulario de Conformidad de Facturas----------	10		18		8	
Informe del Administrador de Contrato ----------	11		19		9	
Inf.Técnico de lectura de Contadores (si corresponde)			20			
(1-)CC (2-)CDP (3-)DJ de Saldos/(plurianual)----------	12		21		10	
Seguimiento de Facturación por total del Contrato ----------	13		22		11	
Copia Pólizas/Gtia Seguro(Circular DGAF 1/11)(si corresp.)----	14		23			
Cálculo de Multas (si corresponde)----------	15		24		12	
Seguimiento de Multas (si corresponde)----------	16		25		13	
Recibo de pago de Multas y ND Fiscal (si corresponde)---------	17		26		14	

(1-) CC impreso en el ejercicio vigente
(2-) CDP, en caso que el CC no haya sido emitido en el ejercicio actual
(3-) DJ de saldos, en caso de no contar con el CDP del ejercicio actual

Laura M Britos
DTA - DIF

Director Administrador de Contrato y/o
Auxiliar Administrador de Contrato

Responsable O.G.V.E.C.

Observación: No llenar, solo tildar los cuadros que contienen documentos del Expediente.

PODER JUDICIAL
Corte Suprema de Justicia
Dirección General de Administración y Finanzas

23015

FORMULARIO DE VERIFICACION DE DOCUMENTOS

PROVEEDOR: APONTE LATORRE S.A.

DETALLE PROVEEDOR: CERTIFICADO DE OBRAS N° 7

FECHA EXPEDIENTE: 18/09/2024 11:26:05 a.m.

CC N°: LP-13001-23-229106 **PAC N°:** 47-2022

CONTRATO N°: 24/23 **CDP N°:**

PROGRAMA: 1 001 01 ADMNISTRACION INSTITUCIONAL 00 00 **OBJETO DE GASTO:** 522 **FUENTE F.:** 30

DOCUMENTOS ASOCIADOS

ITEM	TIPO DOCUMENTO	NUMERO	FECHA	MONTO
1	FACTURA CREDITO	0010010000272	18/09/2024	410.414.956

OBSERVACIONES:

APLICAR RETENCION CAUCIONAL 5% SOBRE MONTO TOTAL DEL CERTIFICADO.-

TOTAL: **410.414.956**

VERIFICADO POR:	Se certifica que la factura ha sido verificada en su integridad, no encontrándose observaciones, por tanto, se recomienda tramitar el documento.
PAEZ, MARIA MARTA	

María Marta Páez
Oficina General de Verificación y Ejecución de Contratos
DIRECCION ADMINISTRATIVA - CSJ

23015

23015

PODER JUDICIAL
Corte Suprema de Justicia
Dirección General de Administración y Finanzas

COMPROBANTE DE RECEPCION DE DOCUMENTOS
Fecha 18/09/2024

PROVEEDOR: APONTE LATORRE S.A.
DETALLE PROVEEDOR:

Se recepcionan los siguientes documentos, sujetos a verificación para su debido procesamiento:

1 FACTURA CREDITO N° 0010010000272 de fecha 18/09/2024

Observaciones:
ADJUNTA: CCT - CCSS - REPSE
CONSTANCIA DE NO RETENCION
RESUMEN DE CERTIFICADO DE OBRAS N° 7

Juan M. Guillen Molas
Oficina General de Verificación y Ejecución de Contratos
DIRECCION ADMINISTRATIVA - CSJ

4001-01-572-30

GUILLEN MOLAS, JUAN MANUEL
Fecha y hora de impresión: 18/09/2024 11:27:38 a.m.

APONTE LATORRE
CONSTRUCTORA

Asunción, 18 de setiembre de 2024.

Abg. Mirko Anibal Duré
Director Interino
Dirección General de Administración y Finanzas
Corte Suprema de Justicia
Alonso y Testanova
439 4000
Asunción

Ref.: Solicitud de Pago Certificado de Obra Nº 07 - Contrato Nº 24/2023 – *LPN PAC Nº 47/2022. CONSTRUCCION DEL EDIFICIO SEDE TESTANOVA – PLURIANUAL – ID 407720.*

De mi mayor consideración.

Tengo a bien dirigirme a Usted en el marco del contrato de la referencia con el objeto de presentar la Factura del Certificado Nº 07, a los efectos de considerar el pago.

Por la presente, cumplimos con la presentación de los documentos requeridos en el PBC y solicitamos a la Contratante dar curso al pago del Certificado Nº 07 de **Gs. 410.414.956 (guaraníes cuatrocientos diez millones cuatrocientos catorce mil novecientos cincuenta y seis)**.

Se adjunta:

*- Factura N° 001-001-0000272
*- Constancia SIPE
*- Certificado de Fiel Cumplimiento Tributario (CCT)
*- Certificado Laboral
*- Constancia de Cumplimiento con la Seguridad Social
*-Certificado de Anotaciones Personales
*-Certificado de Quiebras
*-Constancia de NO Retención IVA
*-Constancia de NO Retención RENTA
*- REPSE (registro de prestadores de servicios)

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
OFIC. DE VERIFICACION Y EJECUCION DE CONTRATOS
18 SEP. 2024
Recibido por: Ana M. Galeano Alvarez
Aclaración: Dirección General de Contratos
DIRECCION ADMINISTRATIVA - CSJ

Sin otro particular, lo saludo atentamente.

Ing. Osvaldo Aponte Rodríguez
Representante Legal
APONTE LATORRE S.A.
CONSTRUCTORA

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Compromiso con la gente

FCFN° 08/2024

FORMULARIO DE CONFORMIDAD DE FACTURAS
(OBRAS)

PAC N°: 47/22	ID N°: 407.720
DESCRIPCIÓN DEL LLAMADO: **LPN PAC N° 47/2022 - " CONSTRUCCION DEL EDIFICIO SEDE TESTANOVA - PLURIANUAL " ID 407720**	
CONTRATO N°: 24/2023 1° CONVENIO MODIFICATORIO N°44/2024	PROVEEDOR: **APONTE LATORRE S.A.**

La Arquitecta Carolina Ruffinelli, Administradora de Contrato designada por Resolución de la CSJ N°7848 de fecha 11/03/2020, certifica que la Factura N° 001-001-0000272 de fecha 18/09/2024 corresponde al monto por el pago correspondiente al CERTIFICADO DE OBRAS N° 7, la presentación del mismo se ajusta a los ítems, mediciones y condiciones establecidas en el apartado Formas y Condiciones de Pago de las especificaciones técnicas del Pliego de Bases y Condiciones, por tanto se otorga la conformidad pertinente para el inicio del proceso de pago.

Firma del Administrador Auxiliar del Contrato: Laura M. Britos DTA - DIF

Firma de la Directora Administrador del Contrato: .....

Arq. CAROLINA RUFFINELLI
Directora
Dirección de Infraestructura Física

Fecha: 23/09/2024

APONTE LATORRE CONSTRUCTORA

KuDE de FACTURA ELECTRÓNICA

APONTE LATORRE SA

CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS

CALLE, JOHN F. KENNEDY E/ TEODORO S. MONGELOS Y HERMINIO GIMENEZ

021212034

contabilidad@apontelatorre.com

RUC : 80022538-4
Timbrado No 16310797
Inicio de vigencia 29/03/2023
FACTURA ELECTRÓNICA
001 - 001 - 0000272

Fecha y hora de 18/09/2024
RUC/documento de identidad No: 80005191-2
Nombre : CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
Direccion : ALONSO Y TESTANOVA

Condición de venta: Crédito
Cuotas: 0
Moneda: Guarani
Tipo de operación: Prestación de servicios

Cantidad	Descripción	Precio	Descuento	Exentas	5%	10%
1	Contrato Nº 24 / 2023. Licitacion Publica Nacional PAC Nº 47 / 2022. Construccion del Edificio Sede Testanova - Plurianual - Cto. Nº 24 / 23.- Certificado Nº 07: 504.671.541.- (-) Devol. de Anticipo (12%): 60.560.585.- Total: 410.414.956	410.414.956	0	0	0	410.414.956

SUBTOTAL: 410.414.956

TOTAL DE LA OPERACIÓN: 410.414.956

LIQUIDACIÓN IVA: **5%** 0 **10%** 37.310.451 **TOTAL IVA** 37.310.451

Consulte la validez de esta Factura Electrónica con el número de CDC

https://ekuatia.set.gov.py/consultas/

01800225384001001000027212024091814665794780

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE UN DOCUMENTO

Si su documento electrónico presenta algún error, podrá solicitar la modificación dentro de las 72 horas siguientes de la emisión de este comprobante

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Compromiso con la gente

IAC Nº 08/2024

INFORME DE ADMINISTRADOR DE CONTRATO

(OBRAS)

(de conformidad al plazo estipulado)

PAC Nº: 47/22	ID Nº: 407.720
DESCRIPCIÓN DEL LLAMADO: **LPN PAC N° 47/2022 - " CONSTRUCCION DEL EDIFICIO SEDE TESTANOVA - PLURIANUAL " ID 407720**	
CONTRATO Nº: 24/2023 1° CONVENIO MODIFICATORIO N°44/2024	PROVEEDOR: **APONTE LATORRE S.A.**

La Arquitecta Carolina Ruffinelli, Administradora de Contrato designada por Resolución de la N°7848 de fecha 11/03/2020, certifica que los trabajos realizados descriptos en el Certificado de Obras N°7, se ajusta a los ítems, cantidades y montos, de acuerdo a lo adjudicado, la presentación del mismo se ajusta a los procedimientos detallados en las especificaciones técnicas del Pliego de Bases y Condiciones, además de las verificaciones realizadas por el Supervisor de la Obra en su informe, y aprobación de la fiscalización de la obra, por tanto se otorga la conformidad pertinente para el inicio de los procesos de pagos correspondientes.

En cuanto al cumplimiento de los plazos, se informa que se ha dado cumplimiento a lo establecido en la Cláusula N°8 – Plazo, Lugar y Condiciones de la Obra.

Laura M. Britos
ETA - DIF

Firma del Administrador Auxiliar Del Contrato :.....

Firma de la Directora Administradora del Contrato: .....

Arq. CAROLINA RUFFINELLI
Directora
Dirección de Infraestructura Física

Fecha: 23/09/2024

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

Compromiso con la gente

Dirección de Infraestructura Física

Departamento de Obras y Proyectos

INFORME TECNICO

Asunción, 23 de setiembre de 2024.

REF.: LPN PAC Nº 47/2022 "CONSTRUCCION DEL EDIFICIO SEDE TESTANOVA – PLURIANUAL – ID Nº 407720" CONTRATO Nº 24/2023 – CONVENIO MODIFICATORIO Nº 44/2024

El Arq. Javier Riveros, en calidad de Supervisor de la obra de referencia, remite en forma impresa, el CERTIFICADO DE OBRA Nº 7, informando cuanto sigue:

- El presente Certificado de Obra ha sido verificado exhaustivamente y aprobado por esta dependencia.
- Las mediciones fueron verificados "In Situ" conjuntamente con la Empresa Contratista, y la Fiscalización de Obras, no constatándose errores.

Muy atentamente

PODER JUDICIAL
D.I.F.
Departamento de Obras y Proyectos

P/A: Ing. Marina Pereira
Técnico
Departamento Obras y Proyectos.

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

Compromiso con la gente

Dirección de Infraestructura Física

Dpto. de Obras y Proyectos

INFORME TECNICO

Asunción, 23 de setiembre de 2024.

Se remite el Certificado de Obras N° 7 correspondiente a la Obra "LPN PAC Nº 47/2022 "CONSTRUCCION DEL EDIFICIO SEDE TESTANOVA - PLURIANUAL" CONTRATO Nº 24/2023 – CONVENIO MODIFICATORIO Nº 44/2024, debidamente firmado por el Fiscal de Obras y el Supervisor de Obras como representante de Dirección de Infraestructura Física, acompañado de la Planilla de Medición que corresponde al Certificado presentado.

Se informa que el mismo ha sido verificado y se ajusta a lo establecido en la Especificaciones Técnicas del Pliego de Bases y Condiciones. En cuanto al cumplimiento de los plazos, se informa que ha dado cumplimiento a lo establecido en la Cláusula Nº 8 del Pliego de Bases y Condiciones.

Por lo expuesto, corresponde la firma de la Dirección para proseguir con los trámites administrativos.

Atentamente.

P/A: Ing. Marina Pereira
Técnico
Departamento de Obras y Proyectos.

RVV Ingeniería
Mayor Casianoff 471 c/Del Maestro – Asunción
Telefax: 601 – 095 / 612 – 125

Asunción, 23 de septiembre de 2024

Señora
Arq. Carolina Ruffinelli Alonso, Directora
Dirección de Infraestructura Física
Corte Suprema de Justicia
Presente

Ref.: Contrato Nº 24/2023 – Convenio Modificatorio Nº 44/2024
"Construcción del Edificio Sede Testanova – Contrato Nº 90/2023
"Consultoría para Fiscalización de Obras – Edificio Sede Testanova"

Me dirijo a Usted y por su intermedio donde corresponda, en mi carácter de Fiscal de Obras del contrato de referencia a fin de comunicar la aprobación del Certificado de Obras Nº 07, conforme medición realizada y documentación presentada.-

Se verificó la ejecución de los rubros de conformidad a las Especificaciones Técnicas de las obras y el cumplimiento de los plazos expresados en el cronograma presentado.-

Resumen del Certificado:

Nº del Certificado	: 7
Período	: 01/08/2024 al 31/08/2024
Importe Total	: Gs. 504.671.541.-
Devolución del Anticipo	: Gs. 60.560.585.-
Devolución de Acopio de Materiales según Pliego De Bases y Condiciones. 50 % de factura de compra De varillas..-	Gs. 33.696.000.-
Monto neto del Certificado	: Gs. 410.414.956.-

Atentamente.

Ing. Roberto Vera Vierci
Fiscal General de Obra

Ing. José Pavón
Fiscal de Obras

RECIBIDO
Dpto. Obras y Proyectos - D.I.F
Ent. Nº 843 Fecha: 23/9 Firma: Deisy E
Deisy Escobar
Dpto. Obras y Proyectos - D.I.F.

RECIBIDO
23 -09-
DIRECCIÓN INFRAESTRUCTURA FISICA

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

PRIMER CONVENIO MODIFICATORIO AL CONTRATO Nº24/2023, EN EL MARCO DEL LLAMADO A LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PAC Nº47/2022 "CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO SEDE TESTANOVA-PLURIANUAL" ID Nº407.720 - Convenio Modificatorio 01- Nº44/2024

APONTE LATORRE
CONSTRUCTORA

CERTIFICADO DE OBRA Nº07
AGOSTO-2024

RESUMEN GENERAL

RESUMEN DE CERTIFICADO DE OBRAS Nº7

PRIMER CONVENIO MODIFICATORIO AL CONTRATO Nº24/2023, EN EL MARCO DEL LLAMADO A LICITACION PUBLICA NACIONAL PAC Nº47/2022 "CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO SEDE TESTANOVA-PLURIANUAL" ID Nº407.720

n Judicial: Capital		INICIO DE OBRAS:	15/11/2023
ratista: APONTE LATORRE S.A.		PERIODO :	01/08/2024 al 31/08/2024
4/2023 - Convenio Modificatorio 01- Nº44/2024			
l Contrato:		Gs.	31.825.211.009

escripción	CANTIDADES EJECUTADAS				MONTO EN GUARANIES		
	Monto de contrato	% acumulado anterior	Ejecutado en el periodo	Acumulado actual	Certificado acumulado anterior	Certificado actual	Certificado acumulado
	31.825.211.009	3,30%	1,59%	4,89%	1.050.676.466	504.671.541	1.555.348.007
riales según Pliego de ones. 50% de factura de as		0,78%	0,00%	0,78%	249.600.000	0	249.600.000
		4,08%	1,59%	5,67%	1.300.276.466	504.671.541	1.804.948.007
					ESTE CERTIFICADO:	504.671.541	

DEDUCCIONES

	Monto de contrato	% acumulado anterior	Ejecutado en el periodo	Acumulado actual	Certificado acumulado anteior	Certificado actual	Certificado acumulado
Anticipo (12%)	3.819.025.321	4,08%	1,59%	5,67%	156.033.176	60.560.585	216.593.761
Acopio de materiales Bases y Condiciones. de compra de varillas	249.600.000	7,17%	13,50%	20,67%	17.888.000	33.696.000	51.584.000
Fondo de Reparo (5%)	1.591.260.550	4,08%	1,59%	5,67%	65.013.823	25.233.577	90.247.400
					Monto en Factura:	410.414.956	

RETENCIONES ACUMULADAS PARA FONDO DE REPAROS: 90.247.400

Saldo:	30.020.263.002

MULTAS

a multa	Monto

Ing. Osvaldo Aponte Rodríguez Representante Legal APONTE LATORRE S.A. CONSTRUCTORA		Arq. Javier Lorenzo Riveros Técnico Dpto. Obras y Proyectos - D.I.F	Arq. CAROLINA RUFFINELLI Directora Dirección de Infraestructura Física
Contratista	ROBERTO VERA VIERCI Fiscalizacion Ingeniero Civil	Supervision de Infraestructura Fisica	Direccion de Infraestructura Fisica

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

PRIMER CONVENIO MODIFICATORIO AL CONTRATO Nº24/2023, EN EL MARCO DEL LLAMADO A LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PAC Nº47/2022 "CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO SEDE TESTANOVA PLURIANUAL" ID Nº407.720 - Convenio Modificatorio 01- Nº44/2024

CÁLCULO DE DEVOLUCIÓN DE ACOPIO DE MATERIALES

Descripción	Cantidad de Varilla Utilizada (Kg)	Precio (Gs) 50% del Precio de Compra	Monto a Descontar (Gs)
Devolucion de Acopio de materiales según Pliego de Bases y Condiciones. 50% de factura de compra de varillas	8.100	4.160	33.696.000
		Total Descontar:	**33.696.000**

Ing. Osvaldo Aponte Rodríguez
Representante Legal
APONTE LATORRE S.A.
CONSTRUCTORA

ROBERTO VERA VIERCI
Ingeniero Civil

Arq. Javier Lorenzo Riveros
Técnico
Dpto. Obras y Proyectos - D.I.F.

L&N HIERROS // L&N HIERROS // L&N HIERROS //

PLANILLAS DE CERTIFICADO

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

PRIMER CONVENIO MODIFICATORIO AL CONTRATO Nº24/2023, EN EL MARCO DEL LLAMADO A LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PAC Nº47/2022 "CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO SEDE TESTANOVA-PLURIANUAL" ID Nº407.720

ta: APONTE LATORRE S.A. — Periodo: 01/08/2024 al 31/08/2024

Nº: 24/2023 - Convenio Modificatorio 01- Nº44/2024

CERTIFICADO DE OBRA Nº: 7 (SIETE)

Descripción de los Rubros	Unid.	Cantidad	Precio Unitario (Gs.)	Precio Total (Gs.)	Acumulado Anterior Monto (Gs.)	Acumulado Anterior %	Presente Certificado Monto (Gs.)	Presente Certificado %	Acumulado Actual Monto (Gs.)	Acumulado Actual %
TRABAJOS PRELIMINARES										
Limpieza de terreno	Metros cuadrados	408	7.500	3.060.000	3.060.000	100,00%	-	0,00%	3.060.000	100,00%
Vallado frontal h=2,00m, estructura metálica (pilar caño 50mmx50mmx2mm, bastidor caño 50mmx50mmx2mm), cerramiento chapa doblada de zinc Nº 24. Terminación pintura esmalte sintético color a definir en obra.	Metro lineal	18,5	363.000	6.715.500	6.715.500	100,00%	-	0,00%	6.715.500	100,00%
Obras provisionales	Unidad Medida Global	1	27.000.000	27.000.000	27.000.000	100,00%	-	0,00%	27.000.000	100,00%
Instalación eléctrica e hidrosanitaria de la obra	Unidad Medida Global	1	29.700.000	29.700.000	29.700.000	100,00%	-	0,00%	29.700.000	100,00%
Letrero de obra	Metros cuadrados	8	1.350.000	10.800.000	10.800.000	100,00%	-	0,00%	10.800.000	100,00%
Replanteo y marcación de obra	Metros cuadrados	408	15.000	6.120.000	1.224.000	20,00%	-	0,00%	1.224.000	20,00%
Demolición de estructura de hormigón armado existente con elementos manuales, equipamientos y maquinarias de demolición. (No se permite el uso de material explosivo para los trabajos de la demolición)	Unidad Medida Global	1	225.000.000	225.000.000	213.750.000	95,00%	7.875.000	3,50%	221.625.000	98,50%
Bandeja de protección - ancho mínimo 1,20m y ancho máximo de 2,00m - de madera (tirantes 2"x4", tablas 1"), limites exteriores de la edificación - a nivel de pisos 2do, 4to, 6to, 8vo, 10mo.	Metro lineal	375	337.500	126.562.500	50.625.000	40,00%	-	0,00%	50.625.000	40,00%
Malla vertical de protección tipo rejilla de material PVC -, limites exteriores de la edificación.	Metros cuadrados	3.375	90.000	303.750.000	60.750.000	20,00%	-	0,00%	60.750.000	20,00%
Barandas metálicas de protección provisorias en sectores de escaleras - altura 1,00m, de caños metálicos, terminación pintura sintética color a definir en obra	Unidad Medida Global	1	37.500.000	37.500.000	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
MOVIMIENTO DE SUELO	Unidad Medida Global							0,00%		
Desbroce de terreno en área afectada por la construcción. Extracción de una capa de 20 cm de espesor y retiro de material sobrante.	Metros cuadrados	408	12.500	5.100.000	5.100.000	100,00%	-	0,00%	5.100.000	100,00%
EXCAVACION								0,00%		
Apuntalamiento de Construcciones Vecinas	Unidad Medida Global	1	225.000.000	225.000.000	45.000.000	20,00%	157.500.000	70,00%	202.500.000	90,00%
De tierra suelta	Metros cúbicos	320	68.750	22.000.000	17.187.500	78,13%	4.812.500	21,88%	22.000.000	100,00%
De tierra compacta dura - tipo arenisca -.	Metros cúbicos	610,1	187.500	114.384.375	56.250.000	49,18%	23.831.250	20,83%	80.081.250	70,01%
En roca para zapatas de fundación del edificio.	Metros cúbicos	580	225.000	130.500.000	67.500.000	51,72%	63.000.000	48,28%	130.500.000	100,00%
En tierra compacta dura -tipo arenisca- caja de ascensor, sumidero pluvial y acceso PD.	Unidad Medida Global	1	25.000.000	25.000.000	-	0,00%	20.000.000	80,00%	20.000.000	80,00%
Excavacion para tubulones de hormigon armado en tierra compacta dura - tipo arenisca	Metros cúbicos	312,47	448.775	140.228.724	118.925.375	84,81%	-	0,00%	118.925.375	84,81%
RELLENO Y COMPACTACION								0,00%		
En fundaciones del edificio.	Metros cúbicos	400	56.250	22.500.000	-	0,00%	20.812.500	92,50%	20.812.500	92,50%
Adyacente a la caja de ascensor y acceso PD.	Unidad Medida Global	1	6.250.000	6.250.000	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
En nivelación para base de pisos en Subsuelo 2.	Metros cúbicos	-	-	-				0,00%		
En nivelación para base de pisos en Subsuelo 1.	Metros cúbicos	90	56.250	5.062.500	-	0,00%	1.012.500	20,00%	1.012.500	20,00%
En base para contrapisos de veredas.	Unidad Medida Global	1	3.750.000	3.750.000	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
CIMENTACIONES	Unidad Medida Global							0,00%		
EDIFICIO								0,00%		
Cimentación de HºAº	Metros cúbicos	-	-	-				0,00%		
Tubulones de hormigon armado - Hormigon fck 250 k/cm2	Metros cúbicos	216,63	1.788.780	387.503.411	174.853.245	45,12%	66.417.401	17,14%	241.270.646	62,26%
Cabezales de hormigon armado - Hormigon fck 250 k/cm3	Metros cúbicos	95,84	2.222.385	212.993.378	53.248.345	25,00%	22.690.551	10,65%	75.938.895	35,65%

Contratista	Fiscalización	Supervisión de Infraestructura Fisica	Dirección de Infraestructura Fisica
Ing. Osvaldo Aponte Rodriguez Representante Legal APONTE LATORRE S.A. CONSTRUCTORA	ROBERTO VERA VIERCI Ingeniero Civil	Arq. Javier Lorenzo Riveros Técnico Dpto. Obras y Proyectos - D.I.F.	Arq. CAROLINA RUFFINELLI Dirección de Infraestructura Física

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

PRIMER CONVENIO MODIFICATORIO AL CONTRATO Nº24/2023, EN EL MARCO DEL LLAMADO A LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PAC Nº47/2022 "CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO SEDE TESTANOVA-PLURIANUAL" ID Nº407.720

ta: APONTE LATORRE S.A. — Periodo: 01/08/2024 al 31/08/2024

Nº: 24/2023 - Convenio Modificatorio 01- Nº44/2024

CERTIFICADO DE OBRA Nº: 7 (SIETE)

	Descripción de los Rubros	Unid.	Cantidad	Precio Unitario (Gs.)	Precio Total (Gs.)	Acumulado Anterior Monto (Gs.)	Acumulado Anterior %	Presente Certificado Monto (Gs.)	Presente Certificado %	Acumulado Actual Monto (Gs.)	Acumulado Actual %
	Vigas de fundación cadena	Metros cúbicos	32	3.587.565	114.802.080	-	0,00%	19.372.851	16,88%	19.372.851	16,88%
	Pantallas de HºAº en fosa de ascensores	Metros cúbicos	7	3.805.125	26.635.875	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
	Plateas de fundación para cajas de ascensores	Metros cúbicos	20	2.333.469	46.669.380	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
	ESTRUCTURA DE HORMIGÓN ARMADO	Unidad Medida Global							0,00%		
	SUBSUELO 2								0,00%		
	Pilares	Metros cúbicos	-	-	0				0,00%		
	Pantalla perimetral de 20 cm. de espesor	Metros cúbicos	-	-	0				0,00%		
	Pantallas para cajas de ascensor	Metros cúbicos	-	-	0				0,00%		
	Losas de techo	Metros cúbicos	-	-	0				0,00%		
	Vigas de techo	Metros cúbicos	-	-	0				0,00%		
	Escaleras	Metros cúbicos	-	-	0				0,00%		
	Tanque de HºAº enterrado - reservorio agua potable -	Metros cúbicos	-	-	0				0,00%		
	Aberturas en vigas con cajas metálicas de 78cmx33cm para paso de ductos. Ver deta	Unidad Medida Global	-	-	0				0,00%		
	Aberturas en vigas con cajas metálicas de 43cmx33cm para paso de ductos. Ver deta	Unidad Medida Global	-	-	0				0,00%		
	SUBSUELO 1								0,00%		
	Pilares	Metros cúbicos	21,5	4.136.063	88.925.355		0,00%	41.401.991	46,56%	41.401.991	46,56%
	Pantalla perimetral de 20 cm. de espesor	Metros cúbicos	70,8	3.678.288	260.422.790		0,00%	-	0,00%	-	0,00%
	Pantallas para cajas de ascensor	Metros cúbicos	15,3	3.170.938	48.515.351		0,00%	-	0,00%	-	0,00%
	Losas de techo	Metros cúbicos	38,5	3.143.938	121.041.613		0,00%	12.371.396	10,22%	12.371.396	10,22%
	Vigas de techo	Metros cúbicos	27,5	3.502.250	96.311.875		0,00%	16.040.305	16,65%	16.040.305	16,65%
	Escaleras	Metros cúbicos	3	3.263.375	9.790.125		0,00%	-	0,00%	-	0,00%
	Aberturas en vigas con cajas metálicas de 78cmx33cm para paso de ductos. Ver detalle de planos	Unidad Medida Global	1	1.875.000	1.875.000		0,00%	-	0,00%	-	0,00%
	Aberturas en vigas con cajas metálicas de 43cmx33cm para paso de ductos. Ver detalle de planos	Unidad Medida Global	1	1.875.000	1.875.000		0,00%	-	0,00%	-	0,00%
	Tanque de HºAº enterrado - reservorio agua potable -	Metros cúbicos	16	4.202.700	67.243.200		0,00%	-	0,00%	-	0,00%
	PLANTA BAJA								0,00%		
	Pilares	Metros cúbicos	19	4.136.063	78.585.197		0,00%	-	0,00%	-	0,00%
	Pantallas para cajas de ascensor	Metros cúbicos	15,3	3.170.938	48.515.351		0,00%	-	0,00%	-	0,00%
	Losas de techo	Metros cúbicos	28	3.143.938	88.030.264		0,00%	-	0,00%	-	0,00%
	Vigas de techo	Metros cúbicos	28,5	3.502.250	99.814.125		0,00%	-	0,00%	-	0,00%
	Escaleras	Metros cúbicos	3,5	3.263.375	11.421.813		0,00%	-	0,00%	-	0,00%
	Aberturas en vigas con cajas metálicas de 78cmx33cm para paso de ductos. Ver detalle de planos	Unidad Medida Global	1	1.875.000	1.875.000		0,00%	-	0,00%	-	0,00%
	Aberturas en vigas con cajas metálicas de 43cmx33cm para paso de ductos. Ver detalle de planos	Unidad Medida Global	1	1.875.000	1.875.000		0,00%	-	0,00%	-	0,00%
	PRIMER NIVEL								0,00%		
	Pilares	Metros cúbicos	19	4.136.063	78.585.197		0,00%	-	0,00%	-	0,00%
	Pantallas para cajas de ascensor	Metros cúbicos	15,3	3.170.938	48.515.351		0,00%	-	0,00%	-	0,00%
	Losas de techo	Metros cúbicos	27,5	3.143.938	86.458.295		0,00%	-	0,00%	-	0,00%
	Vigas de techo	Metros cúbicos	28,5	3.502.250	99.814.125		0,00%	-	0,00%	-	0,00%
	Escaleras	Metros cúbicos	3,5	3.263.375	11.421.813		0,00%	-	0,00%	-	0,00%

Ing. Osvaldo Apolinar Rodríguez Representante Legal APONTE LATORRE S.A. CONSTRUCTORA			Arq. CAROLINA RUFFINELLI Directora Dirección de Infraestructura Física
Contratista	ROBERTO VERA VIERCI Ingeniero Civil	Arq. Javier Lorenzo Riveros Técnico Supervisión de Infraestructura Física Dpto. Obras y Proyectos	Dirección de Infraestructura Física

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

PRIMER CONVENIO MODIFICATORIO AL CONTRATO Nº24/2023, EN EL MARCO DEL LLAMADO A LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PAC Nº47/2022 "CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO SEDE TESTANOVA-PLURIANUAL" ID Nº407.720

ta: APONTE LATORRE S.A. — Periodo: 01/08/2024 al 31/08/2024

Nº: 24/2023 - Convenio Modificatorio 01- Nº44/2024

CERTIFICADO DE OBRA Nº: 7 (SIETE)

	Descripción de los Rubros	Unid.	Cantidad	Precio Unitario (Gs.)	Precio Total (Gs.)	Acumulado Anterior Monto (Gs.)	Acumulado Anterior %	Presente Certificado Monto (Gs.)	Presente Certificado %	Acumulado Actual Monto (Gs.)	Acumulado Actual %
	Instalación de software de monitoreo en computadora	Unidad Medida Global	1	18.750.000	18.750.000		0,00%	-	0,00%	-	0,00%
	Instalación de intercomunicadores	Unidad	2	10.000.000	20.000.000		0,00%	-	0,00%	-	0,00%
	Interconexión de cámaras de vídeo	Unidad	2	5.625.000	11.250.000		0,00%	-	0,00%	-	0,00%
	Manuales de operación y mantenimiento en idioma español	Unidad Medida Global	1	3.125.000	3.125.000		0,00%	-	0,00%	-	0,00%
	Capacitación a funcionarios p/ operación y control del sistema	Unidad Medida Global	1	6.250.000	6.250.000		0,00%	-	0,00%	-	0,00%
	GENERAL								0,00%		
	ESTRUCTURA								0,00%		
7	Refuerzos en pilares por aumento de sobrecargas para uso depositos undecimo nivel	Unidad Medida Global	1,00	68.833.240	68.833.240		0,00%	27.533.296	40,00%	27.533.296	40,00%
	PLANTA BAJA			-	-				0,00%		
8	Preparación de base para ascensor	Unidad Medida Global	1,00	7.648.138	7.648.138		0,00%	-	0,00%	-	0,00%
9	Ascensor para personas con capacidades diferentes, capacidad 150 kg	Unidad Medida Global	1,00	158.019.233	158.019.233		0,00%	-	0,00%	-	0,00%
0	Alimentacion electrica para ascensor de personas con capacidades diferentes	Unidad Medida Global	1,00	15.169.860	15.169.860		0,00%	-	0,00%	-	0,00%
	EXTENSION DE LINEA DE MEDIA TENSION			-	-				0,00%		
1	Extension de linea de Media Tension protegida	Unidad Medida Global	1,00	308.179.292	308.179.292		0,00%	-	0,00%	-	0,00%
	ARTEFACTOS DE ILUMINACIÓN				-				0,00%		
2	Artefacto 60x60 de embutir tecnologia LED	Unidad	719,00	452.378	325.259.782		0,00%	-	0,00%	-	0,00%
					31.825.211.009	**1.050.676.466**	**3,30%**	**504.671.541**	**1,59%**	**1.555.348.007**	**4,89%**

Ing. Osvaldo Aponte Rodriguez
Representante Legal
APONTE LATORRE S.A.
CONSTRUCTORA

Contratista

ROBERTO VERA VIERCI
Fiscalización
Ingeniero Civil

Arq. Javier Lorenzo Riveros
Técnico
Obras y Proyectos - D.I.F.

Supervisión de Infraestructura Física

Arq. CAROLINA RUFFINELLI
Directora
Dirección de Infraestructura Física

Dirección de Infraestructura Física

ACTAS DE MEDICIÓN

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

PRIMER CONVENIO MODIFICATORIO AL CONTRATO Nº24/2023, EN EL MARCO DEL LLAMADO A LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PAC Nº47/202
"CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO SEDE TESTANOVA-PLURIANUAL" ID Nº407.720

LATORRE S.A. — **Periodo: 01/08/2024 al 31/08/2024**

Convenio Modificatorio 01- Nº44/2024

PLANILLA DE MEDICIONES

		CONTRATO	CONVENIO MODIFICATORIO 01	Cantidades			Certificado de Obra en %		
del Bien	**Unidad de Medida**	Cantidad	Cantidad	**Acumulado Anterio**	**Presente Certificado**	**Acumulado Actual**	**Acumulado Anterio**	**Presente Certificado**	**Acumulado Actual**
PRELIMINARES	Unidad Medida Global								
erreno	Metros cuadrados	408	408	408,00		408,00	100,00%	0,00%	100,00%
l h=2,00m, estructura metálica (pilar caño 50mmx50mmx2mm, bastidor caño 50mmx50mmx2mm), hapa doblada de zinc Nº 24. Terminación pintura esmalte sintético color a definir en obra.	Metro lineal	18,5	18,5	18,50		18,50	100,00%	0,00%	100,00%
onales	Unidad Medida Glob	1	1	1,00		1,00	100,00%	0,00%	100,00%
éctrica e hidrosanitaria de la obra	Unidad Medida Glob	1	1	1,00		1,00	100,00%	0,00%	100,00%
ra	Metros cuadrados	8	8	8,00		8,00	100,00%	0,00%	100,00%
marcación de obra	Metros cuadrados	408	408	81,60		81,60	20,00%	0,00%	20,00%
e estructura de hormigón armado existente con elementos manuales, equipamientos y maquinarias n. (No se permite el uso de material explosivo para los trabajos de la demolición)	Unidad Medida Glob	1	1	0,95	0,04	0,99	95,00%	3,50%	98,50%
rotección - ancho mínimo 1,20m y ancho máximo de 2,00m - de madera (tirantes 2"x4", tablas 1"), ores de la edificación - a nivel de pisos 2do, 4to, 6to, 8vo, 10mo.	Metro lineal	375	375	150,00		150,00	40,00%	0,00%	40,00%
de protección tipo rejilla de material PVC -, limites exteriores de la edificación.	Metros cuadrados	3.375	3.375	675,00		675,00	20,00%	0,00%	20,00%
tálicas de protección provisorias en sectores de escaleras - altura 1,00m, de caños metálicos, pintura sintética color a definir en obra	Unidad Medida Glob	1	1	0,00		0,00	0,00%	0,00%	0,00%
O DE SUELO	Unidad Medida Global								
terreno en área afectada por la construcción. Extracción de una capa de 20 cm de espesor y retiro de ante.	Metros cuadrados	408	408	408,00		408,00	100,00%	0,00%	100,00%
N									
nto de Construcciones Vecinas	Unidad Medida Glob	1	1	0,20	0,70	0,90	20,00%	70,00%	90,00%
lta	Metros cúbicos	320	320	250,00	70,00	320,00	78,13%	21,88%	100,00%
pacta dura - tipo arenisca -.	Metros cúbicos	1.900	610,1	300,00	127,10	427,10	49,18%	20,83%	70,01%
zapatas de fundación del edificio.	Metros cúbicos	580	580	300,00	280,00	580,00	51,72%	48,28%	100,00%
pacta dura -tipo arenisca- caja de ascensor, sumidero pluvial y acceso PD.	Unidad Medida Glob	1	1	0,00	0,80	0,80	0,00%	80,00%	80,00%
para tubulones de hormigon armado en tierra compacta dura - tipo arenisca	Metros cúbicos		312,47	265,00	0,00	265,00	84,81%	0,00%	84,81%
COMPACTACION									
es del edificio.	Metros cúbicos	400	400	0	370,0	370,0	0,00%	92,50%	92,50%
la caja de ascensor y acceso PD.	Unidad Medida Glob	1	1		-	-	0,00%	0,00%	0,00%
n para base de pisos en Subsuelo 2.	Metros cúbicos	90	-						
n para base de pisos en Subsuelo 1.	Metros cúbicos		90		18,0	18,0	0,00%	20,00%	20,00%
contrapisos de veredas.	Unidad Medida Glob	1	1			-	0,00%	0,00%	0,00%
ONES	Unidad Medida Global								
de HºAº	Metros cúbicos	204	-						
e hormigon armado - Hormigon fck 250 k/cm2	Metros cúbicos		216,63	97,75	37,13	134,88	45,12%	17,14%	62,26%
e hormigon armado - Hormigon fck 250 k/cm3	Metros cúbicos		95,84	23,96	10,21	34,17	25,00%	10,65%	35,65%
dación cadena	Metros cúbicos	32	32	0,00	5,40	5,40	0,00%	16,88%	16,88%

Osvaldo Aponte Rodríguez
Representante Legal
APONTE LATORRE S.A.

ROBERTO VERA VIERCI
Ingeniero Civil

Arq. Javier Lorenzo Riveros
Técnico
Dpto. Obras y Proyectos - D.I.F.

HºAº en fosa de ascensores	Metros cúbicos	7	7	0,00		0,00	0,00%	0,00%	0,00%
ndación para cajas de ascensores	Metros cúbicos	20	20	0,00		0,00	0,00%	0,00%	0,00%
RA DE HORMIGON ARMADO	Unidad Medida Global								
2									
	Metros cúbicos	21,5	-						
netral de 20 cm. de espesor	Metros cúbicos	70,8	-						
a cajas de ascensor	Metros cúbicos	15,3	-						
no	Metros cúbicos	37,5	-						
no	Metros cúbicos	30,5	-						
	Metros cúbicos	3	-						
ºAº enterrado - reservorio agua potable -	Metros cúbicos	16	-						
vigas con cajas metálicas de 78cmx33cm para paso de ductos. Ver detalle de planos	Unidad Medida Globa	1	-						
vigas con cajas metálicas de 43cmx33cm para paso de ductos. Ver detalle de planos	Unidad Medida Globa	1	-						
1									
	Metros cúbicos	21,5	21,5	0,00	10,01	10,01	0,00%	46,56%	46,56%
netral de 20 cm. de espesor	Metros cúbicos	70,8	70,8			0,00	0,00%	0,00%	0,00%
a cajas de ascensor	Metros cúbicos	15,3	15,3			0,00	0,00%	0,00%	0,00%
no	Metros cúbicos	38,5	38,5	0,00	3,94	3,94	0,00%	10,22%	10,22%
no	Metros cúbicos	27,5	27,5	0,00	4,58	4,58	0,00%	16,65%	16,65%
	Metros cúbicos	3	3			0,00	0,00%	0,00%	0,00%
vigas con cajas metálicas de 78cmx33cm para paso de ductos. Ver detalle de planos	Unidad Medida Globa	1	1			0,00	0,00%	0,00%	0,00%
vigas con cajas metálicas de 43cmx33cm para paso de ductos. Ver detalle de planos	Unidad Medida Globa	1	1			0,00	0,00%	0,00%	0,00%
ºAº enterrado - reservorio agua potable -	Metros cúbicos		16			0,00	0,00%	0,00%	0,00%
JA									
	Metros cúbicos	19	19			0,00	0,00%	0,00%	0,00%
a cajas de ascensor	Metros cúbicos	15,3	15,3			0,00	0,00%	0,00%	0,00%
ho	Metros cúbicos	28	28			0,00	0,00%	0,00%	0,00%
no	Metros cúbicos	28,5	28,5			0,00	0,00%	0,00%	0,00%
	Metros cúbicos	3,5	3,5			0,00	0,00%	0,00%	0,00%
vigas con cajas metálicas de 78cmx33cm para paso de ductos. Ver detalle de planos	Unidad Medida Globa	1	1			0,00	0,00%	0,00%	0,00%
vigas con cajas metálicas de 43cmx33cm para paso de ductos. Ver detalle de planos	Unidad Medida Globa	1	1			0,00	0,00%	0,00%	0,00%
VEL									
	Metros cúbicos	19	19			0,00	0,00%	0,00%	0,00%
ra cajas de ascensor	Metros cúbicos	15,3	15,3			0,00	0,00%	0,00%	0,00%
ho	Metros cúbicos	27,5	27,5			0,00	0,00%	0,00%	0,00%
no	Metros cúbicos	28,5	28,5			0,00	0,00%	0,00%	0,00%
	Metros cúbicos	3,5	3,5			0,00	0,00%	0,00%	0,00%
vigas con cajas metálicas de 78cmx33cm para paso de ductos. Ver detalle de planos	Unidad Medida Globa	1	1			0,00	0,00%	0,00%	0,00%
vigas con cajas metálicas de 43cmx33cm para paso de ductos. Ver detalle de planos	Unidad Medida Globa	1	1			0,00	0,00%	0,00%	0,00%
NIVEL									
	Metros cúbicos	19	19			0,00	0,00%	0,00%	0,00%
ra cajas de ascensor	Metros cúbicos	15,3	15,3			0,00	0,00%	0,00%	0,00%
cho	Metros cúbicos	27,5	27,5			0,00	0,00%	0,00%	0,00%
ho	Metros cúbicos	28,5	28,5			0,00	0,00%	0,00%	0,00%
	Metros cúbicos	3,5	3,5			0,00	0,00%	0,00%	0,00%
vigas con cajas metálicas de 78cmx33cm para paso de ductos. Ver detalle de planos	Unidad Medida Globa	1	1			0,00	0,00%	0,00%	0,00%
vigas con cajas metálicas de 43cmx33cm para paso de ductos. Ver detalle de planos	Unidad Medida Globa	1	1			0,00	0,00%	0,00%	0,00%
VEL									
	Metros cúbicos	17,5	17,5			0,00	0,00%	0,00%	0,00%
ra cajas de ascensor	Metros cúbicos	15,3	15,3			0,00	0,00%	0,00%	0,00%
cho	Metros cúbicos	27,5	27,5			0,00	0,00%	0,00%	0,00%
ho	Metros cúbicos	28,5	28,5			0,00	0,00%	0,00%	0,00%
	Metros cúbicos	3,5	3,5			0,00	0,00%	0,00%	0,00%
vigas con cajas metálicas de 78cmx33cm para paso de ductos. Ver detalle de planos	Unidad Medida Globa	1	1			0,00	0,00%	0,00%	0,00%
vigas con cajas metálicas de 43cmx33cm para paso de ductos. Ver detalle de planos	Unidad Medida Globa	1	1			0,00	0,00%	0,00%	0,00%
IVEL									

Osvaldo Aponte Rodríguez
Representante Legal
APONTE LATORRE S.A.
CONSTRUCTORA

ROBERTO VERA VIERCI
Ingeniero Civil

Arq. Javier Lorenzo Riveros
Técnico
Dpto. Obras y Proyectos - D.I.F.

RA									
pilares por aumento de sobrecargas para uso depositos undecimo nivel	Unidad Medida Global	1,00	0,40	0,40	0,00%	40,00%	40,00%		
PARA PERSONAS CON CAPACIDADES DIFERENTES EN ACCESO PLANTA BAJA									
de base para ascensor	Unidad Medida Global	1,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%			
a personas con capacidades diferentes, capacidad 150 kg	Unidad Medida Global	1,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%			
electrica para ascensor de personas con capacidades diferentes	Unidad Medida Global	1,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%			
DE LINEA DE MEDIA TENSION									
linea de Media Tension protegida	Unidad Medida Global	1,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%			
OS DE ILUMINACIÓN									
60 de embutir tecnologia LED	Unidad	719,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%			

Osvaldo Aponte Rodríguez
Representante Legal
APONTE LATORRE S.A.
CONSTRUCTORA

ROBERTO VERA VIERCI
Ingeniero Civil

Arq. Javier Lorenzo Riveros
Técnico
Dpto. Obras y Proyectos - D.I.F.

EDIFICIO TESTANOVA

Datos Contractuales

Contrato original ₲ 31.825.211.009

Fecha Inicio:	15-nov-23
Plazo	732
Finalización:	15-nov-25
AMPLIACION PLAZO	72
Finalización:	26-ene-26

		CONVENIO MODIFICATORIO 01				EJECUTADO			
Certificado de Obras		AVANCE PREVISTO %		CERTIFICACION PREVISTA		AVANCE EJECUTADO %		CERTIFICACION EJECUTADA	
N°	Mes	Mensual	Acumulado	Mensual	Acumulado	Mensual	Acumulado	Mensual	Acumulado
	15-nov-23		0,00%		0		0,00%		0
01	15-dic-23	0,57%	0,57%	182.637.176	182.637.176	1,66%	1,66%	528.250.500	528.250.500
02	15-ene-24	0,57%	1,15%	182.637.176	365.274.353	0,07%	1,73%	22.500.000	550.750.500
03	15-feb-24	0,57%	1,72%	182.637.176	547.911.529	0,28%	2,01%	90.000.000	640.750.500
04	15-mar-24	0,29%	2,01%	91.318.588	639.230.118	0,05%	2,06%	16.962.000	657.712.500
05	15-abr-24	0,07%	2,08%	21.797.500	661.027.618	0,26%	2,32%	83.300.001	741.012.501
PERIODO DE SUSPENSIÓN	26-jun-24	0,00%	2,08%	0	661.027.618	0,00%	2,32%	0	741.012.501
06	31-jul-24	1,66%	3,74%	529.131.374	1.190.158.992	1,76%	4,08%	559.263.965	1.300.276.466
07	31-ago-24	1,69%	5,43%	536.413.084	1.726.572.076	1,59%	5,67%	504.671.541	1.804.948.007
08	30-sept-24	1,75%	7,17%	555.549.082	2.282.121.158				
09	31-oct-24	1,36%	8,53%	432.826.676	2.714.947.833				
10	30-nov-24	1,46%	10,00%	466.235.589	3.181.183.422				
11	31-dic-24	2,40%	12,40%	764.656.733	3.945.840.155				
12	31-ene-25	2,26%	14,66%	718.426.591	4.664.266.747				
13	28-feb-25	2,38%	17,04%	757.165.158	5.421.431.905				
14	31-mar-25	2,38%	19,41%	757.165.158	6.178.597.063				
15	30-abr-25	2,47%	21,88%	786.071.716	6.964.668.778				
16	31-may-25	4,12%	26,01%	1.311.908.019	8.276.576.798				
17	30-jun-25	7,63%	33,64%	2.429.435.549	10.706.012.346				
18	31-jul-25	8,04%	41,68%	2.559.462.753	13.265.475.099				
19	31-ago-25	8,69%	50,37%	2.764.266.544	16.029.741.643				
20	30-sept-25	9,76%	60,13%	3.105.886.244	19.135.627.887				
21	31-oct-25	10,50%	70,63%	3.341.163.687	22.476.791.574				
22	30-nov-25	11,46%	82,09%	3.648.005.654	26.124.797.228				
23	31-dic-25	11,33%	93,41%	3.604.209.234	29.729.006.462				
24	26-ene-26	6,59%	100,00%	2.096.204.547	31.825.211.009				
SUMATORIA		100,00%		31.825.211.009		5,67%		1.804.948.007	

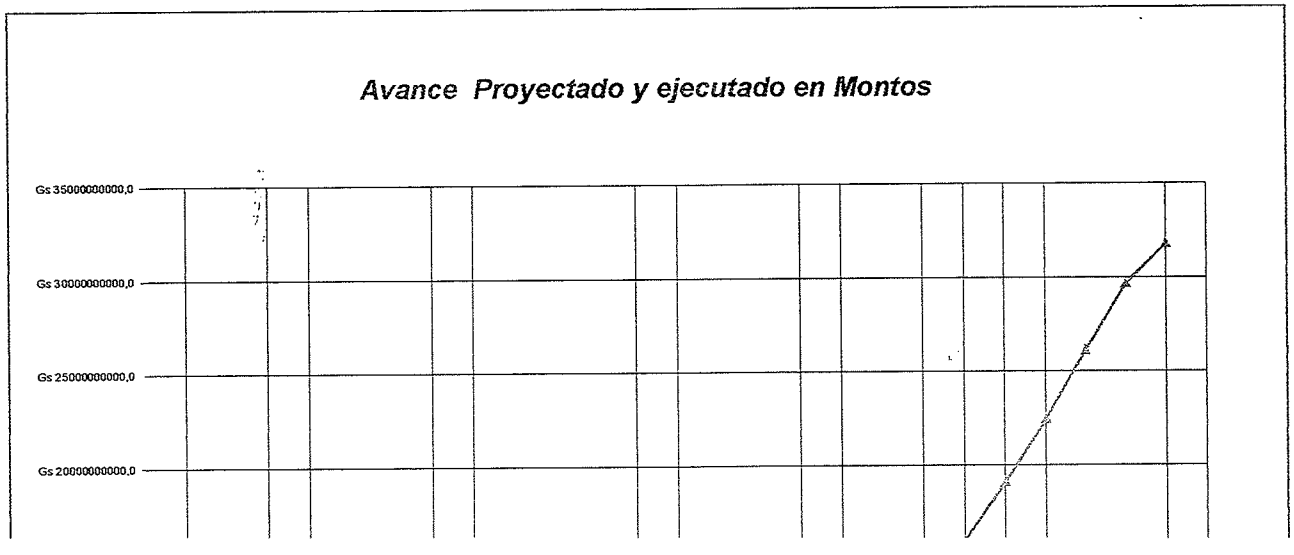

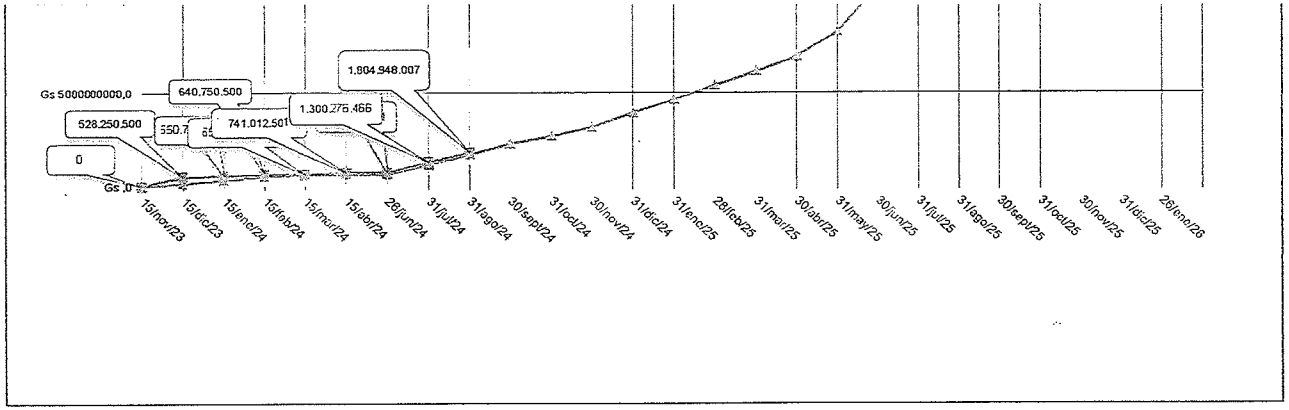

Avance Proyectado y Ejecutado en Porcentajes

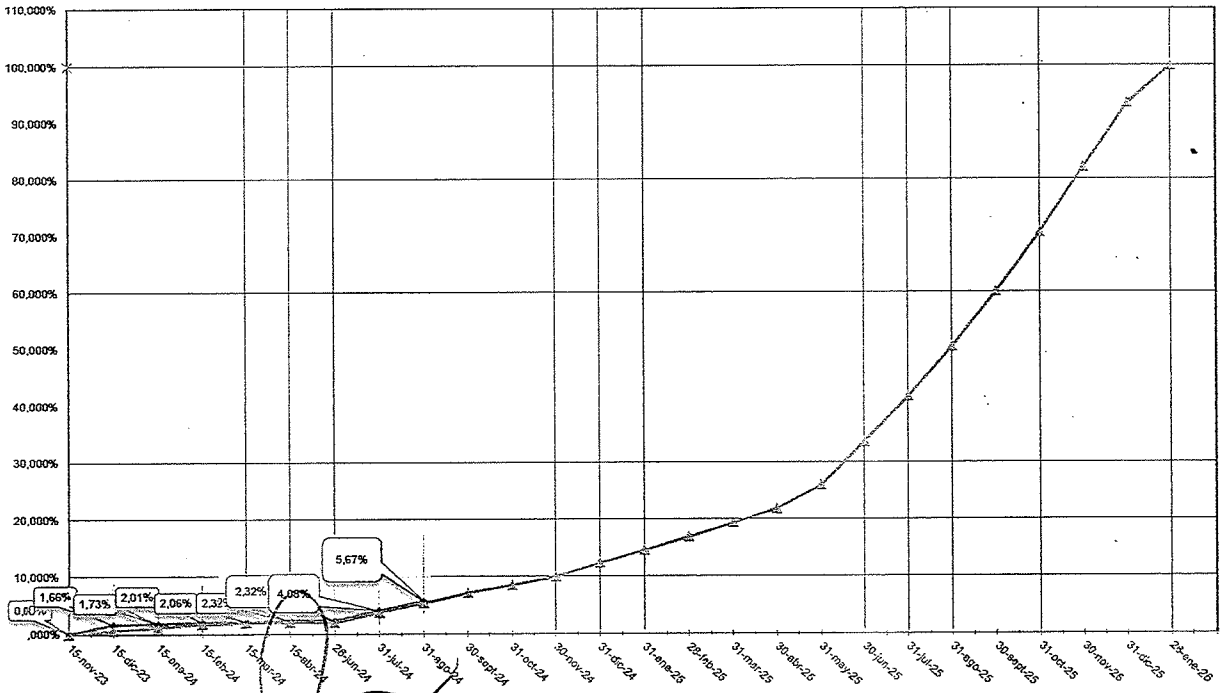

ROBERTO VERA VIERCI
Ingeniero Civil

Ing. Osvaldo Aponte Rodríguez
Representante Legal

APONTE LATORRE S.A.
CONSTRUCTORA

EDIFICIO TESTANOVA

CRONOGRAMA DE OBRA - CONVENIO MODIFICATORIO 01 Rev 05RVV

Aponte Latorre S.A.

Item	Descripción	15 NOV 23 - 15 DIC 23				16 DIC 23 - 15 ENE 24				16 ENE 24 - 15 FEB 24				16 FEB 24 - 1	
	EDIFICIO TESTANOVA														
1	TRABAJOS PRELIMINARES	45,7	45,7	45,7	45,7	45,7	45,7	45,7	45,7	45,7	45,7	45,7	45,7	45,7	45,7
2	MOVIMIENTO DE SUELO														
	PERIODO FIRMA DE CONVENIO MODIF. 01														
	PERIODO DE SUSPENSION DE PLAZO														
3	CIMENTACIONES														
4	ESTRUCTURA DE HORMIGÓN ARMADO														
5	MAMPOSTERÍA														
6	CUBIERTA														
7	AISLACIONES														
8	REVOQUES														
9	CONTRAPISO														
10	PISOS														
11	ZÓCALOS														
12	REVESTIMIENTOS														
13	CARPINTERÍA DE MADERA														
14	CARPINTERÍA METÁLICA														
15	CARPINTERÍA DE ALUMINIO														
16	MAMPARAS Y TABIQUES														
17	CIELORRASO														
18	PINTURAS														
19	CRISTALES														
20	INSTALACIÓN DE DESAGUE CLOACAL														
21	INSTALACIÓN DE AGUA CORRIENTE														
22	ARTEFACTOS SANITARIOS Y ACCESORIOS														
23	INSTALACIÓN DE DESAGUE PLUVIAL														
24	INSTALACIÓN ELÉCTRICA														
25	INSTALACIONES ESPECIALES														
26	VARIOS														
27	POZO ARTESIANO														
28	AIRE ACONDICIONADO														
29	VENTILACIÓN FORZADA														
30	MATERIALES,MONTAJE Y PUESTA EN MARCHA														
31	SEGURIDAD ELECTRÓNICA Y COMUNICACIÓN ORAL														
32	SISTEMA DE ALARMA CONTRA INTRUSOS														
33	CONTROL DE ACCESOS CON TARJETAS DE PROXIMIDAD														
34	CIRCUITO CERRADO DE VIDEO (CCTV)														
35	COMUNICACIÓN ORAL Y MÚSICA FUNCIONAL														
36	SONORIZACIÓN DE LAS SALAS DE ADIESTRAMIENTO														
37	SISTEMA DE TELEFONÍA														
38	RED DE DATOS														
39	GENERADOR DE EMERGENCIA														
40	ASCENSORES														
41	GENERAL														
	AVANCE PREVISTO														
	Total Previsto del Periodo	182.637.176				182.637.176				182.637.176					
	Total Previsto Acumulado	182.637.176				365.274.353				547.911.529					
	% Previsto del Periodo	0,57%				0,57%				0,57%				0,29	
	% Previsto Acumulado	0,57%				1,15%				1,72%				2,01	
	AVANCE EJECUTADO														
	Total Ejecutado del Periodo	528.250.500				22.500.000				90.000.000					
	Total Ejecutado Acumulado	528.250.500				550.750.500				640.750.500					
	% Ejecutado del Periodo	1,66%				0,07%				0,28%				0,05	
	% Ejecutado Acumulado	1,66%				1,73%				2,01%				2,06	

16 MAR 24 - 15 ABR 24	16 ABR 24 - 15 MAY 24	16 MAY 24 - 15 JUN 24	16 JUN 24- 26 JUN 24
10,9 10,9			
21.797.500	-	-	-
661.027.618	661.027.618	661.027.618	661.027.618
0,07%	0,00%	0,00%	0,00%
2,08%	2,08%	2,08%	2,08%
83.300.001	-	-	-
741.012.501	741.012.501	741.012.501	741.012.501
0,26%	0,00%	0,00%	0,00%
2,32%	2,32%	2,32%	2,32%

ROBERTO VERA VIERCI
Ingeniero Civil

Ing. Osvaldo Aponte Rodríguez
Representante Legal
APONTE LATORRE S.A.
CONSTRUCTORA

EDIFICIO TESTANOVA

CRONOGRAMA DE OBRA - CONVENIO M

Aponte Latorre S.A.

Item	Descripción	27 JUN 24 - 31 JUL 24				01 AGO 24 - 31 AGO 24				01 SET 24 - 30 SET 24				01 OCT 24 -	
	EDIFICIO TESTANOVA														
1	TRABAJOS PRELIMINARES					45,7	45,7	45,7							
2	MOVIMIENTO DE SUELO	60,3	60,3	60,3	60,3	48,2	48,2	48,2	48,2	48,2	48,2	48,2	48,2		
	PERIODO FIRMA DE CONVENIO MODIF. 01														
	PERIODO DE SUSPENSION DE PLAZO														
3	CIMENTACIONES	61,1	61,1	61,1	61,1	40,7	40,7	40,7	40,7	40,7	40,7	40,7	40,7		
4	ESTRUCTURA DE HORMIGÓN ARMADO											99,9	99,9	99,9	99,9
5	MAMPOSTERÍA														
6	CUBIERTA														
7	AISLACIONES														
8	REVOQUES														
9	CONTRAPISO														
10	PISOS														
	ZÓCALOS														
	REVESTIMIENTOS														
13	CARPINTERÍA DE MADERA														
14	CARPINTERÍA METÁLICA														
15	CARPINTERÍA DE ALUMINIO														
16	MAMPARAS Y TABIQUES														
17	CIELORRASO														
18	PINTURAS														
19	CRISTALES														
20	INSTALACIÓN DE DESAGUE CLOACAL														
21	INSTALACIÓN DE AGUA CORRIENTE														
22	ARTEFACTOS SANITARIOS Y ACCESORIOS														
23	INSTALACIÓN DE DESAGUE PLUVIAL														
24	INSTALACIÓN ELÉCTRICA														
25	INSTALACIONES ESPECIALES														
26	VARIOS														
27	POZO ARTESIANO	10,9	10,9	10,9	10,9	10,9	10,9	10,9	10,9						
28	AIRE ACONDICIONADO														
29	VENTILACIÓN FORZADA														
30	MATERIALES,MONTAJE Y PUESTA EN MARCHA														
31	SEGURIDAD ELECTRÓNICA Y COMUNICACIÓN OF														
	SISTEMA DE ALARMA CONTRA INTRUSOS														
33	CONTROL DE ACCESOS CON TARJETAS DE PROXI														
34	CIRCUITO CERRADO DE VIDEO (CCTV)														
35	COMUNICACIÓN ORAL Y MÚSICA FUNCIONAL														
36	SONORIZACIÓN DE LAS SALAS DE ADIESTRAMIEN														
37	SISTEMA DE TELEFONÍA														
38	RED DE DATOS														
39	GENERADOR DE EMERGENCIA														
40	ASCENSORES														
41	GENERAL														
	AVANCE PREVISTO														
	Total Previsto del Periodo				529.131.374				536.413.084				555.549.082		
	Total Previsto Acumulado				1.190.158.992				1.726.572.076				2.282.121.158		
	% Previsto del Periodo				1,66%				1,69%				1,75%		
	% Previsto Acumulado				3,74%				5,43%				7,17%		
	AVANCE EJECUTADO														
	Total Ejecutado del Periodo				559.263.965				504.671.541						
	Total Ejecutado Acumulado				1.300.276.466				1.804.948.007						
	% Ejecutado del Periodo				1,76%				1,59%						
	% Ejecutado Acumulado				4,08%				5,67%						

01 NOV 24 - 30 NOV 24				01 DIC 24 - 31 DIC 24				01 ENE 24 - 31 ENE 25				01 FEB 25 - 28 FEB 25			
				48,2	48,2										
				40,7	40,7	40,7	40,7								
99,9	99,9	99,9	99,9	99,9	99,9	99,9	99,9	99,9	99,9	99,9	99,9	99,9	99,9	99,9	99,9
						19,5	19,5	19,5	19,5	19,5	19,5	19,5	19,5	19,5	19,5
												7,7	7,7	7,7	7,7

EDIFICIO TESTANOVA

CRONOGRAMA DE OBRA - CONVENIO M

Aponte Latorre S.A.

Item	Descripción	01 MAR 25 - 31 MAR 25				01 ABR 25 - 30 ABR 25				01 MAY 25 - 31 MAY 25				01 JUN 25 - 3	
	EDIFICIO TESTANOVA														
1	TRABAJOS PRELIMINARES														
2	MOVIMIENTO DE SUELO														
	PERIODO FIRMA DE CONVENIO MODIF. 01														
	PERIODO DE SUSPENSION DE PLAZO														
3	CIMENTACIONES	99,9	99,9	99,9	99,9	99,9	99,9	99,9	99,9	99,9	99,9	99,9	99,9	99,9	99,9
4	ESTRUCTURA DE HORMIGÓN ARMADO	19,5	19,5	19,5	19,5	19,5	19,5	19,5	19,5	19,5	19,5	19,5	19,5	19,5	19,5
5	MAMPOSTERÍA														
6	CUBIERTA	7,7	7,7	7,7	7,7	7,7	7,7	7,7	7,7	7,7	7,7	7,7	7,7	7,7	7,7
7	AISLACIONES									20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0
8	REVOQUES											7,3	7,3	7,3	7,3
9	CONTRAPISO														
10	PISOS														
	ZÓCALOS														
	REVESTIMIENTOS									5,3	5,3	5,3	5,3	5,3	5,3
13	CARPINTERÍA DE MADERA														
14	CARPINTERÍA METÁLICA									71,0	71,0	71,0	71,0	71,0	71,0
15	CARPINTERÍA DE ALUMINIO														
16	MAMPARAS Y TABIQUES														
17	CIELORRASO														
18	PINTURAS											48,5	48,5	48,5	48,5
19	CRISTALES														
20	INSTALACIÓN DE DESAGUE CLOACAL	4,2	4,2	4,2	4,2	4,2	4,2	4,2	4,2	4,2	4,2	4,2	4,2	4,2	4,2
21	INSTALACIÓN DE AGUA CORRIENTE	5,9	5,9	5,9	5,9	5,9	5,9	5,9	5,9	5,9	5,9	5,9	5,9	5,9	5,9
22	ARTEFACTOS SANITARIOS Y ACCESORIOS														
23	INSTALACIÓN DE DESAGUE PLUVIAL														
24	INSTALACIÓN ELÉCTRICA	16,7	16,7	16,7	16,7	16,7	16,7	16,7	16,7	16,7	16,7	16,7	16,7	50,1	50,1
25	INSTALACIONES ESPECIALES							14,5	14,5	14,5	14,5	14,5	14,5	14,5	14,5
26	VARIOS														
27	POZO ARTESIANO													113,8	113,8
28	AIRE ACONDICIONADO														
29	VENTILACIÓN FORZADA													90,3	90,3
30	MATERIALES,MONTAJE Y PUESTA EN MARCHA														
31	SEGURIDAD ELECTRÓNICA Y COMUNICACIÓN OF														
	SISTEMA DE ALARMA CONTRA INTRUSOS														
33	CONTROL DE ACCESOS CON TARJETAS DE PROXI														
34	CIRCUITO CERRADO DE VIDEO (CCTV)														
35	COMUNICACIÓN ORAL Y MÚSICA FUNCIONAL														
36	SONORIZACIÓN DE LAS SALAS DE ADIESTRAMIEN														
37	SISTEMA DE TELEFONÍA														
38	RED DE DATOS														
39	GENERADOR DE EMERGENCIA														
40	ASCENSORES	22,2	22,2	22,2	22,2	22,2	22,2	22,2	22,2	22,2	22,2	22,2	22,2	22,2	22,2
41	GENERAL	13,2	13,2	13,2	13,2	13,2	13,2	13,2	13,2	13,2	13,2	13,2	13,2	13,2	13,2
	AVANCE PREVISTO														
	Total Previsto del Periodo	757.165.158				786.071.716				1.311.908.019					
	Total Previsto Acumulado	6.178.597.063				6.964.668.778				8.276.576.798					
	% Previsto del Periodo	2,38%				2,47%				4,12%					7,
	% Previsto Acumulado	19,41%				21,88%				26,01%					33
	AVANCE EJECUTADO														
	Total Ejecutado del Periodo														
	Total Ejecutado Acumulado														
	% Ejecutado del Periodo														
	% Ejecutado Acumulado														

01 JUL 25 - 31 JUL 25				01 AGO 25 - 31 AGO 25				01 SET 25 - 30 SET 25				01 OCT 25 - 31 OCT 25			
99,9	99,9	99,9	99,9	99,9	99,9	99,9	99,9	99,9	99,9	99,9	99,9				
19,5	19,5	19,5	19,5	19,5	19,5	19,5	19,5	19,5	19,5	19,5	19,5	19,5	19,5	19,5	19,5
								22,6	22,6	22,6	22,6	22,6	22,6		
7,7	7,7	7,7	7,7	7,7	7,7	7,7	7,7	7,7	7,7	7,7	7,7	7,7	7,7	7,7	7,7
20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0
7,3	7,3	7,3	7,3	7,3	7,3	7,3	7,3	7,3	7,3	7,3	7,3	7,3	7,3	7,3	7,3
28,1	28,1	28,1	28,1	28,1	28,1	28,1	28,1	28,1	28,1	28,1	28,1	28,1	28,1	28,1	28,1
		3,4	3,4	3,4	3,4	3,4	3,4	3,4	3,4	3,4	3,4	3,4	3,4	3,4	3,4
				14,1	14,1	14,1	14,1	14,1	14,1	14,1	14,1	14,1	14,1	14,1	14,1
5,3	5,3	5,3	5,3	5,3	5,3	5,3	5,3	5,3	5,3	5,3	5,3	5,3	5,3	5,3	5,3
												15,7	15,7	15,7	15,7
71,0	71,0	71,0	71,0	71,0	71,0	71,0	71,0	71,0	71,0	71,0	71,0	71,0	71,0	71,0	71,0
		33,6	33,6	33,6	33,6	33,6	33,6	33,6	33,6	33,6	33,6	33,6	33,6	33,6	33,6
						29,8	29,8	29,8	29,8	29,8	29,8	29,8	29,8	29,8	29,8
								19,0	19,0	19,0	19,0	19,0	19,0	19,0	19,0
48,5	48,5	48,5	48,5	48,5	48,5	48,5	48,5	48,5	48,5	48,5	48,5	48,5	48,5	48,5	48,5
4,2	4,2	4,2	4,2	4,2	4,2	4,2	4,2	4,2	4,2	4,2	4,2	4,2	4,2	4,2	4,2
5,9	5,9	5,9	5,9	5,9	5,9	5,9	5,9	5,9	5,9	5,9	5,9	5,9	5,9	5,9	5,9
				3,7	3,7	3,7	3,7	3,7	3,7	3,7	3,7	3,7	3,7	3,7	3,7
50,1	50,1	50,1	50,1	50,1	50,1	50,1	50,1	50,1	50,1	50,1	50,1	50,1	50,1	50,1	50,1
14,5	14,5	14,5	14,5	14,5	14,5	14,5	14,5	43,4	43,4	43,4	43,4	43,4	43,4	43,4	43,4
113,8	113,8	113,8	113,8	113,8	113,8	113,8	113,8	113,8	113,8	113,8	113,8	113,8	113,8	113,8	113,8
												13,8	13,8	13,8	13,8
90,3	90,3	90,3	90,3	90,3	90,3	90,3	90,3	90,3	90,3	90,3	90,3	90,3	90,3	90,3	90,3
												41,2	41,2	41,2	41,2
														6,4	6,4
												71,6	71,6	71,6	71,6
												24,5	24,5	24,5	24,5
22,2	22,2	22,2	22,2	22,2	22,2	22,2	22,2	22,2	22,2	22,2	22,2	22,2	22,2	22,2	22,2
13,2	13,2	13,2	13,2	13,2	13,2	13,2	13,2	13,2	13,2	13,2	13,2	13,2	13,2	13,2	13,2
2.559.462.753				2.764.266.544				3.105.886.244				3.341.163.687			
13.265.475.099				16.029.741.643				19.135.627.887				22.476.791.574			
8,04%				8,69%				9,76%				10,50%			
41,68%				50,37%				60,13%				70,63%			

Ing. Osvaldo Aponte Rodríguez
Representante Legal
APONTE LATORRE S.A.
CONSTRUCTORA

ROBERTO VERA VIERCI
Ingeniero Civil

EDIFICIO TESTANOVA

CRONOGRAMA DE OBRA - CONVENIO M

Aponte Latorre S.A.

Fin
26/1/2026

Descripción	01 NOV 25 - 30 NOV 25				01 DIC 25- 31 DIC 25				01 ENE 26- 26 ENE 26				MONTO
EDIFICIO TESTANOVA													776.208.000
TRABAJOS PRELIMINARES													723.358.927
MOVIMIENTO DE SUELO													
PERIODO FIRMA DE CONVENIO MODIF. 01													
PERIODO DE SUSPENSIÓN DE PLAZO													733.250.193
CIMENTACIONES													4.992.722.028
ESTRUCTURA DE HORMIGÓN ARMADO													819.604.788
MAMPOSTERÍA													135.729.259
CUBIERTA													292.088.844
AISLACIONES	7,7	7,7											559.070.548
REVOQUES	20,0	20,0	20,0	20,0									203.947.532
CONTRAPISO	7,3	7,3	7,3	7,3	7,3	7,3							729.607.356
PISOS	28,1	28,1	28,1	28,1	28,1	28,1	28,1	28,1					74.371.674
ZÓCALOS	3,4	3,4	3,4	3,4	3,4	3,4	3,4	3,4					281.606.056
REVESTIMIENTOS	14,1	14,1	14,1	14,1	14,1	14,1	14,1	14,1					170.212.500
CARPINTERÍA DE MADERA	5,3	5,3	5,3	5,3	5,3	5,3	5,3	5,3					188.850.406
CARPINTERÍA METÁLICA	15,7	15,7	15,7	15,7	15,7	15,7	15,7	15,7					2.273.407.500
CARPINTERÍA DE ALUMINIO	71,0	71,0	71,0	71,0	71,0	71,0	71,0	71,0					805.710.000
MAMPARAS Y TABIQUES	33,6	33,6	33,6	33,6	33,6	33,6	33,6	33,6	33,6	33,6			596.108.625
CIELORRASO	29,8	29,8	29,8	29,8	29,8	29,8	29,8	29,8	29,8	29,8			379.482.175
PINTURAS	19,0	19,0	19,0	19,0	19,0	19,0	19,0	19,0	19,0	19,0	19,0	19,0	1.552.677.500
CRISTALES	48,5	48,5	48,5	48,5	48,5	48,5	48,5	48,5	48,5	48,5			194.789.368
INSTALACIÓN DE DESAGUE CLOACAL	4,2	4,2	4,2	4,2	4,2	4,2	4,2	4,2	4,2	4,2			293.830.901
INSTALACIÓN DE AGUA CORRIENTE	5,9	5,9	5,9	5,9	5,9	5,9	5,9	5,9	5,9	5,9			229.703.249
ARTEFACTOS SANITARIOS Y ACCESORIOS	23,0	23,0	23,0	23,0	23,0	23,0	23,0	23,0	23,0	23,0			59.872.624
INSTALACIÓN DE DESAGUE PLUVIAL	3,7	3,7	3,7	3,7									2.004.534.803
INSTALACIÓN ELÉCTRICA	50,1	50,1	50,1	50,1	50,1	50,1	50,1	50,1	50,1	50,1			1.040.636.074
INSTALACIONES ESPECIALES	43,4	43,4	43,4	43,4	43,4	43,4	43,4	43,4	43,4	43,4			111.965.829
VARIOS									28,0	28,0	28,0	28,0	108.987.501
POZO ARTESIANO													3.413.118.165
AIRE ACONDICIONADO	113,8	113,8	113,8	113,8	113,8	113,8	113,8	113,8	113,8	113,8			193.231.750
VENTILACIÓN FORZADA	13,8	13,8	13,8	13,8	13,8	13,8	13,8	13,8	13,8	13,8			2.708.068.401
MATERIALES,MONTAJE Y PUESTA EN MARCHA	90,3	90,3	90,3	90,3	90,3	90,3	90,3	90,3	90,3	90,3			659.418.750
SEGURIDAD ELECTRÓNICA Y COMUNICACIÓN OF	41,2	41,2	41,2	41,2	41,2	41,2	41,2	41,2	41,2	41,2	41,2	41,2	89.975.000
SISTEMA DE ALARMA CONTRA INTRUSOS	6,4	6,4	6,4	6,4	6,4	6,4	6,4	6,4	6,4	6,4	6,4	6,4	42.237.500
CONTROL DE ACCESOS CON TARJETAS DE PROXI					5,3	5,3	5,3	5,3	5,3	5,3	5,3	5,3	209.437.500
CIRCUITO CERRADO DE VIDEO (CCTV)					26,2	26,2	26,2	26,2	26,2	26,2	26,2	26,2	107.387.500
COMUNICACIÓN ORAL Y MÚSICA FUNCIONAL			10,7	10,7	10,7	10,7	10,7	10,7	10,7	10,7	10,7	10,7	154.437.500
SONORIZACIÓN DE LAS SALAS DE ADIESTRAMIEN			15,4	15,4	15,4	15,4	15,4	15,4	15,4	15,4	15,4	15,4	865.247.637
SISTEMA DE TELEFONÍA	72,1	72,1	72,1	72,1	72,1	72,1	72,1	72,1	72,1	72,1	72,1	72,1	1.144.833.300
RED DE DATOS	71,6	71,6	71,6	71,6	71,6	71,6	71,6	71,6	71,6	71,6	71,6	71,6	391.450.000
GENERADOR DE EMERGENCIA	24,5	24,5	24,5	24,5	24,5	24,5	24,5	24,5					933.625.000
ASCENSORES	22,2	22,2	22,2	22,2	22,2	22,2							580.408.746
GENERAL	13,2	13,2	13,2	13,2									
													31.825.211.009
AVANCE PREVISTO													
Total Previsto del Periodo	3.648.005.654				3.604.209.234				2.096.204.547				
Total Previsto Acumulado	26.124.797.228				29.729.006.462				31.825.211.009				
% Previsto del Periodo	11,46%				11,33%				6,59%				
% Previsto Acumulado	82,09%				93,41%				100,00%				

ROBERTO VE
