CONSORCIO PLUVIAL ABASTO

Defensa Nacional N° 2530, Predios del Yacht

Lambaré, Paraguay

RUC: 80139421

Teléfono: +595 21 905 652 // +595 21 900 800

Código Postal 110726

chavesconstrucciones@chaves.com.py

MUNICIPALIDAD DE ASUNCIÓN

Dirección General de Obras

Fiscalización

MUNICIPALIDAD DE ASUNCION

Obra: DESAGUE PLUVIAL DEL MERCADO DE ABASTO

- CUENCA ITAY Y LAMBARE ID: 421414 LOTE Nº 1

Contrato UOC3 N° 09/2022

Monto del Contrato Gs.: 71.393.978.785

Certificado Nº: 1 (Uno).-

% Ejecutado Mensual:	0,01%
% Ejecutado Acumulado:	0,01%

Nº DE ITEM	DESCRIPCION	UN	CANTIDADES				MONTOS EN GUARANIES			
			ESTIMADAS CONTRACTUALES	CERTIFICADOS			PRECIO UNITARIO	ACUMULADO ANTERIOR	PRESENTE CERTIFICADO	ACUMULADO A LA FECHA
				ANTERIORES	PRESENTE	ACUMULADO				
1	Provisión y colocación de tubo Hº Ø0,80m para conexiones e/ sumidero y registro	m	1792				814.382			
2	Provisión y colocación de alcantarilla celular simple ACS 1,0x1,0m	m	2216				2.143.284			
3	Provisión y colocación de alcantarilla celular simple ACS 1,5x1,5m	m	673				3.071.844			
4	Provisión y colocación de alcantarilla celular simple ACS 2,0x2,0m	m	215				3.932.342			
5	Provisión y colocación de alcantarilla celular simple ACS 2,5x2,5m	m	165				6.025.571			
6	Provisión y colocación de alcantarilla celular doble ACD 2,0x2,0m	m	716				6.875.741			
7	Provisión y colocación de alcantarilla celular doble ACD 2,5x2,5m	m	595				8.710.483			
8	Estructura de HºAº Fck=260Kg/cm2 armaduras 160 Kg/m3 (para registros pluviales de HºAº)	m3	2175				3.561.698			
9	Sumideros con rejillas de 2 bocas SM2	un	66				13.936.225			
10	Sumideros con rejillas de 3 bocas SM3	un	34				18.855.709			
11	Sumideros con rejillas de 4 bocas SM4	un	10				27.065.094			
12	Sumideros transversales	m	63				6.832.048			
13	Excavación (sector de alcantarillas, sumideros, registros)	m3	84857				10.660			
14	Excavación (para pavimento)	m3	9162				10.660			
15	Entibado	m2	16709				65.732			
16	Relleno compactado con destape de cantera	m3	45697				152.057			
17	Colchón de arena lavada e=0,15m	m3	2723				88.471			
18	Hº simple Fck=150 kg/cm2 (e=0,10m)	m3	1912				849.519			
19	Retiro de material excedente y limpieza del sitio de obra (MOVIMIENTO DE SUELOS)	m3	128044				43.099			
20	Remoción de pavimento asfáltico	m2	23760				17.822			
21	Remoción de pavimento de hormigón hidráulico	m2	833				44.557			
22	Remoción y reposición de adoquines	m2	500				121.403			
23	Remoción de pavimento tipo empedrado	m2	42392				10.659			
24	Pavimento tipo empedrado	m2	200				82.206			
25	Compactación de base para pavimento (sector fuera de las tuberías)	m2	20359				12.698			
26	Base Telford - e=0,30m	m2	42565				75.698			
27	Riego de liga	l	28328				7.649			
28	Regularización asfáltica (Tasa 60 kg/m2)	tn	2594				751.609			
29	Regularización asfáltica (Tasa 50 kg/m2) (Av. Eusebio Ayala)	tn	123				751.609			
30	Carpeta con hormigón asfáltico en caliente (Tasa 120 Kg/m2) (Av. Eusebio Ayala)	tn	247				751.609			

4857 - ---

36 (Treinta y Seis)

Ing. Diego Mazzuoccolo
Fiscal de Obras
Municipalidad de Asunción
Fiscalización
MUNICIPALIDAD DE ASUNCION

CONSORCIO PLUVIAL ABASTO

Defensa Nacional N° 2530, Predios del Yacht
Lambaré, Paraguay
RUC: 80139421
Teléfono: +595 21 905 652 // +595 21 900 800
Código Postal 110726
chavesconstrucciones@chaves.com.py

MUNICIPALIDAD DE ASUNCIÓN

Dirección General de Obras

Fiscalización
MUNICIPALIDAD DE ASUNCION

Obra: DESAGUE PLUVIAL DEL MERCADO DE ABASTO
- CUENCA ITAY Y LAMBARE ID: 421414 LOTE Nº 1
Contrato UOC3 N° 09/2022
Monto del Contrato Gs.: 71.393.978.785

Certificado Nº: 1 (Uno).-

% Ejecutado Mensual:	0,01%
% Ejecutado Acumulado:	0,01%

Nº DE ITEM	DESCRIPCION	UN	CANTIDADES				MONTOS EN GUARANIES			
			ESTIMADAS CONTRACTUALES	CERTIFICADOS			PRECIO UNITARIO	ACUMULADO ANTERIOR	PRESENTE CERTIFICADO	ACUMULADO A LA FECHA
				ANTERIORES	PRESENTE	ACUMULADO				
31	Carpeta con hormigón asfáltico en caliente (Tasa 100 Kg/m2) (interior del Mercado de Abasto)	tn	195				751.609			
32	Pavimento de hormigón hidráulico con aditivo de alta dureza inicial e=0,15m Fck=260Kg/cm2	m2	37151				191.176			
33	Vigas de borde 25x40cm - 4Ø12 - est Ø8-12/20-120 Fck=260Kg/cm2	m	529				194.779			
34	Cunetas de hormigón hidráulico con aditivo de alta dureza inicial A=0,60m e=0,12m Fck=260Kg/cm2	m	9024				98.069			
35	Remoción y reposición con nuevos cordones prefabricados de Hº (reemplazo de todos los cordones)	m	9024				64.895			
36	Remoción y reposición de vereda con contrapiso (sumideros)	m2	830				119.466			
37	Demolición de estructura de HºAº (red Avda E. Ayala)	m3	105				101.841			
38	Señalización horizontal	m2	2160				152.194			
39	Señalización vertical	un	92				1.531.696			
40	Remoción y reposición de vereda con contrapiso (red de agua potable)	m2	9528				119.466			
41	Excavación manual (a=0,40m)	m3	3005				41.820			
42	Asiento y relleno de material arenoso (e=0,10m)	m3	476				88.471			
43	Relleno y compactación con suelo del lugar	m3	2529				45.096			
44	Provisión y colocación de tuberías plásticas de diametro 2	m	4581				32.923			
45	Provisión y colocación de tuberías plásticas de diametro 4	m	4581				97.490			
46	Provisión y colocación de tuberías plásticas de diametro 3/4 (ramales domiciliarios)	m	2748				12.835			
47	Válvulas 2	un	46				1.646.216			
48	Válvulas 4	un	46				2.606.623			
49	Prueba hidráulica en tuberías plásticas de agua potable	m	11910				6.498			
50	Retiro de material excedente y limpieza del sitio de obra (RED DE AGUA POTABLE)	m3	1096				43.099			
51	Remoción y reposición de vereda con contrapiso (red de desague cloacal)	m2	3298				119.466			
52	Excavación	m3	21217				10.660			
53	Provisión y colocación de tuberías plásticas de Ø 150mm	m	9161				59.080			
54	Provisión y colocación de tuberías plásticas de Ø 200mm	m	3054				114.959			
55	Provisión y colocación de tuberías plásticas de Ø 250mm	m	3054				173.764			
56	Provisión y colocación de tuberías plásticas de Ø 300mm	m	3054				294.433			
57	Provisión y colocación de tuberías plásticas de Ø 100mm (ramales domiciliarios)	m	5497				59.466			
58	Asiento y relleno de material arenoso	m3	1896				88.471			
59	Relleno y compactación con suelo del lugar	m3	18654				45.096			
60	Registro con tapa triangular de HºFº de 130Kg	un	174				8.385.808			

4857

Ing. Diego Vázquez
Fiscal de Obras
Municipalidad de Asunción

CONSORCIO PLUVIAL ABASTO

Fiscalización
MUNICIPALIDAD DE ASUNCION

37 (Treinta y Siete)

CONSORCIO PLUVIAL ABASTO Defensa Nacional N° 2530, Predios del Yacht Lambaré, Paraguay RUC: 80139421 Teléfono: +595 21 905 652 // +595 21 900 800 Código Postal 110726 chavesconstrucciones@chaves.com.py	**MUNICIPALIDAD DE ASUNCIÓN** Obra: DESAGUE PLUVIAL DEL MERCADO DE ABASTO - CUENCA ITAY Y LAMBARE ID: 421414 LOTE Nº 1 Contrato UOC3 N° 09/2022 Monto del Contrato Gs.: 71.393.978.785	Dirección General de Obras Fiscalización MUNICIPALIDAD DE ASUNCION **Certificado Nº: 1 (Uno).-** % Ejecutado Mensual: 0,01% % Ejecutado Acumulado: 0,01%

Nº DE ITEM	DESCRIPCION	UN	CANTIDADES				MONTOS EN GUARANIES			
			ESTIMADAS	CERTIFICADOS			PRECIO	ACUMULADO	PRESENTE	ACUMULADO
			CONTRACTUALES	ANTERIORES	PRESENTE	ACUMULADO	UNITARIO	ANTERIOR	CERTIFICADO	A LA FECHA
61	Prueba hidráulica en tuberías plásticas de desagüe cloacal	m	23819				6.498			
62	Retiro de material excedente y limpieza del sitio de obra (RED DE DESAGUE CLOACAL)	m3	3332				43.099			
63	Cartel de obra de 3,00x1,50m	un	2		2,00	2,00	2.660.128		5.320.256	5.320.256
	TOTALES								5.320.256	5.320.256
	Adoptado Monto del Presente Certificado: Acumulado Presente menos Acumulado Anterior = 5.320.256 - 0 =								5.320.256	

CONSORCIO PLUVIAL ABASTO

Ing. Diego Vázquez
Fiscal de Obras
MUNICIPALIDAD DE ASUNCION

Fiscalización
MUNICIPALIDAD DE ASUNCION

4857

38 (Treinta y Ocho)

CONSORCIO PLUVIAL ABASTO Defensa Nacional Nº 2530, Predios del Yacht Lambaré, Paraguay RUC: 80139421 Teléfono: +595 21 905 652 // +595 21 900 800 Código Postal 110726 chavesconstrucciones@chaves.com.py	**MUNICIPALIDAD DE ASUNCIÓN** **Obra: DESAGUE PLUVIAL DEL MERCADO DE ABASTO - CUENCA ITAY Y LAMBARE ID: 421414 LOTE Nº 1** **Contrato UOC3 N° 09/2022** **Monto del Contrato Gs.: 71.393.978.785**	Dirección General de Obras Fiscalización MUNICIPALIDAD DE ASUNCION **Certificado Nº: 1 (Uno).-** % Ejecutado Mensual: 0,01% % Ejecutado Acumulado: 0,01%

A. MONTO DE LOS TRABAJOS DEL MES		GUARANIES
A.1.	MONTO DE LOS TRABAJOS ACUMULADOS AL PRESENTE CERTIFICADO	5.320.256
A.2.	MONTO DE LOS TRABAJOS ACUMULADOS AL CERTIFICADO ANTERIOR	
A.3.	**MONTO DE LOS TRABAJOS DEL PRESENTE CERTIFICADO**	**5.320.256**
Son GUARANIES: Cinco Millones Trescientos Veinte Mil Doscientos Cincuenta y Seis , IVA Incluido.—		

B. DETALLE DE LA FACTURA		GUARANIES	
B.1.	MONTO DE LOS TRABAJOS DEL MES	A.3.	5.320.256
B.2.	AJUSTE DE COSTOS DEL PRESENTE MES		
B.3.	DEVOLUCION DE ANTICIPO	B.1. x 20%	1.064.051
B.4.	**MONTO DE LA FACTURA, IVA INCLUIDO**	**B.1. + B.2. - B.3.**	**4.256.205**
Son GUARANIES: Cuatro Millones Doscientos Cincuenta y Seis Mil Doscientos Cinco , IVA Incluido.—			
B.5.	RETENCION DE FONDO DE REPARO	B.1. x 5%	266.013

C. DESCRIPCION DE LOS VALORES ESTADISTICOS

C.1. REAJUSTE DE PRECIOS			
C.1.a.	REAJUSTES DEL MES		
C.1.b.	REAJUSTES ACUMULADOS AL CERTIFICADO ANTERIOR		
C.1.c.	REAJUSTES ACUMULADOS AL PRESENTE CERTIFICADO		

C.2. RETENCIONES DE FONDO DE REPARO			
C.2.a.	RETENCIONES DEL PRESENTE CERTIFICADO		266.013
C.2.b.	RETENCIONES ACUMULADAS AL CERTIFICADO ANTERIOR		
C.2.c.	RETENCIONES ACUMULADAS AL PRESENTE CERTIFICADO		266.013

39 (Treinta y Nueve)

4857

CONSORCIO PLUVIAL ABASTO

Ing. Diego Vázquez
Fiscal de Obras
Municipalidad de Asunción
Fiscalización
MUNICIPALIDAD DE ASUNCION

CONSORCIO PLUVIAL ABASTO Defensa Nacional N° 2530, Predios del Yacht Lambaré, Paraguay RUC: 80139421 Teléfono: +595 21 905 652 // +595 21 900 800 Código Postal 110726 chavesconstrucciones@chaves.com.py	**MUNICIPALIDAD DE ASUNCIÓN** Obra: DESAGUE PLUVIAL DEL MERCADO DE ABASTO - CUENCA ITAY Y LAMBARE ID: 421414 LOTE Nº 1 Contrato UOC3 N° 09/2022 Monto del Contrato Gs.: 71.393.978.785	Dirección General de Obras Fiscalización MUNICIPALIDAD DE ASUNCION **Certificado Nº: 1 (Uno).-** % Ejecutado Mensual: 0,01% % Ejecutado Acumulado: 0,01%

C.3. ANTICIPO		
C.3.a.	MONTO DEL ANTICIPO	14.278.795.757
C.3.b.	DEVOLUCION DE ANTICIPO DEL PRESENTE CERTIFICADO	1.064.051
C.3.c.	DEVOLUCION DE ANTICIPO HASTA EL CERTIFICADO ANTERIOR	
C.3.d.	DEVOLUCION DE ANTICIPO HASTA EL PRESENTE CERTIFICADO	1.064.051
C.3.e.	SALDO DEL ANTICIPO	14.277.731.706

C.4. RESUMEN		
C.4.a.	ESTIMACIONES DEL PRESENTE CERTIFICADO, IVA Incluído	5.320.256
C.4.b.	ESTIMACIONES ACUMULADAS AL MES CERTIFICADO ANTERIOR, IVA Incluído	
C.4.c.	ESTIMACIONES ACUMULADAS AL PRESENTE CERTIFICADO, IVA Incluído	5.320.256
C.4.d.	REAJUSTE ACUMULADO	
C.4.e.	RETENCIONES ACUMULADAS	266.013
C.4.f.	SALDO DEL ANTICIPO	14.277.731.706
C.4.g.	**MONTO PAGADO A LA FECHA**	**14.282.785.949**

CONSORCIO PLUVIAL ABASTO

Ing. Diego Vázquez
Fiscalización
MUNICIPALIDAD DE ASUNCION
Municipalidad de Asunción

4857

40 (Cuarenta)

CONSORCIO PLUVIAL ABASTO Defensa Nacional N° 2530, Predios del Yacht Lambaré, Paraguay RUC: 80139421 Teléfono: +595 21 905 652 // +595 21 900 800 Código Postal 110726 chavesconstrucciones@chaves.com.py	**MUNICIPALIDAD DE ASUNCIÓN** Obra: DESAGUE PLUVIAL DEL MERCADO DE ABASTO - CUENCA ITAY Y LAMBARE ID: 421414 LOTE Nº 1 Contrato UOC3 N° 09/2022 Monto del Contrato Gs.: 71.393.978.785	Dirección General de Obras Fiscalización MUNICIPALIDAD DE ASUNCION **Certificado Nº: 1 (Uno).-** % Ejecutado Mensual: 0,01% % Ejecutado Acumulado: 0,01%

DESCRIPCION	MONTO DEL CONTRATO	CERTIFICACIONES ANTERIORES		CERTIFICADO ACTUAL		CERTIFICADO ACUMULADO	
		% DE AVANCE	MONTO DE AVANCE	% DE AVANCE	MONTO DE AVANCE	% DE AVANCE	MONTO DE AVANCE
DESAGUE PLUVIAL DEL MERCADO DE ABASTO - CUENCA ITAY Y LAMBARE ID: 421414 LOTE Nº 1	71.393.978.785			0,01%	5.320.256	0,01%	5.320.256
TOTALES							

	MONTO DEL CONTRATO	CERTIFICAC. ANTERIORES	CERTIFICADO ACTUAL	CERTIFICADO ACUMULADO
a - Monto total de los trabajos	71.393.978.785		5.320.256	5.320.256
b - Devolucion de Anticipo 20%	14.278.795.757		1.064.051	1.064.051
c - Fondo de Reparo 5%	3.569.698.939		266.013	266.013
SALDO NETO	**53.545.484.089**		**3.990.192**	**3.990.192**

CONSORCIO PLUVIAL ABASTO

Ing. Diego Vázquez
Fiscal de Obras
Fiscalización
MUNICIPALIDAD DE ASUNCION

41 (Cuarenta y Un)

4857-

35 (treinta y cinco)

CONSORCIO PLUVIAL ABASTO

Municipalidad de Asuncion

4857

ACTA DE MEDICIÓN
CERTIFICADO Nº 1 MES DE FEBRERO DEL 2024

En la Ciudad de Asunción, el día 29 del mes de Febrero del año dos mil veinticuatro, se reúnen por una parte el Ing. Diego Vazquez, representante de la Fiscalización de la Municipalidad de Asunción, y por otra parte el Ing. Emilio Gonzalez, Ingeniero Residente de la contratista CONSORCIO PLUVIAL ABASTO, a los efectos de labrar el presente ACTA DE MEDICION correspondiente a los rubros ejecutados hasta el 29 de Febrero del 2024, en la Obra:
"DESAGUE PLUVIAL DEL MERCADO DE ABASTO - CUENCA ITAY Y LAMBARE" ID: 421414 LOTE Nº 1, según Contrato UOC3 N° 09/2022, suscripto en fecha 05 de Diciembre del 2023 de acuerdo al siguiente detalle:

RUBROS EJECUTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2024

ITEM Nº	DESCRIPCION	UNIDAD	PRESENTE CERTIFICADO
63	Cartel de obra de 3,00x1,50m	un	2,00

Ing. Emilio Gonzalez
Ing. Residente
CONSORCIO PLUVIAL ABASTO

Fiscalización
MUNICIPALIDAD DE ASUNCION
Ing. Diego Vazquez
Fiscal de Obras
Municipalidad de Asunción

CONSORCIO PLUVIAL ABASTO

Lambaré, 01 de Julio de 2024

Señor
Director General de Administración y Finanzas
Municipalidad de Asunción
Presente

Nota NºCpA.2024.22

Ref.: Obra: "DESAGUE PLUVIAL DEL MERCADO DE ABASTO - CUENCA ITAY Y LAMBARÉ"
-Lote 1- ID Nº 421414

Solicitud de Pago del Certificado de Obra Nº 1

Nos dirigimos a Ustedes, con relación al contrato de Referencia, a fin de solicitar el pago del Certificado de Obra Nº 1.

El monto a ser pagado con Recursos Del Crédito Publico es de Gs. 4.256.205 - (*CUATRO MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS CINCO*) IVA incluido.

Los datos de la solicitud de pago se basan en los siguientes datos:

OBJETO DEL INFORME	**Solicitud de Pago del anticipo**
Descripción de la Obra:	DESAGUE PLUVIAL DEL MERCADO DE ABASTO - CUENCA ITAY Y LAMBARÉ -Lote 1- ID Nº421414
Contratista:	Consorcio Pluvial Abasto
Monto:	Gs. 4.256.205
Fuente de Financiamiento	Recursos Del Crédito Publico
Fecha de Contrato:	05 de diciembre de 2023 – UOC 3 09/2022
Resolución de Adjudicación	Nº 1973/2023 I.
Plazo de Ejecución:	540 días

Sujeto a revisión de cumplimiento de términos y cálculos. No implica aceptación ni conformación de pago

Manifestamos en carácter de Declaración Jurada que, de conformidad a las cláusulas contractuales, los términos de referencia y las órdenes de modificación suscritos y debidamente aprobados por la intendencia Municipal, el presente pedido de pago se ajusta al Contrato firmado entre la Municipalidad de Asunción y la Empresa Contratista, y que los datos y valores en el expuestos han sido debidamente verificados y constituyen el avance físico real de la obra, asumiendo toda responsabilidad civil y penal emergente de las mismas.

Se adjuntan las Documentaciones debidamente foliadas, en el Anexo, que forma parte de esta nota.

Sin otro particular, aprovechamos la oportunidad para saludarlos atentamente.

Sr. Silvio Manuel Peña Ferrario
Representante Legal

Ing. Oscar Rubiani
Representante Legal

03 JUL 2024

Oficina Central: Defensa Nacional 2530 (Lambaré)
☎: +595 21 905 652 / : +595 21 900 800
✉: chavesconstrucciones@chaves.com.py

Av. Eusebio Ayala y Dr. Domingo Montanaro

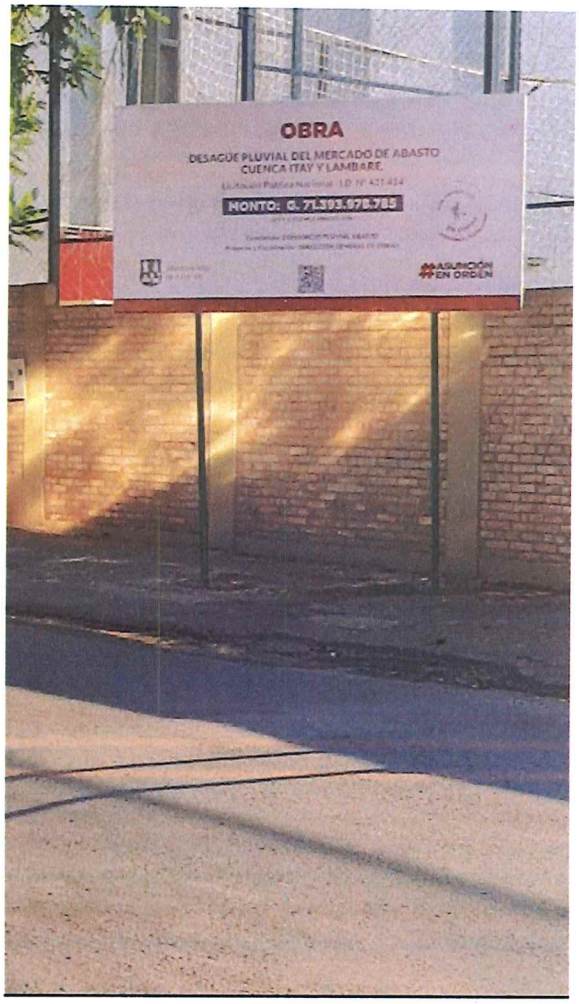

Tte. Jose Felix Lopez (zona Abasto)

Ing. Diego Vázquez
Fiscal de Obras
Municipalidad de Asunción

4857-

Dirección Nacional de Aeronáutica Civil

DINAC

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

DIRECCION DE METEOROLOGIA E HIDROLOGIA

Dpto. de Servicios Meteorológicos e Hidrológicos para el Público

REGISTRO DE PRECIPITACIÓN DIARIA (mm) AÑO 2024

4857- - -

Localidad	Latitud Sur	Longitud Oeste	Elevación
AEROPUERTO "SILVIO PETTIROSSI", LUQUE	25° 14' 09,99"	57° 30' 53,08"	83 m s.n.m.m

Mes / Día	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Setiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
1	21,8	0,0	0,0									
2	0,0	0,0	0,0									
3	0,0	0,0	T									
4	0,0	0,0	3,5									
5	0,0	0,0	0,0									
6	0,0	0,0	0,0									
7	0,0	0,0	0,0									
8	0,0	0,0	0,0									
9	0,0	1,0	0,2									
10	26,8	0,0	0,0									
11	10,4	0,0	0,0									
12	0,0	0,0	0,0									
13	0,0	15,4	0,0									
14	0,0	T	0,0									
15	12,8	0,0	0,0									
16	0,0	0,0	0,0									
17	0,0	0,0	10,2									
18	0,0	0,0	0,0									
19	0,0	0,0	0,0									
20	0,0	0,0	0,0									
21	T	0,0	21,0									
22	0,0	0,0	0,0									
23	0,0	2,6	0,0									
24	0,0	0,0	0,0									
25	0,0	11,4	0,0									
26	0,0	3,4	0,0									
27	0,0	T	0,0									
28	0,0	57,4	0,0									
29	0,0	0,0	0,0									
30	0,0		0,0									
31	0,0		0,0									
Total	71,8	91,2	34,9									
Máx. 24h	26,8	57,4	21									
Día Máx.	10	28	21									

Referencias: 0,0 sin precipitación; T precipitación no medible (Trazas); - sin datos de precipitación.

DIRECCION DE METEOROLOGIA E HIDROLOGIA - Serv. Met. e Hid. para el Público - REPUBLICA DEL PARAGUAY

Ing. Magdalena Amarilla
Jefe Dpto. Serv. Met. Hid. para el Público
DMH - DINAC

Certifico: Que es fotocopia fiel del documento que tengo a la vista.-

MARIA ELENA LOPEZ DE ARIETTI
ESCRIBANA PUBLICA
REGISTRO N° 487
Av. Cacique Lambaré 552 c/ Moal. Estigarribia
Tel. 900.200 - Lambaré - Py.

Cnel. Lopez N° 1.080 c/ De la Conquista

Tel. 021-4381192
Asunción - Paraguay

Scanned with CamScanner

CONSORCIO PLUVIAL ABASTO
CHAVES CONSTRUCCIONES S.A.I. - COVIPA S.A.

Obra: DESAGUE PLUVIAL DEL MERCADO DE ABASTO - CUENCA ITAY y LAMBARÉ
ID 421.414 // Lote 1

LIBRO DE OBRA

Nº 0001

A :

Fecha : 20/02/2024.

De :

Habiendo el Consorcio Pluvial Abasto recibido en fecha 20 de Febrero de 2024 la orden de inicio para la ejecución de la obra "Desagüe pluvial del Mercado de Abasto - Cuenca Itay y Lambaré - ID Nº 421.414 - Lote 1", según Contrato firmado en fecha 05-12-2023 entre la Municipalidad de Asunción y Consorcio Pluvial Abasto (Construcciones y Viviendas Paraguayas S.A. - Chaves Construcciones S.A.I.), se habilita el presente Libro de Obras, para registrar todo lo concerniente a los trabajos a ejecutar en la obra; en triplicado y numerado de forma correlativa desde el 0001 y siguientes.

Formalmente se designa en representación del Consorcio al Ing. Emilio González como Ing. Residente de obras.

Emilio G.

Ing. Diego Vázquez
Fiscal de Obras
Municipalidad de Asur.

GRÁFICA ROLFI De Rolfi Ariel Diaz Gonzalez - RUC: 5309780 - 7 Hab. N° 2358 - Calle Guapovo c/ Paso de Patria - San Antonio - Py
Cel.:(0982) 862 874 - (0991) 374 013 - 03 Tal. 50x3 del 0000001 - 0000150.

ORIGINAL: Cliente
DUPLICADO: Archivo Trib.
TRIPLICADO: Contabilidad

CONSORCIO PLUVIAL ABASTO
CHAVES CONSTRUCCIONES S.A.I. - COVIPA S.A.

Obra: DESAGUE PLUVIAL DEL MERCADO DE ABASTO - CUENCA ITAY y LAMBARÉ
ID 421.414 // Lote 1

LIBRO DE OBRA

Nº 0002

A : **Fecha :** 28-02-2024

De :

Se realiza una reunión en las oficinas de la Dirección General de Obras estando presentes: Ing. Mirtha Acha y el Ing. Antoliano Benítez en representación de la Municipalidad; Ing. Oscar Rubiani, Ing. Alcides González y el Ing. Gustavo Gaona en representación del Consorcio Pluvial Abasto. En dicha reunión se comenta los avances de la revisión del proyecto establecido en las Consideraciones Generales de las Especificaciones Técnicas del PBC con dos puntos a destacar:

La existencia de una línea de alcantarillas celulares en la avenida Eusebio Ayala, extremo de aguas abajo de las obras a ejecutar. Se recomienda a la Municipalidad previo al inicio de las obras en el tramo que involucra a la avenida afectada, realizar un estudio más profundo para determinar situación actual de las obras existentes y proponer una solución de protección a las mismas. Se solicita una consideración de plazo para el mismo. Por esto los ítems posibles de ejecutar se iniciarán en la calle Montanaro.

Ing. Diego Vázquez
Fiscal de Obras
Municipalidad de [illegible]

GRÁFICA ROLFI De Rolfi Ariel Diaz Gonzalez - RUC: 5309780 - 7 Hab. N° 2358 - Calle Guapovo c/ Paso de Patria - San Antonio - Py
Cel.:(0982) 862 874 - (0991) 374 013 - 03 Tal. 50x3 del 0000001 - 0000150.
ORIGINAL: Cliente
DUPLICADO: Archivo Trib.
TRIPLICADO: Contabilidad

CONSORCIO PLUVIAL ABASTO
CHAVES CONSTRUCCIONES S.A.I. - COVIPA S.A.

Obra: DESAGUE PLUVIAL DEL MERCADO DE ABASTO - CUENCA ITAY y LAMBARÉ
ID 421.414 // Lote 1

LIBRO DE OBRA

Nº 0003

A :

Fecha : 28-02-2024

De :

Estudio realizado en la red cloacal existente en el área de influencia de la avenida Eusebio Ayala y la calle Montanaro, cuyas cotas de registros se encuentran a un nivel superior a las cotas de descarga correspondientes a lo que se habrá de ejecutar en la obra, se informa que la red cloacal a contruir deberá cruzarse por la avenida Eusebio Ayala hasta encontrar una cota mínima en la calle Mecanicos de Aviación.

Atendiendo que esta situación no se contempla en el proyecto de licitación, solicitamos consideración en los plazos para encontrar soluciones adecuadas al sistema existente de la ESSAP.

ACTA DE INICIO DE OBRAS

SE INICIAN LOS TRABAJOS PRELIMINARES DE MEDICION, TOPOGRAFIAS, LIMPIEZA Y DESPEJES DEL TRAMO PARA EL INICIO DE LAS OBRAS, AVDA MONTANARO ENTRE AVDA EUSEBIO AYALA Y LA CALLE SAN MARTIN.

Ing. Diego Vázquez
Fiscal de Obras
Municipalidad de Asunción

Emilio G.

GRÁFICA ROLFI De Rolfi Ariel Díaz Gonzalez - RUC: 5309780 - 7 Hab. N° 2358 - Calle Guapovo c/ Paso de Patria - San Antonio - Py
Cel.:(0982) 862 874 - (0991) 374 013 - 03 Tal. 50x3 del 0000001 - 0000150.

ORIGINAL: Cliente
DUPLICADO: Archivo Trib.
TRIPLICADO: Contabilidad
