De Gregorio Vera Jara
Sargento Dure e/ D. González y Defensores del Chaco
Coronel Bogado – Itapúa - Paraguay
Tel: (0741) 252024 – Cel: (0985) 916562
R.U.C.: 1.218.178 - 1

Encarnación, de febrero del 2024.-

Señor

Francisco Javier Pereira Rieve

Gobernador del Departamento de Itapúa

Ref.: CONTRATO Nº 73/23

Construcción de Empedrado en los Distritos de Cambyreta y Nueva Alborada Tramo 2 y Tramo 3 - Plurianual con ID: 434111

De nuestra Consideración:

Por medio de la presente tenemos a bien dirigirnos a Usted para presentar nuestro Certificado Nº 1 del Contrato Nº 73/23 correspondiente al periodo de diciembre 2023/ enero 2024.

Para el efecto adjuntamos a la presente todos los documentos con las mediciones respectivas.

El Monto Neto a Cobrar del presente Certificado asciende a Gs. **107.154.824** (Guaraníes: Ciento siete millones ciento cincuenta y cuatro mil ochocientos veinticuatro.)

Sin otro particular aprovechamos la oportunidad para saludarlo muy atentamente.

Gregorio Vera Jara
Lapacho Construcciones
Tel. (0975) 604-863
Cnel. Bogado - Py.

Gregorio Vera Jara

Representante Legal

GOBERNACIÓN DE ITAPÚA
MESA DE ENTRADA
Expte Nº: 1105
Fecha: 16 FEB 2024 Hora: 07:05
Firma: R Fojas: 18

1(uno)

ACTA DE MEDICIÓN

CERTIFICADO BASICO Nº 01

CONTRATO Nº 73/23

REFERENCIA: Construcción de Empedrado en los Distritos de Cambyreta y Nueva Alborada - Plurianual con ID: 434111. Construcción de empedrado - Tramo 2 y Tramo 3 Distrito de Alborada

CONTRATISTA: Lapacho Construcciones – Gregorio Vera Jara

En el distrito de Nueva Alborada, Departamento de Itapúa, República del Paraguay, a los treinta días del mes de enero del 2024, se reúnen en representación de la Gobernación de Itapúa, el Ing. Fernando Oreggioni, Secretario de Obras encargado de la Verificación y Fiscalización de las Obras, y el Señor Gregorio Vera Jara, Representante legal de la Empresa Lapacho Construcciones para la **Construcción de empedrado - Tramo 2 y Tramo 3 Distrito de Alborada - ID: 434111.**

Quienes suscriben la presente Acta, han procedido a la verificación y medición de los trabajos ejecutados durante el periodo de diciembre 2023 y enero 2024.

En la verificación y medición realizada se observó que las obras se encuentran de acuerdo a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones y los resultados se anexan en las planillas correspondientes.

De plena conformidad de las partes, se suscribe el presente Acta en 2 (dos) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en el lugar y fecha indicados más arriba. -

Gregorio Vera Jara
Lapacho Construcciones
Tel. (0975) 604 963
Cnel. Bogado - Py.

Representante Legal

Fiscal de Obras
Gobernación de Itapúa

Ing. Fernando Oreggioni
Secretario Departamental de Obras Publicas y Transporte
Gobernación de Itapúa

2(dos)

Gobernación de Itapúa
Secretaría de Obras Públicas

Resumen Certificado Básico N°: 1
Periodo: diciembre '23/ enero '24

OBRA: Construcción de Empedrado en los Distritos de Cambyreta y Nueva Alborada - Plurianual con ID: 434111. Construcción de empedrado - Tramo 2 y Tramo 3 Distrito de Alborada

Posición	Conceptos	Importes Autorizados		Importes Certificados					
				Hasta Certificado Anterior		Presente Certificado		Total a la Fecha	
		%	(1)	%	(2)	%	(3)	%	(2+3)
A	Certificados por Obra Ejecutada								
A.1	Lote 2	29,04%	51.571.240	0,00%	-	29,04%	51.571.240	29%	51.571.240
A.2	Lote 3	70,96%	126.032.680	0,00%	-	46,38%	82.372.290	46,38%	82.372.290
AII	**Totales por Obra**	**100,00%**	**177.603.920**	**0,00%**	-	**75,42%**	**133.943.530**	**75,42%**	**133.943.530**
B	Certificados por Obra Ejecutada								
B.1	Devolución de Anticipo	20%	35.520.784		-		26.788.706		26.788.706
B.2	Para Fondo de Reparo	0%	-						
B.3	Otras Deducciones	0%	0		0		0		0
BII	**Total Deducciones**		**35.520.784**		-		**26.788.706**		**26.788.706**

C.1	Importe Líquido a Pagar Según Presente Certificado (A-B)	107.154.824
C.2	Multas	0
C.	**Importe Neto a Pagar Según Presente Certificado (A-B)**	**107.154.824**

Son Gs.: Ciento siete millones ciento cincuenta y cuatro mil ochocientos veinticuatro.-

Resumen de Certificado Básico N° 1
Periodo dic '23/ene'24

Contrato N° 73/23
Monto Gs. Lote 2: 51.571.240
Monto Gs. Lote 3: 126.032.680
Monto Total 177.603.920

Contratista: Lapacho Construcciones
Fecha de Inicio: 20/12/2023
Terminación: 19/01/2024
Plazo de ejecución: 30 días

Gobernación de Itapúa
Secretaría de Obras Públicas

Mesa de Entrada

Contratista
Representante

Gregorio Vera Jara
Lapacho Construcciones
Tel. (0975) 604 963
Cnel. Bogado - Py.

GOBERNACIÓN DE ITAPÚA
Secretario de Obras Públicas

GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE ITAPÚA
Secretaría de Obras Publicas y Transporte

Ing. Fernando Oreggioni
Secretario Departamental de
Obras Publicas y Transporte
Gobernación de Itapúa

3 (tres)

GOBERNACIÓN DE ITAPÚA | Dic '23/ ene '24 | Cert. N° 1

Secretaría de Obras Públicas | Planilla I

Precio Contratación Gs: 51.571.240

PLANILLAS DE IMPORTES POR PRECIO UNITARIO

OBRA: Construcción de Empedrado en los Distritos de Cambyreta y Nueva Alborada - Plurianual con ID: 434111. Construcción de empedrado - Tramo 2 Distrito de Alborada

							EN PORCENTAJE			EN INCIDENCIA			CANTIDAD EJECUTADA			MONTO EJECUTADO EN GS.		
Ítem	Descripción del Bien	UNIDAD	CANT	P. UNITARIO	P. TOTAL	INCIDENCIA	ACUMUL. ANTERIOR	PRESENTE	ACUMUL. TOTAL	ACUMUL. ANTERIOR	PRESENTE	ACUMUL. TOTAL	ACUM. ANT.	PRESENTE	ACUM. TOTAL	ACUM. ANT.	PRESENTE	ACUM. TOTAL
1	Construcción de empedrado- Cartel de Obra (2x1,5)	Unidad	1	1.015.000	1.015.000	0,0197	0,00%	100,00%	100,00%	0,0000	0,0197	0,0197	0,00	1	1,00	-	1.015.000	1.015.000
2	Construcción de empedrado - Movilización, carteles de seguridad y señalización	Unidad Medida Global	1	6.750.000	6.750.000	0,1309	0,00%	100,00%	100,00%	0,0000	0,1309	0,1309	0,00	1	1,00	-	6.750.000	6.750.000
3	Construcción de empedrado - Movimiento de suelo: apertura de caja y traslado de materiales sobrantes. Regularización para respetar proyecto (incluye desmonte y terraplen).	Metros cúbicos	179,74	26.000	4.673.240	0,0906	0,00%	100,00%	100,00%	0,0000	0,0906	0,0906	0,00	179,74	179,74	-	4.673.240	4.673.240
4	Construcción de empedrado - Desmonte de arbol	Unidad	7	555.000	3.885.000	0,0753	0,00%	100,00%	100,00%	0,0000	0,0753	0,0753	0,00	7	7,00	-	3.885.000	3.885.000
5	Construcción de Empedrado piedra basáltica (incluye colchón de tierra y compactación)	Metros cuadrados	560	36.000	20.160.000	0,3909	0,00%	100,00%	100,00%	0,0000	0,3909	0,3909	0,00	560,00	560,00	-	20.160.000	20.160.000
6	Construcción de empedrado-Relleno de piedra triturada de 6ta, sobre pavimento tipo empedrado. Incluye compactación	Metros cuadrados	560	2.700	1.512.000	0,0293	0,00%	100,00%	100,00%	0,0000	0,0293	0,0293	0,00	560,00	560,00	-	1.512.000	1.512.000
7	Construcción de empedrado-Cordón Cuneta de Hormigón (fck= 180 kg/cm2).	Metros cúbicos	12	1.080.000	12.960.000	0,2513	0,00%	100,00%	100,00%	0,0000	0,2513	0,2513	0,00	12,00	12,00	-	12.960.000	12.960.000
8	Construcción de empedrado - Limpieza inicial y final de obra	Metros cuadrados	560	1.100	616.000	0,0119	0,00%	100,00%	100,00%	0,0000	0,0119	0,0119	0,00	560,00	560,00	-	616.000	616.000
PRECIO TOTAL					51.571.240	1,00				0,00%	100,00%	100,00%				-	51.571.240	51.571.240

Gregorio Vera Jara
CONTRATISTA
Lapacho Construcciones
Tel. (0975) 604 963
Cnel. Bogado - Py.

GOBERNACIÓN DE ITAPÚA
Ing. Fernando Oreggioni
Secretario Departamental de Obras Publicas y Transporte
Gobernacion de Itapúa

GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE ITAPÚA
Secretaría de Obras Publicas y Transporte

Lapacho

GOBERNACIÓN DE ITAPÚA

Dic '23/ ene '24 — Cert. N° 1

Secretaría de Obras Públicas

Planilla I

Precio Contratación Gs: 126.032.680

PLANILLAS DE IMPORTES POR PRECIO UNITARIO

OBRA: Construcción de Empedrado en los Distritos de Cambyreta y Nueva Alborada - Plurianual con ID: 434111. Construcción de empedrado - Tramo 3 Distrito de Alborada

N°	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT	P. UNITARIO	P. TOTAL	INCIDENCIA	EN PORCENTAJE			EN INCIDENCIA			CANTIDAD EJECUTADA			MONTO EJECUTADO EN GS.		
							ACUMUL. ANTERIOR	PRESENTE	ACUMUL. TOTAL	ACUMUL. ANTERIOR	PRESENTE	ACUMUL. TOTAL	ACUM. ANT.	PRESENTE	ACUM. TOTAL	ACUM. ANT.	PRESENTE	ACUM. TOTAL
1	Construcción de empedrado - Cartel de Obra (2x1,5)	Unidad	1	1.015.000	1.015.000	0,0081	0,00%	100,00%	100,00%	0,0000	0,0081	0,0081	0,00	1	1,00	-	1.015.000	1.015.000
2	Construcción de empedrado - Movilización, carteles de seguridad y señalización	Unidad Medida Global	1	6.750.000	6.750.000	0,0536	0,00%	100,00%	100,00%	0,0000	0,0536	0,0536	0,00	1	1,00	-	6.750.000	6.750.000
3	Construcción de Empedrado - Movimiento de suelo: apertura de caja y traslado de materiales sobrantes. Regularización para respetar proyecto (incluye desmonte y terraplen).	Metros cúbicos	545,53	26.000	14.183.780	0,1125	0,00%	100,00%	100,00%	0,0000	0,1125	0,1125	0,00	545,53	545,53	-	14.183.780	14.183.780
4	Construcción de empedrado - Empedrado piedra basáltica (incluye colchón de tierra y compactación)	Metros cuadrados	1.323	36.000	47.628.000	0,3779	0,00%	45,20%	45,20%	0,0000	0,1708	0,1708	0,00	598,05	598,05	-	21.529.810	21.529.810
5	Construcción de empedrado -Relleno de piedra triturada de 6ta, sobre pavimento tipo empedrado, incluye compactación	Metros cuadrados	1.323	3.750	4.961.250	0,0394	0,00%	0,00%	0,00%	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00	0,00	-	-	-
6	Construcción de empedrado - Cordón escondido de hormigón 15x30cm (fck= 180 kg/cm2).	Metros cúbicos	0,32	1.085.000	347.200	0,0028	0,00%	100,00%	100,00%	0,0000	0,0028	0,0028	0,00	0,32	0,32	-	347.200	347.200
7	Construcción de empedrado - Cordón Cuneta de Hormigón (fck= 180 kg/cm2).	Metros cúbicos	28,35	1.080.000	30.618.000	0,2429	0,00%	100,00%	100,00%	0,0000	0,2429	0,2429	0,00	28,35	28,35	-	30.618.000	30.618.000
8	Construcción de empedrado -Baden de H° A° (fck= 210 kg/cm2).	Metros cúbicos	6,48	1.850.000	11.988.000	0,0951	0,00%	0,00%	0,00%	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00	0,00	-	-	-
9	Construcción de empedrado - Hormigón armado de 210 Kg/cm2 (Incluye encofrado)	Metros cúbicos	3,6	1.950.000	7.020.000	0,0557	0,00%	100,00%	100,00%	0,0000	0,0557	0,0557	0,00	3,6	3,60	-	7.020.000	7.020.000
10	Construcción de empedrado - Limpieza inicial y final de obra	Metros cuadrados	1.323	1.150	1.521.450	0,0121	0,00%	59,71%	59,71%	0,0000	0,0072	0,0072	0,00	790,00	790,00	-	908.500	908.500
PRECIO TOTAL					126.032.580	1,00				0,00%	65,36%	65,36%				-	82.372.290	82.372.290

Gregorio Vera Jara
Lapacho Construcciones
Tel. (0975) 604 963
Cnel. Bogado - Py.-

GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE ITAPÚA
Secretaría de Obras Públicas y Transporte

GOBERNACIÓN DE ITAPÚA
Ing. Fernando Oreggioni
Secretario Departamental de Obras Publicas y Transporte
Gobernación de Itapúa

5 (cinco)

ANEXO 1

Comparación de Precios del llamado Construcción de Empedrado en los Distritos de Cambyreta y Nueva Alborada - Plurianual con ID: 434111. Construcción de empedrado - Tramo 2 y Tramo 3 Distrito de Alborada

LOTE NRO: 2

Construcción de Empedrado en los Distritos de Cambyreta y Nueva Alborada - Plurianual con ID: 434111. Construcción de empedrado - Tramo 2 Distrito de Alborada

CONTRATO N° 73/2023 - PLAZO 30 DIAS

					GREGORIO VERA JARA		AVANCE EN CANTIDAD			AVANCE EN PORCENTAJE			AVANCE EN INCIDENCIA		
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total	Anterior	Presente	Actual	Anterior	Presente	Actual	Anterior	Presente	Actual
1	72131701-002	Construcción de empedrado- Cartel de Obra (2x1,5)	Unidad	1	1.015.000	1.015.000	0,00	1	1,00	0%	100%	100%	0,000	0,020	0,020
2	72131701-002	Construcción de empedrado - Movilización, carteles de seguridad y señalización	Unidad Medida Global	1	6.750.000	6.750.000	0,00	1	1,00	0%	100%	100%	0,000	0,131	0,131
3	72131701-002	Construcción de empedrado - Movimiento de suelo: apertura de caja y traslado de materiales sobrantes. Regularización para respetar proyecto (Incluye desmonte y terraplen).	Metros cúbicos	179,74	26.000	4.673.240	0,00	180	179,74	0%	100%	100%	0,000	0,091	0,091
4	72131701-002	Construcción de empedrado - Desmonte de arbol	Unidad	7	555.000	3.885.000	0,00	7	7,00	0%	100%	100%	0,000	0,075	0,075
5	72131701-002	Construcción de Empedrado piedra basáltica (incluye colchón de tierra y compactación)	Metros cuadrados	560	36.000	20.160.000	0,00	560	560,00	0%	100%	100%	0,000	0,391	0,391
6	72131701-002	Construcción de empedrado-Relleno de piedra triturada de 6ta, sobre pavimento tipo empedrado. Incluye compactación	Metros cuadrados	560	2.700	1.512.000	0,00	560,00	560,00	0%	100%	100%	0,000	0,029	0,029
7	72131701-002	Construcción de empedrado-Cordón Cuneta de Hormigón (fck= 180 kg/cm2).	Metros cúbicos	12	1.080.000	12.960.000	0,00	12,00	12,00	0%	100%	100%	0,000	0,251	0,251
8	72131701-002	Construcción de empedrado - Limpieza inicial y final de obra	Metros cuadrados	560	1.100	616.000	0,00	560,00	560,00	0%	100%	100%	0,000	0,012	0,012
Precio Total						**51.571.240**							**0,000**	**100,00%**	**100,00%**

Gregorio Vera Jara
Lapacho Construcciones
Tel. (0975) 604 963
Cnel. Bogado - Py.-

GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE ITAPÚA
Secretaría de Obras Públicas y Transporte

Ing. Fernando Oreggioni
Secretario Departamental de Obras Públicas y Transporte
Gobernación de Itapúa

ANEXO 1

Comparación de Precios del llamado Construcción de Empedrado en los Distritos de Cambyreta y Nueva Alborada - Plurianual con ID: 434111. Construcción de empedrado - Tramo 2 y Tramo 3 Distrito de Alborada

LOTE NRO: 3

Construcción de Empedrado en los Distritos de Cambyreta y Nueva Alborada - Plurianual con ID: 434111. Construcción de empedrado - Tramo 3 Distrito de Alborada

CONTRATO N° 73/2023 - PLAZO 30 DIAS

					GREGORIO VERA JARA		AVANCE EN CANTIDAD			AVANCE EN PORCENTAJE			AVANCE EN INCIDENCIA		
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total	Anterior	Presente	Actual	Anterior	Presente	Actual	Anterior	Presente	Actual
1	72131701-002	Construcción de empedrado - Cartel de Obra (2x1,5)	Unidad	1	1.015.000	1.015.000	0,00	1	1,00	0%	100%	100%	0,000	0,008	0,008
2	72131701-002	Construcción de empedrado - Movilización, carteles de seguridad y señalización	Unidad Medida Global	1	6.750.000	6.750.000	0,00	1	1,00	0%	100%	100%	0,000	0,054	0,054
3	72131701-002	Construcción de Empedrado - Movimiento de suelo: apertura de caja y traslado de materiales sobrantes. Regularización para respetar proyecto (incluye desmonte y terraplen)	Metros cúbicos	545,53	26.000	14.183.780	0,00	545,53	545,53	0%	100%	100%	0,000	0,113	0,113
4	72131701-002	Construcción de empedrado - Empedrado piedra basáltica (incluye colchón de tierra y compactación)	Metros cuadrados	1.323	36.000	47.628.000	0,00	598,05	598,05	0%	45%	45%	0,000	0,171	0,171
5	72131701-002	Construcción de empedrado -Relleno de piedra triturada de 6ta, sobre pavimento tipo empedrado. Incluye compactación	Metros cuadrados	1.323	3.750	4.961.250	0,00	0,00	0,00	0%	0%	0%	0,000	0,000	0,000
6	72131701-002	Construcción de empedrado - Cordón escondido de hormigón 15x30cm (fck= 180 kg/cm2).	Metros cúbicos	0,32	1.085.000	347.200	0,00	0,32	0,32	0%	100%	100%	0,000	0,003	0,003
7	72131701-002	Construcción de empedrado - Cordón Cuneta de Hormigón (fck= 180 kg/cm2).	Metros cúbicos	28,35	1.080.000	30.618.000	0,00	28,35	28,35	0%	100%	100%	0,000	0,243	0,243
8	72131701-002	Construcción de empedrado -Baden de H° A° (fck= 210 kg/cm2).	Metros cúbicos	6,48	1.850.000	11.988.000	0,00	0,00	0,00	0%	0%	0%	0,000	0,000	0,000
9	72131701-002	Construcción de empedrado - Hormigón armado de 210 Kg/cm2 (Incluye encofrado)	Metros cúbicos	3,6	1.950.000	7.020.000	0,00	3,6	3,60	0%	100%	100%	0,000	0,056	0,056
10	72131701-002	Construcción de empedrado - Limpieza inicial y final de obra	Metros cuadrados	1.323	1.150	1.521.450	0,00	790,00	790,00	0%	60%	60%	0,000	0,007	0,007
Precio Total						126.032.680							0,000	65,36%	65,36%

Gregorio Vera Jara
Lapacho Construcciones
Tel. (0975) 604 963
Cnel. Bogado - Py.-

GOBIERNO DEPARTAMENTAL ITAPUA
Secretaría de Obras Públicas y Transporte

Ing. Fernando Oreggioni
Secretario Departamental de
Obras Publicas y Transporte
Gobernacion de Itapúa

GOBERNACIÓN DE ITAPÚA

CRONOGRAMA DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO

Lapacho Construcciones

R.U.C.: 1.218.178 - 1

Obra: Construcción de Empedrado en los Distritos de Cambyreta y Nueva Alborada - Plurianual con ID: 434111. Construcción de empedrado - Tramo 2 Distrito de Alborada

Item	Rubros	Unidad	Cantidad	Precio unitario IVA Incluido Gs.	Precio Total Gs	PERIODO 1	PERIODO 2
						DIC'23	ENE'24
1	Construcción de empedrado- Cartel de Obra (2x1,5)	Unidad	1	1.015.000	1.015.000	1.015.000	0
2	Construcción de empedrado - Movilización, carteles de seguridad y señalización	Unidad Medida Global	1	6.750.000	6.750.000	6.750.000	0
3	Construcción de empedrado - Movimiento de suelo: apertura de caja y traslado de materiales sobrantes. Regularización para respetar proyecto (incluye desmonte y terraplen).	Metros cúbicos	179,74	26.000	4.673.240	4.673.240	0
4	Construcción de empedrado - Desmonte de arbol	Unidad	7	555.000	3.885.000	3.885.000	0
5	Construcción de Empedrado piedra basáltica (Incluye colción de tierra y compactación)	Metros cuadrados	560	36.000	20.160.000		20.160.000
6	Construcción de empedrado-Relleno de piedra triturada de 6ta, sobre pavimento tipo empedrado. Incluye compactación	Metros cuadrados	560	2.700	1.512.000		1.512.000
7	Construcción de empedrado-Cordón Cuneta de Hormigón (fck= 180 kg/cm2).	Metros cúbicos	12	1.080.000	12.960.000	3.888.000	9.072.000
8	Construcción de empedrado - Limpieza inicial y final de obra	Metros cuadrados	560	1.100	616.000		616.000
	PRECIO TOTAL				**51.571.240**	**20.211.240**	**31.360.000**
				Avance Programado Gs		20.211.240	31.360.000
				Avance Programado Acumulado Gs		20.211.240	51.571.240
				% Programado		39,19%	60,81%
				% Programado Acumulado		39,19%	100,00%

Gregorio Vera Jara
Lapacho Construcciones
Tel. (0975) 604 963
Cnel. Bogado - Py.-

CONTRATISTA

GOBERNACIÓN DE ITAPÚA

GOBIERNO DEPARTAMENTAL ITAPÚA
Secretaría de Obras Publicas y Transporte

Ing. Fernando Oreggioni
Secretario Departamental de Obras Publicas y Transporte
Gobernación de Itapúa

8(ocho)

GOBERNACIÓN DE ITAPÚA

CRONOGRAMA DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO

Lapacho Construcciones

R.U.C.: 1.218.178 - 1

Obra: Construcción de Empedrado en los Distritos de Cambyreta y Nueva Alborada - Plurianual con ID: 434111. Construcción de empedrado - Tramo 3 Distrito de Alborada

Item	Rubros	Unidad	Cantidad	Precio unitario IVA Incluido Gs	Precio Total Gs	PERIODO 1	PERIODO 2
						DIC'23	ENE'24
1	Construcción de empedrado - Cartel de Obra (2x1,5)	Unidad	1	1.015.000	1.015.000	1.015.000	0
2	Construcción de empedrado - Movilización, carteles de seguridad y señalización	Unidad Medida Global	1	6.750.000	6.750.000	6.750.000	0
3	Construcción de Empedrado - Movimiento de suelo: apertura de caja y traslado de materiales sobrantes, Regularización para respetar proyecto (incluye desmonte y terraplen).	Metros cúbicos	545,53	26.000	14.183.780	14.183.780	0
4	Construcción de empedrado - Empedrado piedra basáltica (incluye colchón de tierra y compactación)	Metros cuadrados	1.323	36.000	47.628.000	21.432.600	26.195.400
5	Construcción de empedrado -Relleno de piedra triturada de 6ta, sobre pavimento tipo empedrado, Incluye compactación	Metros cuadrados	1.323	3.750	4.961.250		4.961.250
6	Construcción de empedrado - Cordón escondido de hormigón 15x30cm (fck= 180 kg/cm2).	Metros cúbicos	0,32	1.085.000	347.200	347.200	0
7	Construcción de empedrado - Cordón Cuneta de Hormigón (fck= 180 kg/cm2).	Metros cúbicos	28,35	1.080.000	30.618.000	30.618.000	0
8	Construcción de empedrado -Baden de H° A° (fck= 210 kg/cm2).	Metros cúbicos	6,48	1.850.000	11.988.000	11.988.000	0
9	Construcción de empedrado - Hormigón armado de 210 Kg/cm2 (incluye encofrado)	Metros cúbicos	3,6	1.950.000	7.020.000	7.020.000	0
10	Construcción de empedrado - Limpieza inicial y final de obra	Metros cuadrados	1.323	1.150	1.521.450	908.500	612.950
	PRECIO TOTAL				**126.032.680**	**94.263.080**	**31.769.600**
					Avance Programado Gs	94.263.080	31.769.600
					Avance Programado Acumulado Gs	94.263.080	126.032.680
					% Programado	74,79%	25,21%
					% Programado Acumulado	74,79%	100,00%

Gregorio Vera Jara
Lapacho Construcciones
Tel. (0975) 604 963
Cnel. Bogado - Py.-

CONTRATISTA

GOBERNACIÓN DE ITAPÚA

Ing. Fernando Oregioni
Secretario Departamental de Obras Públicas y Transporte
Gobernación de Itapúa

9/mere)

Construcción de Empedrado en los Distritos de Cambyreta y Nueva Alborada - Plurianual con ID: 434111.
Construcción de empedrado - Tramo 2 Distrito de Alborada

Contrato N°: 73/23	
Monto del Contrato: 51.571.240 Gs	**Term. Prevista: 19/01/2024**
Plazo Contractual: 30 días	**Ampliaciones:**
Inicio de Obra: 20/12/2023	**Periodo: dic'23/ene'24**

CUADRO DE AVANCE PREVISTO POR CONTRATO

Contrato N°: 73/23

MES	PREVISTO GS.		EJECUTADO GS.		PREVISTO %		EJECUTADO %	
	MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO
INICIO	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
dic'23	20.211.240	20.211.240	0	0	39,19%	39,19%	0,00%	0,00%
ene'24	31.360.000	51.571.240	51.571.240	51.571.240	60,81%	100,00%	100,00%	100,00%

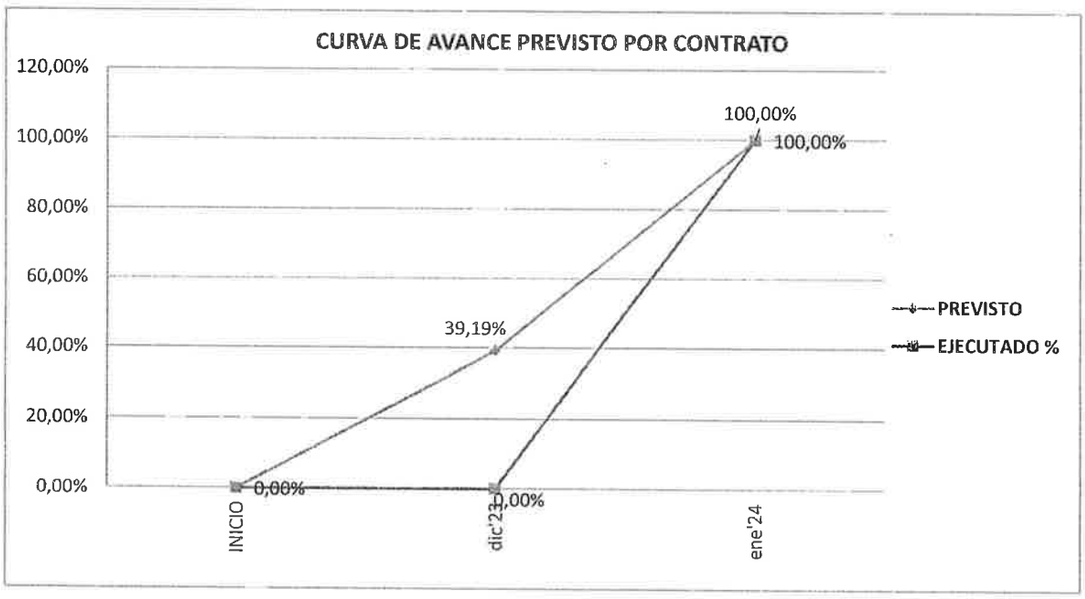

Gregorio Vera Jara
Lapacho Construcciones
Tel. (0975) 604 963
Cnel. Bogado - Pv.

Contratista

GOBIERNO DEPARTAMENTAL ITAPUA
Secretaría de Obras Públicas y Transporte

Gobernación de Itapúa
Ing. Fernando Oregioni
Secretario Departamental de Obras Públicas y Transporte
Gobernación de Itapúa

10 (diez)

Construcción de Empedrado en los Distritos de Cambyreta y Nueva Alborada - Plurianual con ID: 434111.
Construcción de empedrado - Tramo 3 Distrito de Alborada

Contrato N°: 73/23	
Monto del Contrato: 126.032.680 Gs	**Term. Prevista: 19/01/2024**
Plazo Contractual: 30 días	**Ampliaciones:**
Inicio de Obra: 20/12/2023	**Periodo: dic'23/ene'24**

CUADRO DE AVANCE PREVISTO POR CONTRATO

Contrato N°: 73/23

MES	PREVISTO GS.		EJECUTADO GS.		PREVISTO %		EJECUTADO %	
	MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO
INICIO	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
dic'23	94.263.080	94.263.080	0	0	74,79%	74,79%	0,00%	0,00%
ene'24	31.769.600	126.032.680	82.372.290	82.372.290	25,21%	100,00%	65,36%	65,36%

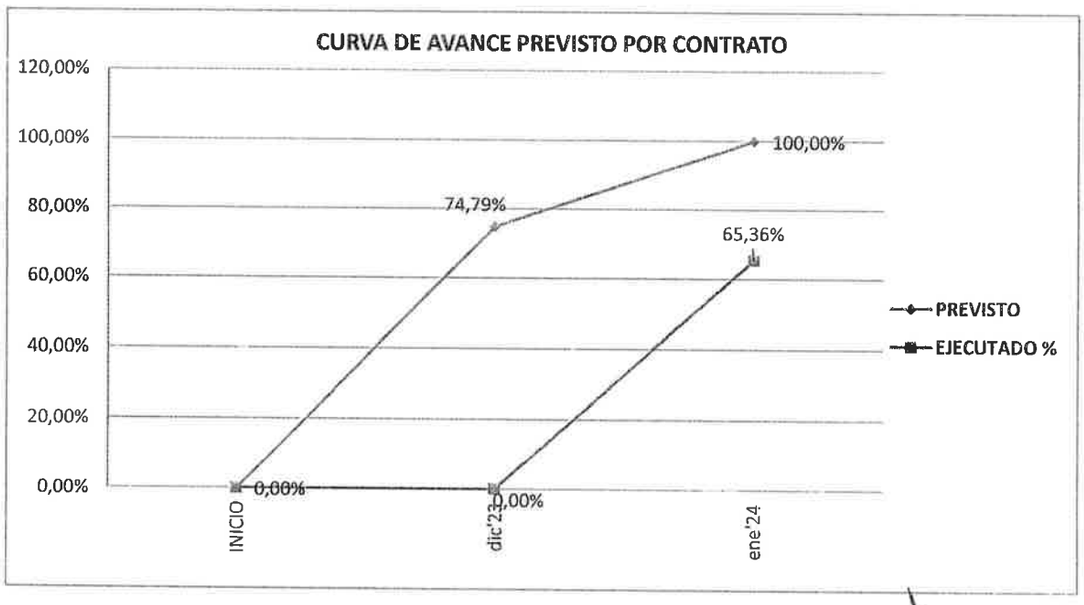

Contratista

Gobernación de Itapúa

Ing. Fernando Oregioni
Secretario Departamental de Obras Publicas y Transporte
Gobernación de Itapúa

GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE ITAPÚA
Secretaría de Obras Publicas y Transporte

11/ene)
