Gobernación de Itapúa
Secretaría de Obras Públicas

Resumen Certificado Básico N°: 3
Periodo: mar'24

OBRA: CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN ITAPUA POTY Y TOMAS R. PEREIRA - PLURIANUAL con ID: 435860 - Construcción de empedrado en María Auxiliadora Distrito de Tomás R. Pereira

Posición	Conceptos	Importes Autorizados		Importes Certificados					
				Hasta Certificado Anterior		Presente Certificado		Total a la Fecha	
		%	(1)	%	(2)	%	(3)	%	(2+3)
A	Certificados por Obra Ejecutada								
A.1	Lote 2	100,00%	398.621.800	42,08%	167.735.750	8,70%	34.693.500	50,78%	202.429.250
AII	**Totales por Obra**	**100,00%**	**398.621.800**	**42,08%**	**167.735.750**	**8,70%**	**34.693.500**	**50,78%**	**202.429.250**
B	Certificados por Obra Ejecutada								
B.1	Devolución de Anticipo	20%	79.724.360		33.547.150		6.938.700		40.485.850
B.2	Para Fondo de Reparo	0%	-						
B.3	Otras Deducciones	0%	0		0		0		0
BII	**Total Deducciones**		**79.724.360**		**33.547.150**		**6.938.700**		**40.485.850**
C.1	Importe Líquido a Pagar Según Presente Certificado (A-B)						27.754.800		
C.2	Multas						0		
C.	**Importe Neto a Pagar Según Presente Certificado (A-B)**						**27.754.800**		

Son Gs.: Veintisiete millones setecientos cincuenta y cuatro mil ochocientos.-

Contratista
Representante

Gregorio Vera Jara
Lapacho Construcciones
Tel. (0975) 604 963
Cnel. Bogado - Py-

Fiscalía de Obras

Ing. Carlos J. Amarilla
Ingeniero Civil
Reg. MOPC N° 9.995

GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE ITAPÚA
Secretaría de Obras Públicas y Transporte

GOBERNACIÓN DE ITAPÚA
Secretario de Obras Públicas
Ing. Fernando Oreggioni
Secretario Departamental de Obras Públicas y Transporte
Gobernación de Itapúa

Resumen de Certificado Básico N° 3
Periodo mar'24

Contrato N° 74/23

Monto Total 398.621.800

Contratista: Lapacho Construcciones
Fecha de Inicio: 20/12/2023
Terminación: 18/05/2024
Plazo de ejecución: 150 días

Gobernación de Itapúa
Secretaría de Obras Públicas

Mesa de Entrada

ACTA DE MEDICIÓN

CERTIFICADO BASICO Nº 03

CONTRATO Nº 74/23

REFERENCIA: CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN ITAPUA POTY Y TOMAS R. PEREIRA - PLURIANUAL con ID: 435860 - Construcción de empedrado en María Auxiliadora Distrito de Tomás R. Pereira

CONTRATISTA: Lapacho Construcciones – Gregorio Vera Jara

En el distrito de Tomás Romero Pereira, Departamento de Itapúa, República del Paraguay, a los 3 días del mes de abril del 2024, se reúnen en representación de la Gobernación de Itapúa, el Ing. Carlos Amarilla, encargado de la Verificación y Fiscalización de las Obras, y el Señor Gregorio Vera Jara, Representante legal de la Empresa Lapacho Construcciones para la **CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN ITAPUA POTY Y TOMAS R. PEREIRA - PLURIANUAL con ID: 435860 - Construcción de empedrado en María Auxiliadora Distrito de Tomás R. Pereira**

Quienes suscriben la presente Acta, han procedido a la verificación y medición de los trabajos ejecutados durante el mes de marzo 2024.

En la verificación y medición realizada se observó que las obras se encuentran de acuerdo a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones y los resultados se anexan en las planillas correspondientes.

De plena conformidad de las partes, se suscribe el presente Acta en 2 (dos) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en el lugar y fecha indicados más arriba. -

Gregorio Vera Jara
Lapacho Construcciones
Tel. (0975) 604 963
Cnel. Bogado - Py.-
Representante Legal

GOBERNACIÓN DEPARTAMENTAL DE ITAPÚA
Fiscalización
Gobernación de Itapúa
Ing. Carlos J. Amarilla
Ingeniero Civil
Reg. MOPC Nº 3.865

ANEXO 1

Comparación de Precios del llamado CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN ITAPUA POTY Y TOMAS R. PEREIRA - PLURIANUAL con ID: 435860 - Construcción de empedrado en María Auxiliadora Distrito de Tomás R. Pereira

Construcción de empedrado en María Auxiliadora Distrito de Tomás R. Pereira

CONTRATO N° 74/2023 - PLAZO 150 DIAS

mar-24

					GREGORIO VERA JARA		AVANCE EN CANTIDAD			AVANCE EN PORCENTAJE			AVANCE EN INCIDENCIA		
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA Incluido)	Precio total	Anterior	Presente	Actual	Anterior	Presente	Actual	Anterior	Presente	Actual
1	82101502-004	Cartel metalico con soporte -	Unidad	1	1.100.000	1.100.000	1,00	0,00	1,00	100%	0%	100%	0,003	0,000	0,003
2	72131601-002	Preparacion de obra - Movilización, carteles de seguridad y señalización	Unidad Medida Global	1	5.650.000	5.650.000	1,00	0,00	1,00	100%	0%	100%	0,014	0,000	0,014
3	72131601-9974	Replanteo y marcación - Relevamiento topografico, Incluye replanteo y marcación	Metro lineal	760	7.500	5.700.000	760,00	0	760,00	100%	0%	100%	0,014	0,000	0,014
4	72131701-002	Construcción de empedrado - Apertura de caja y traslado de materiales sobrantes.	Metros cúbicos	609,38	21.000	12.796.980	410,00	140	550,00	67%	23%	90%	0,022	0,007	0,029
5	72131701-002	Construcción de empedrado - Terraplen: Relleno de tierra y compactación, capas de 25cm.	Metros cúbicos	263,25	34.000	8.950.500	176,00	0	176,00	67%	0%	67%	0,015	0,000	0,015
6	72131701-002	Construcción de empedrado - Extracción de tubos de hormigon existentes	Unidad	14	81.500	1.141.000	14,00	0,00	14,00	100%	0%	100%	0,003	0,000	0,003
7	72131701-002	Construcción de empedrado de piedra basalto	Metros cuadrados	4.693,4	31.000	145.495.400	1.550,00	150,00	1.700,00	33%	3%	36%	0,121	0,012	0,132
8	72131701-002	Construcción de empedrado - Provisión de tierra para colchon de empedrado	Metros cúbicos	4.693,4	7.000	32.853.800	387,50	1.662,50	2.050,00	8%	35%	44%	0,007	0,029	0,036

Gregorio Vera Jara
Lapacho Construcciones
Tel. (0975) 604 963
Chel. Bogado - Py.

Fiscalización de Obras

Ing. Carlos J. Amarilla
Ingeniero Civil
Reg. MOPC N° 3.885

ANEXO 1

Comparación de Precios del llamado CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN ITAPUA POTY Y TOMAS R. PEREIRA - PLURIANUAL con ID: 435860 - Construcción de empedrado en María Auxiliadora Distrito de Tomás R. Pereira

Construcción de empedrado en María Auxiliadora Distrito de Tomás R. Pereira

CONTRATO N° 74/2023 - PLAZO 150 DIAS

mar-24

					GREGORIO VERA JARA		AVANCE EN CANTIDAD			AVANCE EN PORCENTAJE			AVANCE EN INCIDENCIA		
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Anterior	Presente	Actual	Anterior	Presente	Actual	Anterior	Presente	Actual
9	72131701-002	Construcción de empedrado - Compactación de empedrado (sellado, 1ra, 2da y 3ra compactación final). Incluye relleno de tierra sobre empedrado	Metros cuadrados	4.693,4	2.950	13.845.530	1.550,00	0,00	1.550,00	33%	0%	33%	0,011	0,000	0,011
10	72131701-002	Construcción de empedrado - Cordón escondido de 15x30cm de hormigón (fck= 180 kg/cm2).	Metros cúbicos	68,13	950.000	64.723.500	22,50	16,28	38,78	33%	24%	57%	0,054	0,039	0,092
11	72131701-002	Construcción de empedrado - Alcantarillado Tubular de 1,00 m de diámetro, incluye provisión, excavación, colocación de tubos y base de H° pobre.	Metro lineal	8	1.150.000	9.200.000	8,00	0	8,00	100%	0%	100%	0,023	0,000	0,023
12	72131601-004	Colocacion de hormigon armado - Losa de H° A° (fck= 210 kg/cm2), doble armadura con malla Ø 8 cada 20cm, sobre linea de alcantarillado celular y tubos	Metros cúbicos	4,79	1.800.000	8.622.000	4,79	0	4,79	100%	0%	100%	0,022	0,000	0,022
13	72131701-002	Construcción de empedrado - Alcantarillado celular de H°A° de 2,00X2,00m esp. 20cm, incluye provisión, excavación, colocación y base de H° pobre.	Metro lineal	8	5.100.000	40.800.000	8,00	0	8,00	100%	0%	100%	0,102	0,000	0,102
14	72131701-002	Construcción de empedrado - Cabezal de H° A° (Hormigón elaborado fck=210kg/cm2). Según diseño.	Metros cúbicos	20,42	1.850.000	37.777.000	0,00	0,00	0,00	0%	0%	0%	0,000	0,000	0,000
15	72131701-002	Construcción de empedrado - Barandas de protección de H° A° visto prefabricado . Segun diseño	Metro lineal	6	605.000	3.630.000	0,00	0,00	0,00	0%	0%	0%	0,000	0,000	0,000
16	72131601-013	Limpieza de obra - Limpieza inicial y final de obra	Metros cuadrados	4.693,4	1.350	6.336.090	3.125,00	0,00	3.125,00	67%	0%	67%	0,011	0,000	0,011
Precio Total						**398.621.800**							**42,08%**	**8,70%**	**50,78%**

Gregorio Vera Jara
Lapacho Construcciones
Tel. (0976) 604 963
Cnel. Bogado - Py.

GOBERNACIÓN DE ITAPÚA - Fiscalización de Obras

Ing. Carlos J. Amarilla
Ingeniero Civil
Reg. MOPC N° 3.885

5

GOBERNACIÓN DE ITAPÚA																			
Secretaría de Obras Públicas																			
Precio Contratación Gs:		398.621.800																	
PLANILLAS DE IMPORTES POR PRECIO UNITARIO																			
OBRA: CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN ITAPUA POTY Y TOMAS R. PEREIRA - PLURIANUAL con ID: 435860 - Construcción de empedrado en María Auxiliadora Distrito de Tomás R. Pereira																			
							EN PORCENTAJE			EN INCIDENCIA			CANTIDAD EJECUTADA			MONTO EJECUTADO EN GS.		
		UNIDAD	CANT	P. UNITARIO	P. TOTAL	INCIDENCIA	ACUMUL. ANTERIOR	PRESENTE	ACUMUL. TOTAL	ACUMUL. ANTERIOR	PRESENTE	ACUMUL. TOTAL	ACUM. ANT.	PRESENTE	ACUM. TOTAL	ACUM. ANT.	PRESENTE	ACUM. TOTAL
1	Cartel metalico con soporte -	Unidad	1	1.100.000	1.100.000	0,0028	100,00%	0,00%	100,00%	0,0028	0,0000	0,0028	1,00	0,00	1,00	1.100.000	-	1.100.000
2	Preparacion de obra - Movilización, carteles de seguridad y señalización	Unidad Medida Global	1	5.650.000	5.650.000	0,0142	100,00%	0,00%	100,00%	0,0142	0,0000	0,0142	1,00	0,00	1,00	5.650.000	-	5.650.000
3	Replanteo y marcación - Relevamiento topografico, incluye replanteo y marcación	Metro lineal	760	7.500	5.700.000	0,0143	100,00%	0,00%	100,00%	0,0143	0,0000	0,0143	760,00	0,00	760,00	5.700.000	-	5.700.000
4	Construcción de empedrado - Apertura de caja y traslado de materiales sobrantes.	Metros cúbicos	609,38	21.000	12.796.980	0,0321	67,28%	22,97%	90,26%	0,0216	0,0074	0,0290	410,00	140,00	550,00	8.610.000	2.940.000	11.550.000
5	Construcción de empedrado - Terraplen: Relleno de tierra y compactación, capas de 25cm.	Metros cúbicos	263,25	34.000	8.950.500	0,0225	66,86%	0,00%	66,86%	0,0150	0,0000	0,0150	176,00	0,00	176,00	5.984.000	-	5.984.000
6	Construcción de empedrado - Extracción de tubos de hormigon existentes	Unidad	14	81.500	1.141.000	0,0029	100,00%	0,00%	100,00%	0,0029	0,0000	0,0029	14,00	0,00	14,00	1.141.000	-	1.141.000
7	Construcción de empedrado de piedra basalto	Metros cuadrados	4.693,4	31.000	145.495.400	0,3650	33,03%	3,20%	36,22%	0,1205	0,0117	0,1322	1.550,00	150,00	1.700,00	48.050.000	4.650.000	52.700.000
8	Construcción de empedrado - Provisión de tierra para colchon de empedrado	Metros cúbicos	4.693,4	7.000	32.853.800	0,0824	8,26%	35,42%	43,68%	0,0068	0,0292	0,0360	387,50	1.662,50	2.050,00	2.712.500	11.637.500	14.350.000
9	Construcción de empedrado - Compactación de empedrado (sellado, 1ra, 2da y 3ra compactación final) incluye relleno de tierra sobre empedrado	Metros cuadrados	4.693,4	2.950	13.845.530	0,0347	33,03%	0,00%	33,03%	0,0115	0,0000	0,0115	1.550,00	0,00	1.550,00	4.572.500	-	4.572.500
10	Construcción de empedrado - Cordón escondido de 15x30cm de hormigón (fck= 180 kg/cm2).	Metros cúbicos	68,13	950.000	64.723.500	0,1624	33,03%	23,90%	56,92%	0,0536	0,0388	0,0924	22,50	16,28	38,78	21.375.000	15.466.000	36.841.000
11	Construcción de empedrado - Alcantarillado Tubular de 1,00 m de diámetro, incluye provisión, excavación, colocación de tubos y base de H° pobre.	Metro lineal	8	1.150.000	9.200.000	0,0231	100,00%	0,00%	100,00%	0,0231	0,0000	0,0231	8,00	0,00	8,00	9.200.000	-	9.200.000
12	Colocacion de hormigon armado - Losa de H° A° (fck= 210 kg/cm2), doble armadura con malla Ø 8 cada 20cm, sobre linea de alcantarillado celular y tubos	Metros cúbicos	4,79	1.800.000	8.622.000	0,0216	100,00%	0,00%	100,00%	0,0216	0,0000	0,0216	4,79	0,00	4,79	8.622.000	-	8.622.000
13	Construcción de empedrado - Alcantarillado celular de H°A° de 2,00X2,00m esp. 20cm, incluye provisión, excavación, colocación y base de H° pobre.	Metro lineal	8	5.100.000	40.800.000	0,1024	100,00%	0,00%	100,00%	0,1024	0,0000	0,1024	8,00	0,00	8,00	40.800.000	-	40.800.000
14	Construcción de empedrado - Cabezal de H° A° (Hormigón elaborado fck=210kg/cm2). Según diseño.	Metros cúbicos	20,42	1.850.000	37.777.000	0,0948	0,00%	0,00%	0,00%	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00	,0,00	-	-	-

mar'24

Cert. N° 3

Planilla I

Gregorio Vera Jara
Lapacho Construcciones
Tel. (0975) 604 963
Cnel. Bogado - Py.-

Fiscalización de Obras

Ing. Carlos J. Amarilla
Ingeniero Civil
Reg. MOPC N° 3.885

GOBERNACIÓN DE ITAPÚA																	mar'24		Cert. N° 3
Secretaría de Obras Públicas																			Planilla I
Precio Contratación Gs:	398.621.800	-																	
PLANILLAS DE IMPORTES POR PRECIO UNITARIO																			
OBRA: CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN ITAPUA POTY Y TOMAS R. PEREIRA - PLURIANUAL con ID: 435860 - Construcción de empedrado en María Auxiliadora Distrito de Tomás R. Pereira																			
							EN PORCENTAJE			EN INCIDENCIA			CANTIDAD EJECUTADA			MONTO EJECUTADO EN GS.			
		UNIDAD	CANT	P. UNITARIO	P. TOTAL	INCIDENCIA	ACUMUL. ANTERIOR	PRESENTE	ACUMUL. TOTAL	ACUMUL. ANTERIOR	PRESENTE	ACUMUL. TOTAL	ACUM. ANT.	PRESENTE	ACUM. TOTAL	ACUM. ANT.	PRESENTE	ACUM. TOTAL
15	Construcción de empedrado - Barandas de protección de H° A° visto prefabricado . Segun diseño	Metro lineal	6	605.000	3.630.000	0,0091	0,00%	0,00%	0,00%	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00	0,00	-	-	-
16	Limpieza de obra - Limpieza inicial y final de obra	Metros cuadrados	4.693,4	1.350	6.336.000	0,0159	66,58%	0,00%	66,58%	0,0106	0,0000	0,0106	3.125,00	0,00	3.125,00	4.218.750	-	4.218.750
PRECIO TOTAL					398.621.800	1,00				42,02%	8,70%	50,72%				167.735.750	34.693.500	202.429.250

Gregorio Vera Jara
Lapacho Construcciones
Tel. (0975) 604 963
Cnel. Bogado - Py.-

CONTRATISTA

GOBERNACIÓN DE ITAPÚA

Fiscalización de Obras

Ing. Carlos J. Amarilla
Ingeniero Civil
Reg. MOPC N° 3.885

GOBERNACIÓN DE ITAPÚA

OBRA: CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN ITAPUA POTY Y TOMAS R. PEREIRA - PLURIANUAL con ID: 435860 - Construcción de empedrado en María Auxiliadora Distrito de Tomás R. Pereira

Contrato N°: 74/23	
Monto del Contrato: 398.621.800 Gs	**Term. Prevista: 18/05/2024**
Plazo Contractual: 150 días	**Ampliaciones:**
Inicio de Obra: 20/12/2023	**Periodo: mar'24**

CUADRO DE AVANCE PREVISTO POR CONTRATO

Contrato N°: 73/23

PERIODO	PREVISTO GS.		EJECUTADO GS.		PREVISTO %		EJECUTADO %	
	MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO
INICIO	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
dic'23/ene'24	97.617.750	97.617.750	97.617.750	97.617.750	24,49%	24,49%	24,49%	24,49%
ene'24/feb'24	141.384.535	239.002.285	70.118.000	167.735.750	35,47%	59,96%	17,59%	42,08%
feb'24/mar'24	72.200.695	311.202.980	34.693.500	202.429.250	18,11%	78,07%	8,70%	50,78%
mar'24/abr'24	45.566.750	356.769.730			11,43%	89,50%		
abr'24/may'24	41.852.070	398.621.800			10,50%	100,00%		

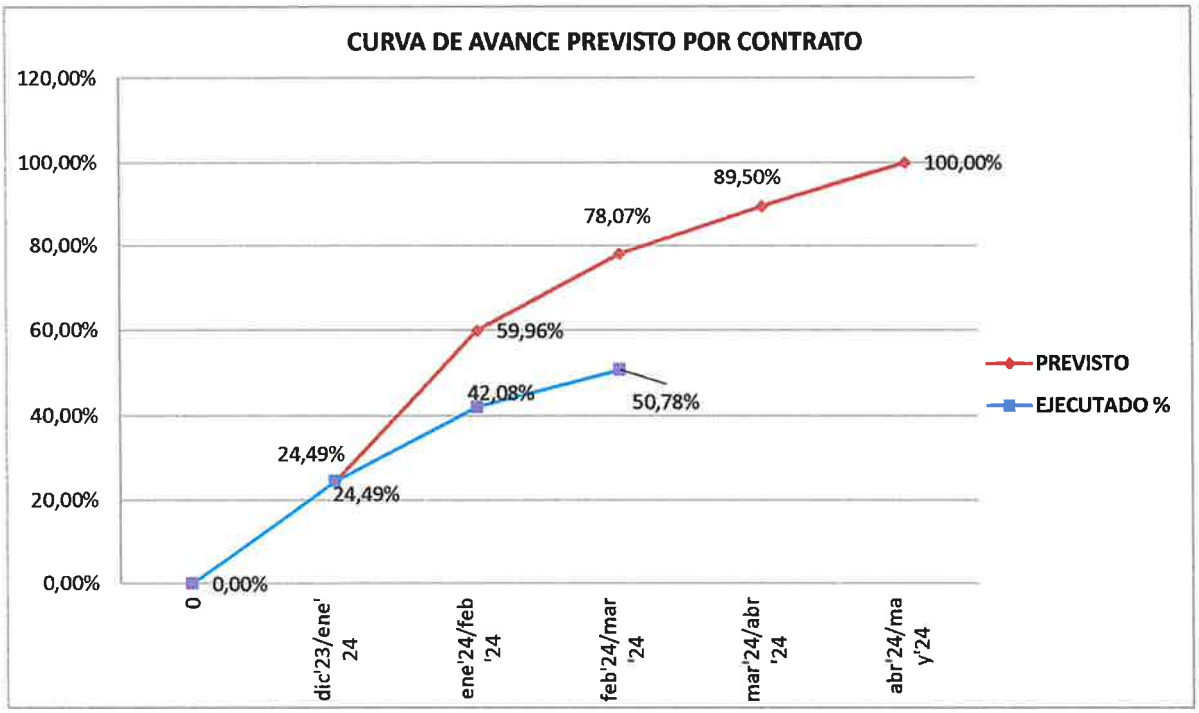

Gregorio Vera Jara
Lapacho Construcciones
Tel. (0975) 604 963
Cnel. Bogado - Py.-

Contratista

GOBERNACION DEPARTAMENTAL DE ITAPUA
Fiscalización de Obras

Gobernación de Itapúa

Ing. Carlos J. Amarilla
Ingeniero Civil
Reg. MOPC N° 3.033

GOBERNACIÓN DE ITAPÚA

CRONOGRAMA DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO

Lapacho Construcciones

R.U.C.: 1.218.178 - 1

OBRA: CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN ITAPUA POTY Y TOMAS R. PEREIRA - PLURIANUAL con ID: 435860 - Construcción de empedrado en María Auxiliadora Distrito de Tomás R. Pereira

							PERIODO				
Item	Rubros	Unidad	Cantidad	Precio unitario IVA incluido Gs.	Precio Total Gs.	0	1	2	3	4	5
							dic'23/ene'24	ene'24/feb'24	feb'24/mar'24	mar'24/abr'24	abr'24/may'24
1	Cartel metalico con soporte -	Unidad	1	1.100.000	1.100.000		1.100.000				
2	Preparacion de obra - Movilización, carteles de seguridad y señalización	Unidad Medida Global	1	5.650.000	5.650.000		5.650.000				
3	Replanteo y marcación - Relevamiento topografico, incluye replanteo y marcación	Metro lineal	760	7.500	5.700.000		1.875.000	1.900.000	1.925.000		
4	Construcción de empedrado - Apertura de caja y traslado de materiales sobrantes.	Metros cúbicos	609,38	21.000	12.796.980		6.825.000	4.265.660	1.706.320		
5	Construcción de empedrado - Terraplen: Relleno de tierra y compactación, capas de 25cm.	Metros cúbicos	263,25	34.000	8.950.500		3.264.000	5.686.500			
6	Construcción de empedrado - Extracción de tubos de hormigon existentes	Unidad	14	81.500	1.141.000		-	1.141.000			
7	Construcción de empedrado de piedra basalto	Metros cuadrados	4.693,4	31.000	145.495.400		48.050.000	25.000.000	25.000.000	22.500.000	24.945.400
8	Construcción de empedrado - Provisión de tierra para colchon de empedrado	Metros cúbicos	4.693,4	7.000	32.853.800		2.712.500	6.850.000	6.850.000	8.560.000	7.881.300
9	Construcción de empedrado - Compactación de empedrado (sellado, 1ra, 2da y 3ra compactación final). Incluye relleno de tierra sobre empedrado	Metros cuadrados	4.693,4	2.950	13.845.530		4.572.500	2.850.000	1.650.000	3.520.000	1.253.030
10	Construcción de empedrado - Cordón escondido de 15x30cm de hormigón (fck= 180 kg/cm2).	Metros cúbicos	68,13	950.000	64.723.500		21.375.000	16.180.875	16.180.875	10.986.750	
11	Construcción de empedrado - Alcantarillado Tubular de 1,00 m de diámetro, incluye provisión, excavación, colocación de tubos y base de H° pobre.	Metro lineal	8	1.150.000	9.200.000		-	9.200.000			
12	Colocacion de hormigon armado - Losa de H° A° (fck= 210 kg/cm2), doble armadura con malla Ø 8 cada 20cm, sobre linea de alcantarillado celular y tubos	Metros cúbicos	4,79	1.800.000	8.622.000		-	8.622.000			
13	Construcción de empedrado - Alcantarillado celular de H°A° de 2,00X2,00m esp. 20cm, incluye provisión, excavación, colocación y base de H° pobre.	Metro lineal	8	5.100.000	40.800.000		-	40.800.000			
14	Construcción de empedrado - Cabezal de H° A° (Hormigón elaborado fck=210kg/cm2). Según diseño.	Metros cúbicos	20,42	1.850.000	37.777.000		-	18.888.500	18.888.500		
15	Construcción de empedrado - Barandas de protección de H° A° visto prefabricado . Segun diseño	Metro lineal	6	605.000	3.630.000		-				3.630.000
16	Limpieza de obra - Limpieza inicial y final de obra	Metros cuadrados	4.693,4	1.350	6.336.090		2.193.750				4.142.340
	PRECIO TOTAL				398.621.800		97.617.750	141.384.535	72.200.695	45.566.750	41.852.070
						Avance Programado Gs	97.617.750	141.384.535	72.200.695	45.566.750	41.852.070

Gregorio Vera Jara
Lapacho Construcciones
Tel. (0975) 604 963
Cnel. Bogado - Py.

Ing. Carlos J. Amarilla
Ingeniero Civil
Reg. MOPC N° 3.885

GOBERNACIÓN DE ITAPÚA

CRONOGRAMA DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO

Lapacho Construcciones

R.U.C.: 1.218.178 - 1

OBRA: CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN ITAPUA POTY Y TOMAS R. PEREIRA - PLURIANUAL con ID: 435860 - Construcción de empedrado en María Auxiliadora Distrito de Tomás R. Pereira

Item	Rubros	Unidad	Cantidad	Precio unitario IVA Incluido Gs.	Precio Total Gs.		PERIODO 1	2	3	4	5
					Avance Programado Acumulado Gs		97.617.750	239.002.285	311.202.980	356.769.730	398.621.800
					% Programado	#	24,49%	35,47%	18,11%	11,43%	10,50%
					% Programado Acumulado	#	24,49%	59,96%	78,07%	89,50%	100,00%

Gregorio Vera Jara
Lapacho Construcciones
Tel. (0975) 604 963
Cnel. Bogado - Py.-

CONTRATISTA

Fiscalización de Obras

GOBERNACIÓN DE ITAPÚA

Ing. Carlos J. Amarilla
Ingeniero Civil
Reg. MOPC N° 3.885

10

INFORME DE OBRAS – CERTIFICADO NRO 3

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO PÉTREO TIPO EMPEDRADO CON CORDÓN ESCONDIDO DE HORMIGÓN - MARIA AUXILIADORA

EMPRESA CONTRATISTA: SR. GREGORIO VERA JARA	**Nº DE TELÉFONO:** 0985 - 916562	**Nº CONTRATO:** 74/2023	**FECHA DE INICIO:** 19-12-2023
MODALIDAD / LOTE: CO Nº 36/2023	**PLAZO CONTRACTUAL:** 150 DÍAS	**MONTO DEL CONTRATO:** 398.621.800 Gs.	**TERMINACIÓN PREVISTA:** 18-05-2023.

Fiscal a Cargo: Secretaria de Obras Públicas.

Fecha de Visita: marzo del 2023

Avance de Obra: 50.78%

OBSERVACIONES GENERALES:

La obra posee atraso con relación a su cronograma físico financiero, cuadro y curva de avance previsto. Se ha remitido Orden de Servicio solicitando acelerar el avance de la obra.

Cuenta con las materiales in situ y necesarios para su continuidad, además de los equipos y herramientas menores.

Se está ejecutando actualmente pavimento tipo empedrado.

Se anexa registro fotográfico de avances.

Fiscalización de Obras

Ing. Carlos J. Amar
Ingeniero Civ
Reg. MOPC N° 3

Teléf: +59571204568
Correos: general@itapua.gov.py
generalitapuapy@gmail.com

Gobernación de Itapúa / RUC: 80009721-1
Dirección: Avda. Cnel. Luis Irrazábal e/ Cap. Pedro Juan Caballero y Sgto. Reverchon
Encarnación - Itapúa - Paraguay

15

Teléf: +59571204568
Correos: general@itapua.gov.py
generalitapuapy@gmail.com

Gobernación de Itapúa / RUC: 80009721-1
Dirección: Avda. Cnel. Luis Irrazábal e/ Cap. Pedro Juan Caballero y Sgto. Reverchon
Encarnación - Itapúa - Paraguay

Ing. Carlos J. Amarilla
Ingeniero Civil
Reg. MOPC N° 3.885

16

80009721-1
Teléf: +595712045688
Correos: general@itapua.gov.py
generalitapuapy@gmail.com
Dirección: Avda. Cnel. Luis Irrazábal e/ Cap. Pedro Juan Caballero y Sgto. Reverchon
Encarnación - Itapúa - Paraguay

Ing. Carlos J. Amarilla
Ingeniero Civil
Reg. MOPC N° 3.885
