Informe Técnico Nº 18 /2022.

A: **Arq. Adrián González.**
Director de Obras Públicas Municipales.

De: **Ing. Benigno Ramírez**
Jefe Obras Públicas.

Motivo: A fin de elevar a su consideración el pedido de Pago solicitada por la firma SAMMAR S.A. bajo nota presentada en fecha 03 de junio del 2022 correspondiente a la provisión de insumos para bacheos asfalticos correspondiente al Contrato Nº7/2022.

Fecha: **8 de Junio de 2022.-**

Corresponde a la nota presentada de fecha 03 de junio del 2022 presentado por la Ing. María Isabel Achon de Farías, en representación de la Firma SAMMAR S.A referente a pedido de pago por la Provisión de Mezcla Asfáltica para bacheos en la ciudad de Luque correspondiente al contrato Nº 07/2022.

Conforme al informe presentado por el Jefe de planta asfáltica bajo el informe Nº 5/ 2022 Los trabajos se iniciaron conforme al siguiente cuadro comparativo en resumen:

DESCRIPCION/ DIRECCION DE CALLES INTERVENIDAS	PRODUCCION BACHEO ASFALTICO	
FECHA: 13/05/2022	**Superficie /m2**	**Cantida d TN**
Calle Salyn Yubi e/ Oficial Santacruz	13,92	1,50
e/ Oficial Santacruz	31,36	2,90
e/ Oficial Santacruz	41,58	3,33
e/ Oficial Santacruz	42,9	3,43
e/ Oficial Santacruz	28	2,80
e/ Oficial Santacruz	1,7	0,15
e/ Oficial Santacruz	3,45	0,26
e/ Oficial Santacruz	2,08	0,18
e/ Oficial Santacruz	2,8	0,25
TOTAL GENERAL	**167,79**	**14,80**

Se adjunta al presente informe:

- Informe del jefe de Planta Asfáltica.
- Planilla de calles Intervenidas
- Boletas de Remisiones de la Firma
- Pedido de Pago presentado por la Firma
- Tomas fotográficas de la Ejecución.

Ing. Benigno D. Ramirez B.
Jefe de Obras Públicas
Municipalidad de Luque

Luque, 08 de Junio de 2022

Informe N° 05

A: Arq. Adrián González
Director de Obras y Servicios
Municipalidad de Luque
De: Rigoberto Fleitas
Jefe de la Planta Asfáltica

Ref.: Trabajos ejecutados de bacheos – SAMMAR S.A

Presente

Me dirijo a ud. y por su intermedio a donde corresponda, a fin de poner a su conocimiento los trabajos realizados de bacheos en distintos puntos del micro centro, a continuación se detalla según los días de ejecución:

- Equipos Utilizados
- Insumos Utilizados
- Personales requeridos para las tareas a ejecutar
- Calles intervenidas
- Resumen de m² y ton de concreto asfaltico
- Fotos de los trabajos ejecutados

PROCESADO

MUNICIPALIDAD DE LUQUE
PLANTA ASFALTICA
Dirección de Obras y Servicios

1.) De la fecha 13/05/2022:

1.1) Equipos utilizados

Ítem	Operador y/o Chofer	Equipos y/o Vehículos	Código	Comb. Cant. (lts)
1	Matías Pereira	Mini compactador	ARX26K	25
2	Cesar Mesa	Mini cargador	CAT 01	25
3	Jorge Caballero	Volquete Sinotruk simple eje	HDZ-383	40
4	Oscar Peralta	Volquete Mercedes Benz simple eje	BHE-027	30
5	Abel Ojeda	Mochila Soplador Sthil	S-001	20
6	Julio Torres	Pulverizador Jacto	PJ-001	9

1.2) Insumos Utilizados

Ítem	Descripción	Cant.
1	Emulsión Asfáltica (RR1C)	70 lts
2	Concreto Asfaltico	14,80 ton

PROCESADO

1.3) Personales requeridos para las tareas a ejecutar

Ítem	Nombre y Apellido	Nro de C.I	Función
1	Matías Pereira	4.170.969	Operador de mini compactador
2	Cesar Mesa	2.311.343	Operador de mini cargador
3	Jorge Caballero	2.820.624	Chofer de volquete simple eje HDZ-383
4	Oscar Peralta	2.034.513	Chofer de volquete simple eje BHE-027
5	Abel Ojeda	5.721.874	Ayudante de pista (Mochila soplador)
6	Julio Torres	4.055.508	Regador de Neumáticos (Pulverizador)
7	Enrique Arguello	5.468.013	Palero
8	Teodoro Báez	1.345.404	Rastrillero
9	Isidro Palma	3.664.454	Palero
10	Rigoberto Fleitas	3.856.126	Jefe de pista
11	Andrés Saldivar	4.871.252	Regador de emulsión

MUNICIPALIDAD DE LUQUE
PLANTA ASFALTICA
Dirección de Obras y Servicios

1.4) Calles intervenidas

Trabajos realizados de la fecha 13/05/2022

Nro de Remisión: 001-001-0000089 – SAMMAR S.A

A.) Bacheo													
a.1) Calle: Salyn Yubi													
Item	Desde	Hasta	Long	Ancho	Area	Espesor	Volumen	Dens.de la mezcla asfaltica	Cantidad	Ejecución	Lado		
			(ml)	(m)	(m2)	(m)	(m3)	(ton/m3)	(ton.)	(fecha)	LI	C	LD
1	e. Inspector Romero		5,80	2,40	13,92	0,04	0,60	2,5	1,50	13/5/22			
2	e. Oficial Santacruz		5,60	5,60	31,36	0,04	1,16	2,5	2,90				
3	e. Oficial Santacruz		15,40	2,70	41,58	0,03	1,33	2,5	3,33				
4	e. Oficial Santacruz		28,60	1,50	42,90	0,03	1,37	2,5	3,43				
5	e. Oficial Santacruz		5,60	5,00	28,00	0,04	1,12	2,5	2,80				
6	e. Oficial Santacruz		1,70	1,00	1,70	0,04	0,06	2,5	0,15				
7	e. Oficial Santacruz		2,30	1,50	3,45	0,03	0,10	2,5	0,26				
8	e. Oficial Santacruz		1,30	1,60	2,08	0,04	0,07	2,5	0,18				
9	e. Oficial Santacruz		2,00	1,40	2,80	0,04	0,10	2,5	0,25				
Cantidad					167,79				14,80				

Total del Día (ton)	14,80	13/5/22
Total del Día (m2)	167,79	

Atentamente.-

Rigoberto Fleitas
Jefe de la Planta Asfáltica
Municipalidad de Luque

PROCESADO

MUNICIPALIDAD DE LUQUE
PLANTA ASFALTICA
Dirección de Obras y Servicios

.....

Rigoberto Fleitas

Jefe de Planta Asfáltica

Fotos de los trabajos ejecutados - Calle SalymYubi

PROCESADO

MUNICIPALIDAD DE LUQUE
PLANTA ASFALTICA
Dirección de Obras y Servicios

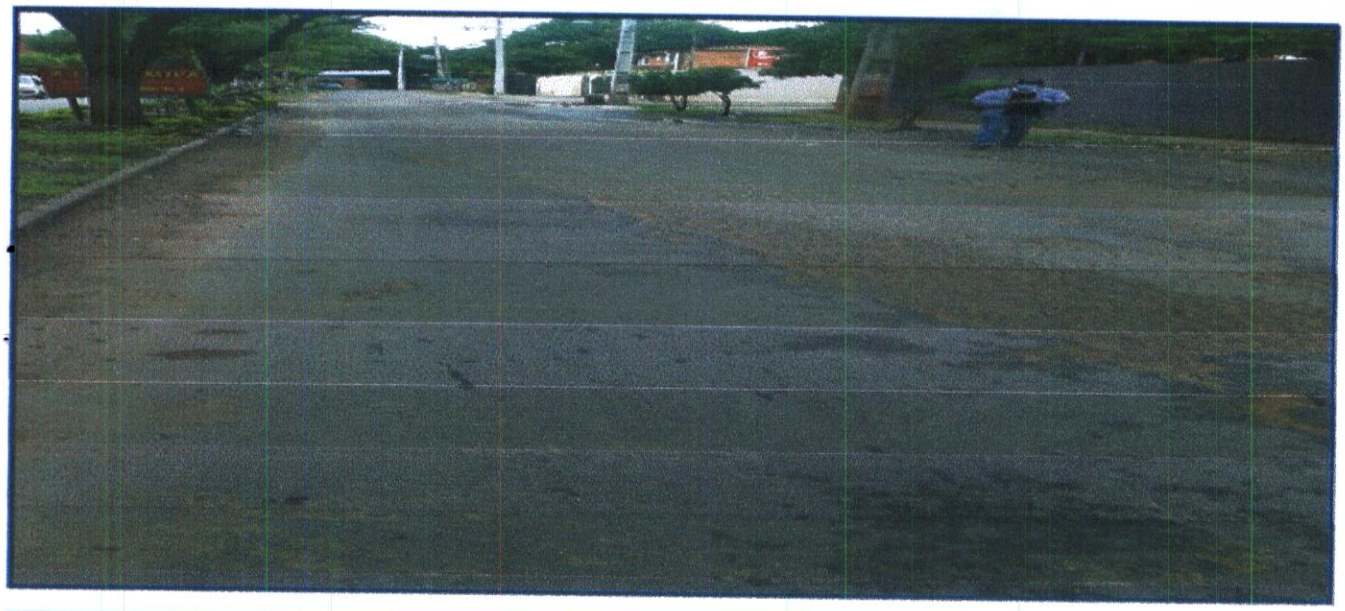

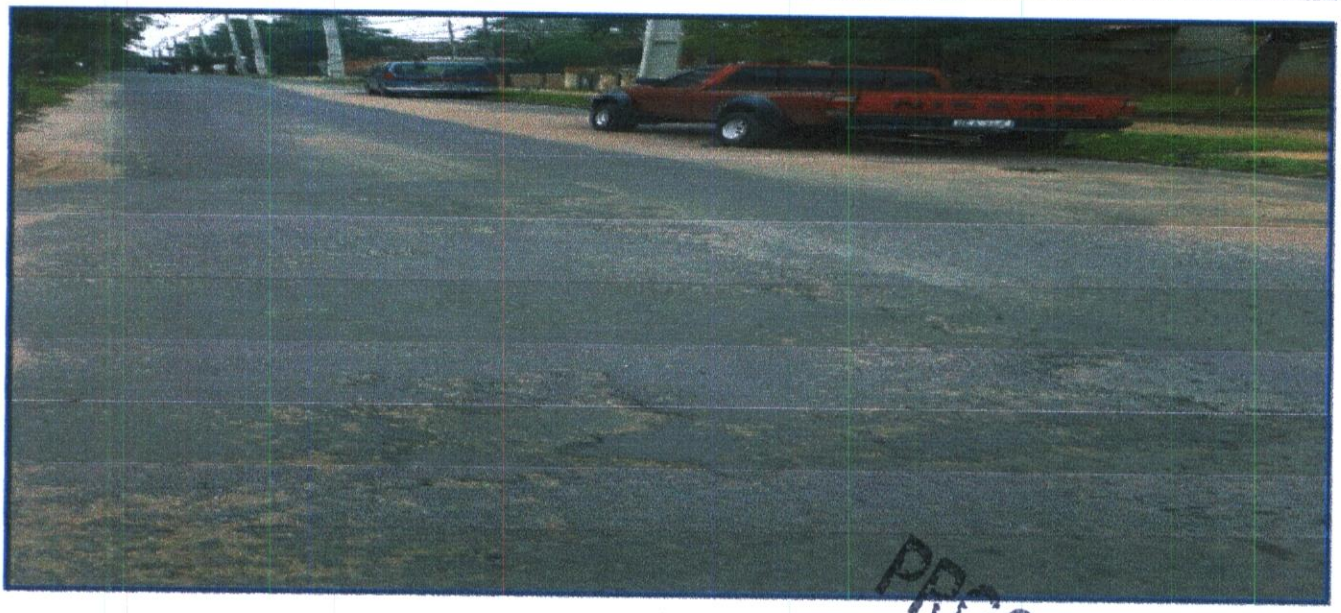

PRECESADO

MUNICIPALIDAD DE LUQUE
PLANTA ASFALTICA
Dirección de Obras y Servicios
