GOBERNACION DE ITAPÚA

RESÚMEN DEL CERTIFICADO BÁSICO N° 7

Mes: Julio

CONCURSO DE OFERTAS N°33/2023 - Construcción de empedrado en Coronel Bogado - Lote N° 01 - Plurianual con ID: 435.867									
Posición	Conceptos	Importes Autorizados		Importes Certificados					
				Hasta Certificado Anterior		Presente Certificado		Total Certificado a la Fecha	
		%	(1)	% Avance de Obra	(2)	% Avance de Obra	(3)	% Avance de Obra	(2+3)
A	Certificaciones de Obra Ejecutada por Precio Unitario								
A.I	CONCURSO DE OFERTAS N°33/2023 - Construcción de empedrado en Coronel Bogado - Lote N° 01 - Plurianual con ID: 435.867	100%	354.608.355	97,36%	345.241.545	2,15%	7.627.360	99,51%	352.868.905
A	**Total por Contrato**	**100%**	**354.608.355**	**97,36%**	**345.241.545**	**2,15%**	**7.627.360**	**99,51%**	**352.868.905**

B	Deducciones a la fecha			Hasta Certificado Anterior	Presente Certificado	Total Certificado a la Fecha
B.I	Devolución de Anticipo	*20,00%*	70.921.671	69.048.308	1.873.363	70.921.671
B.II	Para Fondo de Reparo	*0,00%*	0	0	0	0
B	**Total Deducciones**		**70.921.671**	**69.048.308**	**1.873.363**	**70.921.671**
C.I	**Importe Liquido a Pagar Según Presente Certificado (A - B)**				5.753.997	
C.II	Multas				0	
C	**Importe Neto a Pagar Según Presente Certificado (A - B)**				**5.753.997**	

Certificado Básico Nº	**7**
Mes:	**Julio**
Contrato N°:	**85/2023**
Monto Básico:	**354.608.355**
Contratista:	**A&F Ingeniería Consultoría y Construcción S.R.L.**
Fecha de Inicio:	**20-dic-23**
Plazo de Ejecución:	**150 días**
Fecha de terminación prevista:	**3-may-24**
Prórroga:	**51 días**
Fecha de terminación con prórroga:	**8-jul-24**
Póliza de Anticipo - Vigencia hasta:	**10-ago-24**
Póliza Ejec. Contrato - Vigencia hasta:	**10-ago-24**

SON GUARANIES: CINCO MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE

A & F Ingeniería Consultoría y Construcción S.R.L. RUC: 80094725 - 8

A&F Ingeniería Consultoría y Construcción S.R.L.
Contratista-Representante Legal

Fiscal de Obras
Gobernación de Itapúa

GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE ITAPÚA - Secretaría de Obras Públicas y Transporte

Secretario de Obras Públicas y Transporte
Gobernación de Itapúa

Ing. Fernando Oreggioni
Secretario Departamental de Obras Públicas y Transporte
Gobernación de Itapúa

Claudio Gabriel Valenzuela
Ing. Civil
Reg. MOPC 31123

ACTA DE MEDICIÓN

CERTIFICADO BASICO Nº 07

CONTRATO Nº 85/2023

REFERENCIA: CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO EN CORONEL BOGADO – Lote N°01 – Plurianual con ID: 435.867

CONTRATISTA: A&F INGENIERÍA CONSULTORÍA Y CONSTRUCCIÓN S.R.L.

En la Ciudad de Coronel Bogado, Departamento de Itapúa, República del Paraguay, a los ocho días del mes de julio del 2024, se reúnen en representación de la Gobernación de Itapúa, el Ing. Claudio Gaona, encargado de la Verificación y Fiscalización de las Obras, y el Ing. Fabio Fernández, representante legal de la empresa contratista. -

Quienes suscriben la presente Acta, han procedido a la verificación y medición de los trabajos ejecutados durante el mes de julio del corriente.

En la verificación y medición realizada se observó que las obras se encuentran de acuerdo a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones y los resultados se anexan en las planillas correspondientes.

De plena conformidad de las partes, se suscribe el presente Acta en 4 (cuatro) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en el lugar y fecha indicados más arriba. -

A & F Ingeniería
Consultoría y Construcción S.R.L.
RUC: 80094725 - 8

Contratista

Fiscal de Obras
Gobernación de Itapúa

Claudio Gaona Valenzuela
Ing. Civil
Reg. MOPC 38423

CERTIFICADO BÁSICO DE OBRAS N° 7

PLANILLA DE MEDICIÓN Y CERTIFICADO

MES: Julio

CONCURSO DE OFERTAS N°33/2023 - Construcción de empedrado en Coronel Bogado - Lote N° 01 - Plurianual con ID: 435.867			
CONTRATISTA:	A&F Ingeniería Consultoría y Construcción S.R.L.	**FECHA DE INICIO:**	20-dic-23
MONTO DE LA OFERTA:	354.608.355	**FECHA DE TERMINACION PREVISTA:**	8-jul-24
CONTRATO N°:	85/2023	**PRÓRROGA:**	51 días
PLAZO DE EJECUCIÓN:	150 días	**FECHA DE MEDICIÓN**	8-jul-24

CAUDRO DE PRECIOS ADJUDICADOS						INCIDENCIA DEL RUBRO SOBRE EL TOTAL	PLANILLA DE MEDICIÓN						PLANILLA DE CERTIFICADO BÁSICO					
CONCURSO DE OFERTAS N°33/2023 - Construcción de empedrado en Coronel Bogado - Lote N° 01 - Plurianual con ID: 435.867							EN PORCENTAJE			EN INCIDENCIA			CANTIDAD EJECUTADA			CANTIDAD EJECUTADA EN GS.		
Item	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA Incluido)	Precio total		ACUMUL. ANTERIOR	PRESENTE	ACUMUL. TOTAL	ACUMUL. ANTERIOR	PRESENTE	ACUMUL. TOTAL	ACUMUL. ANTERIOR	PRESENTE	ACUMUL. TOTAL	ACUMUL. ANTERIOR	PRESENTE	ACUMUL. TOTAL
1	Cartel de Obra (2x1,5)	Unidad	1,00	1.000.000	1.000.000	0,003	100,00%	0,00%	100,00%	0,003	-	0,003	1,00	0,00	1,00	1.000.000	0	1.000.000
2	Movilización, carteles de seguridad y señalización - Preparacion de obra	Unidad Medida Global	1,00	4.325.000	4.325.000	0,012	100,00%	0,00%	100,00%	0,012	-	0,012	1,00	0,00	1,00	4.325.000	0	4.325.000
3	Relevamiento topografico, incluye replanteo y marcación - de obra	Metro lineal	630,00	7.650	4.819.500	0,014	100,00%	0,00%	100,00%	0,014	-	0,014	630,00	0,00	630,00	4.819.500	0	4.819.500
4	Apertura de caja y traslado de materiales sobrantes - Preparacion de obra	Metros cúbicos	1.126,13	19.000	21.396.470	0,060	100,00%	0,00%	100,00%	0,060	-	0,060	1.126,13	0,00	1.126,13	21.396.470	0	21.396.470
5	Terraplen: Relleno de tierra y compactación, capas de 25cm. - de obra	Metros cúbicos	178,75	31.900	5.702.125	0,016	100,00%	0,00%	100,00%	0,016	-	0,016	178,75	0,00	178,75	5.702.125	0	5.702.125
6	Extracción de tubos de hormigon existentes- de obra	Unidad	18,00	70.000	1.260.000	0,004	100,00%	0,00%	100,00%	0,004	-	0,004	18,00	0,00	18,00	1.260.000	0	1.260.000
7	Empedrado de piedra basalto -Construcción de empedrado	Metros cuadrados	4.092,00	29.700	121.532.400	0,343	100,00%	0,00%	100,00%	0,343	-	0,343	4.092,00	0,00	4.092,00	121.532.400	0	121.532.400
8	Provisión de tierra para colchon de empedrado - Construcción de empedrado	Metros cúbicos	4.092,00	6.800	27.825.600	0,078	100,00%	0,00%	100,00%	0,078	-	0,078	4.092,00	0,00	4.092,00	27.825.600	0	27.825.600
9	Compactación de empedrado (sellado, 1ra, 2da y 3ra compactación final). Incluye relleno de tierra sobre empedrado - Construcción de empedrado	Milimetros cuadrados	4.092,00	2.700	11.048.400	0,031	100,00%	0,00%	100,00%	0,031	-	0,031	4.092,00	0,00	4.092,00	11.048.400	0	11.048.400
10	Cordón escondido de 15x30cm de hormigón (fck= 180 kg/cm2). - Construcción de empadrado	Metros cúbicos	1,89	900.000	1.701.000	0,005	49,05%	50,95%	100,00%	0,002	0,002	0,005	0,93	0,96	1,89	834.300	866.700	1.701.000
11	Cordón visto de hormigón elaborado de 15x40cm, sector paseo central (fck= 180 kg/cm2). - Construcción de empedrado	Metros cúbicos	35,16	950.000	33.402.000	0,094	100,00%	0,00%	100,00%	0,094	-	0,094	35,16	0,00	35,16	33.402.000	0	33.402.000
12	Cordón cunata de hormigón elaborado (fck= 180 kg/cm2) ancho 60cm y 10cm de espesor. -Construcción de empedrado	Metro lineal	623,16	95.000	59.200.200	0,167	97,06%	0,00%	97,06%	0,162	-	0,162	604,85	0,00	604,85	57.460.750	0	57.460.750
13	Baden de H° A° (H° E° fck= 210 kg/cm2), doble armadura malla Ø 8 cada 20cm. Ancho 2,00m y 18cm de espesor. - Construcción de empedrado	Metros cúbicos	15,12	1.750.000	26.460.000	0,075	100,00%	0,00%	100,00%	0,075	-	0,075	15,12	0,00	15,12	26.460.000	0	26.460.000
14	Losa de H° A° (H° E° fck= 210 kg/cm2), 18cm de espesor, doble armadura malla Ø 8 cada 20cm, sobre linea de tubos. - Construcción de empedrado	Metros cúbicos	4,32	1.750.000	7.560.000	0,021	100,00%	0,00%	100,00%	0,021	-	0,021	4,32	0,00	4,32	7.560.000	0	7.560.000
15	Cabezal de H° A° (Hormigón elaborado fck=210kg/cm2). Según diseño. - Construcción de empedrado	Metros cúbicos	2,98	1.750.000	5.215.000	0,015	100,00%	0,00%	100,00%	0,015	-	0,015	2,98	0,00	2,98	5.215.000	0	5.215.000
16	Alcantarillado Tubular de 0,60 m de diámetro, incluye provisión, excavación, colocación de tubos y base de H° pobre. - Construcción de empedrado	Metro lineal	28,00	550.000	15.400.000	0,043	100,00%	0,00%	100,00%	0,043	-	0,043	28,00	0,00	28,00	15.400.000	0	15.400.000
17	Pintura de cordon visto, con latex acrilico -Servicio de pintura	Metro lineal	586,00	2.110	1.236.460	0,003	0,00%	100,00%	100,00%	-	0,003	0,003	0,00	586,00	586,00	0	1.236.460	1.236.460
18	Limpieza Inicial y final de obra	Metros cuadrados	4.092,00	1.350	5.524.200	0,016	0,00%	100,00%	100,00%	-	0,016	0,016	0,00	4.092,00	4.092,00	0	5.524.200	5.524.200
Total					354.608.355	1,000				0,974	0,022	0,995				345.241.545	7.627.360	352.868.905

A&F Ingeniería Consultoría y Construcción S.R.L.
RUC 80094725-8
A&F Ingeniería Consultoría y Construcción S.R.L.
Contratista-Representante Legal

Claudio Gaona Valenzuela
Ing. Civil
Reg. MOPC 35[illegible]

Ing. Claudio Gaona
Fiscal de Obras
Gobernación de Itapúa

GOBERNACIÓN DE ITAPÚA

CERTIFICADO BÁSICO DE OBRAS N° 7

CUADRO Y CURVA DE AVANCE

MES: Julio

CONCURSO DE OFERTAS N°33/2023 - Construcción de empedrado en Coronel Bogado - Lote N° 01 - Plurianual con ID: 435.867

Contrato N°: 85/2023			
Monto del Contrato:	354.608.355	**Fecha de terminación prevista:**	8-jul-24
Plazo Contractual:	150 días	**Prórroga:**	51 días
Inicio de Obra:	20-dic-23	**Mes:**	Julio

CUADRO DE AVANCE

MES	PREVISTO GS.		EJECUTADO GS.		PREVISTO %		EJECUTADO %	
	MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO
INICIO	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Diciembre	32.800.970	32.800.970	32.800.970	32.800.970	9,25%	9,25%	9,25%	9,25%
Enero	67.403.225	100.204.195	52.877.125	85.678.095	19,01%	28,26%	14,91%	24,16%
Febrero	135.322.100	235.526.295	57.748.167	143.426.262	38,16%	66,42%	16,29%	40,45%
Marzo	49.786.000	285.312.295	50.744.571	194.170.833	14,04%	80,46%	14,31%	54,76%
Abril	12.446.500	297.758.795	67.618.887	261.789.720	3,51%	83,97%	19,07%	73,83%
Mayo	12.446.500	310.205.295	48.920.785	310.710.505	3,51%	87,48%	13,80%	87,62%
Junio	18.821.200	329.026.495	34.531.040	345.241.545	5,31%	92,79%	9,74%	97,36%
Julio	25.581.860	354.608.355	7.627.360	352.868.905	7,21%	100,00%	2,15%	99,51%

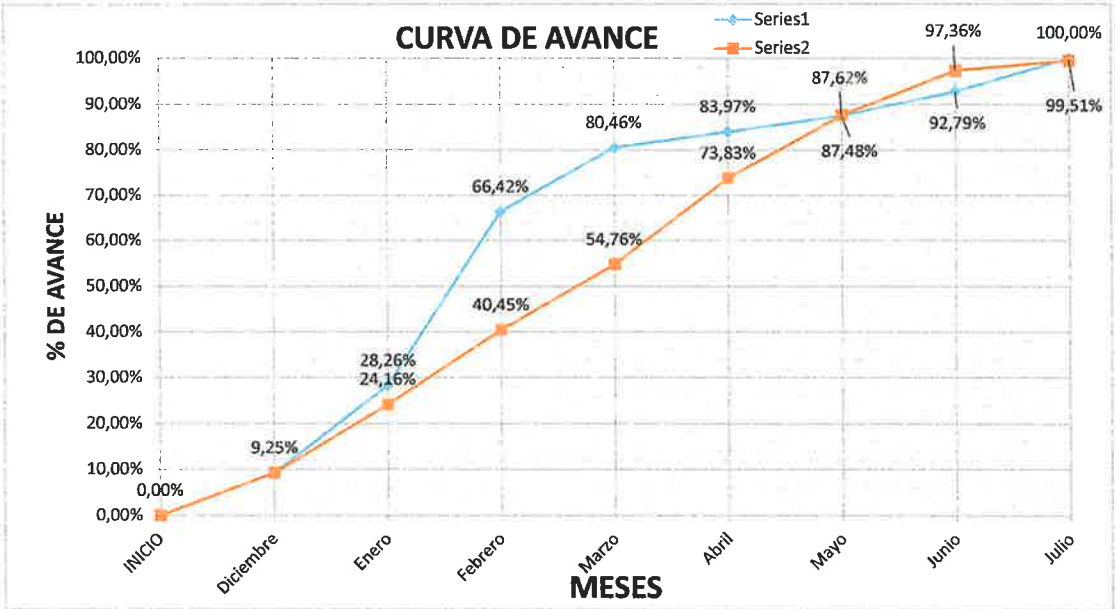

A&F Ingeniería Consultoría y Construcción S.R.L. RUC 80094725-8

A&F Ingeniería Consultoría y Construcción S.R.L.
Contratista-Representante Legal

Ing. Claudio Gaona
Fiscal de Obras
Gobernacion de Itapúa

Claudio Gaona Valenzuela
Ing. Civil
Reg. MOPC 3943

CERTIFICADO BÁSICO DE OBRAS N° 7

CRONOGRAMA FISICO - FINANCIERO

Mes: Julio

CONCURSO DE OFERTAS N°33/2023 - Construcción de empedrado en Coronel Bogado - Lote N° 01 - Plurianual con ID: 435.867			
CONTRATISTA:	A&F Ingeniería Consultoría y Construcción S.R.L.	FECHA DE INICIO:	20-dic-23
MONTO DE LA OFERTA GS:	354.608.355	FECHA DE TERMIACION PREVISTA:	8-jul-24
CONTRATO N°:	85/2023	PRÓRROGA:	51 días
PLAZO DE EJECUCIÓN:	150 días	FECHA DE MEDICIÓN:	8-jul-24

CAUDRO DE PRECIOS ADJUDICADOS

CONCURSO DE OFERTAS N°33/2023 - Construcción de empedrado en Coronel Bogado - Lote N° 01 - Plurianual con ID: 435.867						PLAZO DE EJECUCIÓN								TOTAL
Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total	DICIEMBRE	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	
1	Cartel de Obra (2x1,5)	Unidad	1,00	1.000.000	1.000.000	1.000.000								0,28%
2	Movilización, carteles de seguridad y señalización - Preparacion de obra	Unidad Medida Global	1,00	4.325.000	4.325.000	4.325.000								1,22%
3	Relevamiento topografico, incluye replanteo y marcación - de obra	Metro lineal	630,00	7.650	4.819.500	4.819.500								1,36%
4	Apertura de caja y traslado de materiales sobrantes - Preparacion de obra	Metros cúbicos	1.126,13	19.000	21.396.470	21.396.470								6,03%
5	Terraplen: Relleno de tierra y compactación, capas de 25cm. - de obra	Metros cúbicos	178,75	31.900	5.702.125		5.702.125							1,61%
6	Extracción de tubos de hormigon existentes- de obra	Unidad	18,00	70.000	1.260.000	1.260.000								0,36%
7	Empedrado de piedra basalto -Construcción de empedrado	Metros cuadrados	4.092,00	29.700	121.532.400			40.510.800	40.510.800	10.127.700	10.127.700	10.127.700	10.127.700	34,27%
8	Provisión de tierra para colchon de empedrado - Construcción de empedrado	Metros cúbicos	4.092,00	6.800	27.825.600			9.275.200	9.275.200	2.318.800	2.318.800	2.318.800	2.318.800	7,85%
9	Compactación de empedrado (sellado, 1ra, 2da y 3ra compactación final). Incluye relleno de tierra sobre empedrado - Construcción de empedrado	Milímetros cuadrados	4.092,00	2.700	11.048.400							5.524.200	5.524.200	3,12%
10	Cordón escondido de 15x30cm de hormigón (fck= 180 kg/cm2). - Construcción de empedrado	Metros cúbicos	1,89	900.000	1.701.000							850.500	850.500	0,48%
11	Cordón visto de hormigón elaborado de 15x40cm, sector paseo central (fck= 180 kg/cm2). - Construcción de empedrado	Metros cúbicos	35,16	950.000	33.402.000		16.701.000	16.701.000						9,42%
12	Cordón cuneta de hormigón elaborado (fck= 180 kg/cm2) ancho 60cm y 10cm de espesor. -Construcción de empedrado	Metro lineal	623,16	95.000	59.200.200		29.600.100	29.600.100						16,69%
13	Baden de H° A° (H° E° fck= 210 kg/cm2), doble armadura malla Ø 8 cada 20cm. Ancho 2,00m y 18cm de espesor. - Construcción de empedrado	Metros cúbicos	15,12	1.750.000	26.460.000			26.460.000						7,46%
14	Losa de H° A° (H° E° fck= 210 kg/cm2), 18cm de espesor, doble armadura malla Ø 8 cada 20cm, sobre linea de tubos. - Construcción de empedrado	Metros cúbicos	4,32	1.750.000	7.560.000			7.560.000						2,13%
15	Cabezal de H° A° (Hormigón elaborado fck=210kg/cm2). Según diseño. - Construcción de empedrado	Metros cúbicos	2,98	1.750.000	5.215.000			5.215.000						1,47%
16	Alcantarillado Tubular de 0,60 m de diámetro, incluye provisión, excavación, colocación de tubos y base de H° pobre. - Construcción de empedrado	Metro lineal	28,00	550.000	15.400.000		15.400.000							4,34%
17	Pintura de cordon visto, con latex acrilico -Servicio de pintura	Metro lineal	586,00	2.110	1.236.460								1.236.460	0,35%
18	Limpieza Inicial y final de obra	Metros cuadrados	4.092,00	1.350	5.524.200								5.524.200	1,56%
Total					354.608.355									100,00%
PREVISTO MENSUAL EN GUARANIES						32.800.970	67.403.225	135.322.100	49.786.000	12.446.500	12.446.500	18.821.200	25.581.860	354.608.355
PREVISTO MENSUAL EN PORCENTAJE						9,25%	19,01%	38,16%	14,04%	3,51%	3,51%	5,31%	7,21%	100%

A&F Ingeniería Consultoría y Construcción S.R.L. RUC 80094725-8

A&F Ingeniería Consultoría y Construcción S.R.L.
Contratista-Representante Legal

Claudio Gaona Valenzuela
Ing. Civil
Reg. MOPC 3972

Ing. Claudio Gaona
Fiscal de Obras
Gobernacion de Itapúa

FISCALIZACIÓN DE OBRAS

INFORME: 08-INFORME DE OBRA EMPEDRADO BOGADO CERTIFICADO FINAL

LICITACIÓN CONCURSO DE OFERTAS: "CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN CORONEL BOGADO Y SAN PEDRO - PLURIANUAL" - -CORONEL BOGADO – I.D. N° 435.867 – A&F INGENIERIA - CONTRATO N° 85/2023.

OBRA: Construcción de Empedrado

BENEFICIARIO: Avda Iturbe e/ Ruta 1 y Trinidad

FISCAL DE OBRAS: Ing. Claudio Gaona

FECHA DE VISITA: 08/julio/2024

AVANCE DE OBRA: 99,15%

FISCAL A CARGO: Ing. Claudio Gaona

UBICACIÓN	**DISTRITO**	**MONTO DE LA OBRA**
Avda Iturbe e/ Ruta 1 y Trinidad	Coronel Bogado	354.608.355 Gs.
CONTRATISTA	**N° DE TELEFONO**	**N° DE CONTRATO**
A&F Ingeniera, Consultoría	252-715	85/2023
PLAZO CONTRACTUAL	**FECHA DE INICIO**	**FECHA DE TERMINACIÓN**
150 días	20/12/2023	18/05/2024
PRORROGA POR LLUVIAS	**RESOLUCION N°**	**FECHA DE TERMINACIÓN**
51 días	460/2024	08/07/2024

OBSERVACIONES GENERALES:

En la visita al sitio realizada en la fecha 08/07/24 se pudo constatar la continuidad de los trabajos realizados por la empresa.

- Cordón escondido hormigón elaborado de 15x30cm
- Pintura de cordón visto.
- Limpieza final de obra.

La obra ya se encuentra concluida, se ejecuto 99,15% del total, quedando un saldo a favor de la contratante en el rubro.

12. Cordón cuneta de hormigón elaborado (fck=180 kg/cm2) ancho 60cm y 10cm de espesor. Construcción de empedrado.

Que se completo solo el 97,06% de la cantidad existente en planilla de ese rubro.

Se adjuntan fotografías de la obra donde se refleja su avance.

Claudio Gaona Valenzuela
Ing. Civil
Reg. MOPC 39473

.....

Ing. Claudio Gaona

Fiscal de Obras

Claudio Gaona Valenzuela
Ing. Civil
Reg. MOPC 31...

ACTA DE RECEPCIÓN PROVISORIA

REFERENCIA:

- **I. D. N°:** 435.867
- **TIPO DE PROCEDIMIENTO:** Licitación Concurso de Ofertas N° 33/2023.
- **DENOMINACIÓN DEL LLAMADO**: "CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN CORONEL BOGADO Y SAN PEDRO - PLURIANUAL"
- **No. DE CONTRATO:** 85/2023
- **OBRA:** CONSTRUCCION DE EMPEDRADO
- **DISTRITO:** CORONEL BOGADO

CONTRATISTA: A&F Ingeniera, Consultoría

En el Departamento de Itapúa, República del Paraguay en el sitio de la obra, a los 8 (ocho) días del mes de julio del año dos mil veinticuatro; se reúnen el **ING. FERNANDO OREGGIONI,** Secretario Departamental de Obras Públicas y Transporte, el **ING. CLAUDIO GAONA,** Fiscal de Obras en representación de la Gobernación de Itapúa; y el **ING. FABIO FERNANDEZ,** en representación de la empresa adjudicada y contratada para ejecutar y entregar los trabajos correspondientes a la "CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO EN EL BARRIO SANTO DOMINGO DE ENCARNACIÓN"

Las partes dejan constancia, que los trabajos han sido ejecutados de acuerdo a lo estipulado en los términos de Referencia al Contrato N° 39/2023 y Acta de Medición Final Se deja constancia que el contratista deberá ejecutar reparaciones menores y su posterior limpieza en el empedrado, además del relleno detrás de los cordones y concluir con la pintura de los mismos, antes de la recepción final de la obra----------

No obstante, dejamos constancia de la vigencia del articulo N° 860 del Código Civil, que determina que el Contratista es responsable de pleno derecho y por un periodo de diez (10) años a contar desde la fecha de la Recepción Provisoria de los vicios de construcción que comprometa la solidez de las obras o que afecten alguno de sus elementos constructivos. ----------

En prueba de conformidad de las partes, firman los nombrados, el presente Acta, en cuatro (4) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto, con destino a cada una de las partes, en el lugar y fecha de su otorgamiento.----------

A & F Ingeniería
Consultoría y Construcción S.R.L.
RUC: 80094725-8

ING. FABIO FERNANDEZ
A&F Ingeniera, Consultoría

ING. CLAUDIO GAONA
Fiscalización de Obra
Secretaría de Obras y Transporte
Gobernación de Itapúa

Claudio Gaona Valenzuela
Ing. Civil
Reg. MOPC

GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE ITAPÚA
Secretaría de Obras Públicas y Transporte

ING. FERNANDO OREGGIONI
Secretario Departamental
Obras Públicas y Transporte

Ing. Fernando Oreggioni
Secretario Departamental de Obras Públicas y Transporte
Gobernación de Itapúa

Fiscalización de Obras

Teléf: +59571204568
Correos: general@itapua.gov.py
generalitapuapy@gmail.com

Gobernación de Itapúa / **RUC:** 80009721-1
Dirección: Avda. Cnel. Luis Irrazábal e/ Cap. Pedro Juan Caballero y Sgto. Reverchon
Encarnación - Itapúa - Paraguay
