Llamado CD N° 7 Mobiliarios Escolares ID 405861

Oferente: A y C

MUESTRAS RECIBIDAS: 1mesa+1silla.

Mesas: Se cumple con las dimensiones establecidas (60x50cm y 3cm de espesor) la fijación de la tabla es estable. Sus terminaciones incluyendo el biselado de bordes esta acorde a las normas establecidas. Dicha tabla se encuentra fijada al caballete metálico con tornillos de manera óptima.

La calidad de las soldaduras está adecuada los estándares requeridos.

Silla para alumno: Presenta los 4 remaches por tablilla como lo establece la norma, el respaldo presenta un ángulo apropiado con relación a la superficie horizontal.

Arq. José Luis Salas
Fiscalizador de obras

Arq. José Luis Salas Rios
Reg. Prof. Nº 4368

MUNICIPALIDAD DE NUEVA COLOMBIA.
CORDILLERA – PARAGUAY
Av. 29 Setiembre e/ Sta. Rosa y Rca. de Colombia
Telef.: 021 3280706

NUEVA COLOMBIA - CORDILLERA "Poty"

Llamado CD N° 7 Mobiliarios Escolares ID 405861

Oferente: RM Metalúrgica

MUESTRAS RECIBIDAS: 1mesa+1silla.

Mesas: Las dimensiones obtenidas de las muestras no cumplen las dimensiones tanto en ancho(60.20cm) como en alto (49.8cm). Cuenta con solo una cuelga mochilas, fijado por tornillos, los mismos deberían estar soldados según las especificaciones. Los caños del caballete están tapados por tapitas de plástico y no soldadas con chapa metálica. De igual importancia, dichos caños tienen una dimensión de 28x28 mm, no se cumplen los estándares sugeridos de 30x30mm.
Se observa también inestabilidad en la mesa.



La terminación con pintura opaca de las muestras presentadas, no será permitidas tanto en mesas como en las sillas.

Silla para alumno: Tablillas fijadas únicamente con 2 remaches c/u. Cumple con las alturas sugeridas en las especificaciones.

Arq. José Luis Salas
Fiscalizador de obras

Arq. José Luis Salas Rios
Reg. Prof. Nº 4368

Llamado CD N° 7 Mobiliarios Escolares ID 405861

Oferente: Grupo L y J

MUESTRAS RECIBIDAS: 1mesa+1silla.

Mesas: Las dimensiones obtenidas de las muestras no cumplen el mínimo establecido por las especificaciones técnicas, al igual que la calidad de la soldadura, donde se observan defectos en la misma terminación. En cuanto a los elementos que componen la unidad como los mochileros si se cumplen los estándares. También se califica como optima la fijación de los elementos de madera con el metal.

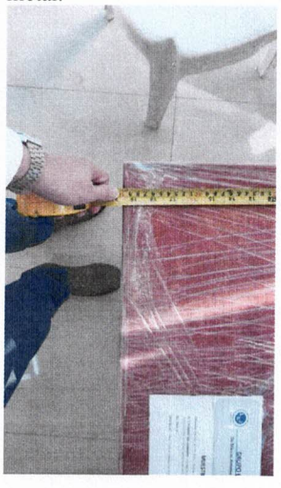

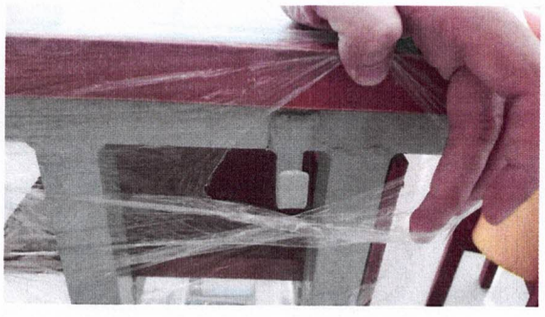

Sillas: Se aprecia una terminación poco detallada en la disposición de los remachados en las sillas, donde muchas de ellas se hallan des encuadradas.

Arq. José Luis Salas
Fiscalizador de obras

Arq. José Luis Salas Rios
Reg. Prof. Nº 4368

Nueva Colombia, 2 de abril de 2022

Informe de Inspección de Mobiliarios

Oferente: COMACO

MUESTRAS RECIBIDAS: 2 (dos).

Se realiza la recepción e inspección de 2 muestras recibidas por la empresa COMACO. Las unidades estarían destinadas al 2do y 3er ciclo respectivamente. Ambas unidades están conformadas por un pupitre y una silla respectivamente.

Mesas: En cuanto a dimensiones de los elementos que la conforman, se consta que si se adecuan a los requerimientos establecidas en las especificaciones técnicas del Ministerio de Educación y Ciencias.
No obstante, se aprecian detalles de soldadura en la parte que une la estructura de la mesa con el colgador de mochilas. Así también en la calidad de pintura aplicada sobre la superficie metálica.

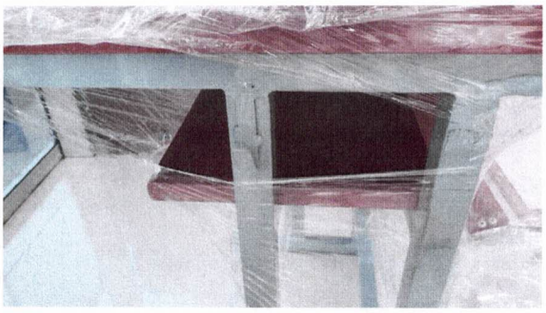

Sillas: Se consta que dicho elemento cumple con todas las partes requeridas, así como las dimensiones establecidas, Únicamente se hace la acotación sobre el ángulo del respaldo ya que el mismo se encuentra prácticamente perpendicular a la superficie horizontal.

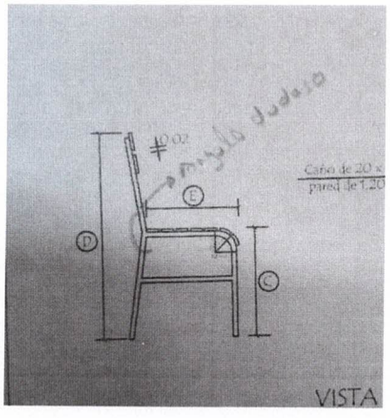

Arq. José Luis Salas
Fiscalizador de obras

Arq. José Luis Salas Rios
Reg. Prof. Nº 4368

Llamado CD N° 7 Mobiliarios Escolares ID 405861

Oferente: Classic Mobles S.A.

MUESTRAS RECIBIDAS: 1mesa+1silla.

Mesas: Las dimensiones superan en pequeña instancia a los estándares mínimos (50.2cmx60.8cm) con un espesor de 2.2cm. los bordes no están redondeados, el acabado cumple con los estándares mínimos sugeridos.

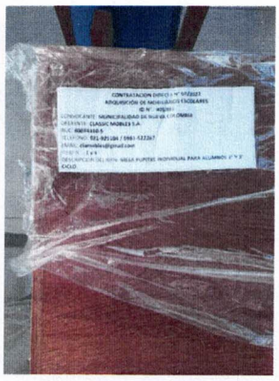

La calidad de las soldaduras, puede definirse como media

Sillas: Las tablillas están fijadas con 4 remaches c/u como lo establecido en las especificaciones. El acabado este hecho con pintura gris clara.
El ángulo de respaldo con relación a la superficie horizontal es el apropiado.

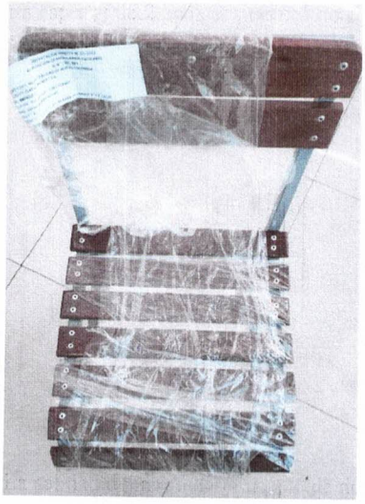

Arq. José Luis Salas
Fiscalizador de obras

Arq. José Luis Salas Rios
Reg. Prof. Nº 4368

MUNICIPALIDAD DE NUEVA COLOMBIA.
CORDILLERA – PARAGUAY
Av. 29 Setiembre e/ Sta. Rosa y Rca. de Colombia
Telef.: 021 3280706

NUEVA COLOMBIA - CORDILLERA "Poty"

Llamado CD N° 7 Mobiliarios Escolares ID 405861

Oferente: Distribuidora Paula- 3er ciclo

MUESTRAS RECIBIDAS: 1mesa+1silla.

Mesas: Las dimensiones de la mesa están adecuadas a las especificaciones técnicas. La calidad de las soldaduras se considera aceptables, no obstante, la estabilidad de la mesa es baja. Se observa la parte del porta útiles solo parcialmente cubierta.
Los cañitos del Caballete poseen una sección de 2.8 x 2.8 cm a diferencia de los 3cm x 3cm establecidos por la norma.
Los acabados fueron hechos con pinturas opacas por lo que no están acordes a las especificaciones.

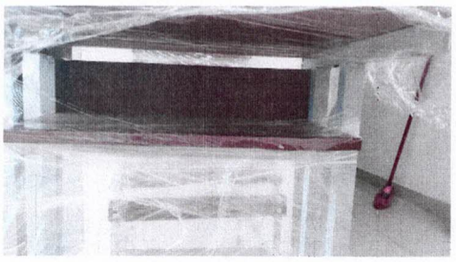

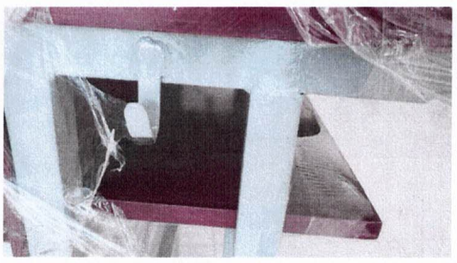

Sillas: Las tablillas están fijadas con 4 remaches c/u como lo establecido en las especificaciones.
El ángulo de respaldo con relación a la superficie horizontal es el apropiado.
Los acabados fueron hechos con pinturas opacas por lo que no están acordes a las especificaciones.

Arq. José Luis Salas
Fiscalizador de obras

Arq. José Luis Salas Rios
Reg. Prof. Nº 4368
