Capiata, 14 de noviembre del 2024.

Señor:

Arq. Ramón Gaona. Secretaria Dptal de Obras Públicas

GOBERNADOR DEL DEPARTAMENTO CENTRAL.

PRESENTE.

RECIBIDO
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS
Firma:
Aclaración: Noelia Valdez
Fecha: 14/11/24 Hora:

REF: SERVICIOS DE FISCALIZACION DE OBRAS.

ASUNTO: PRESENTACION INFORME CERTIFICADO N° 02

Tengo el agrado de dirigirme a Ud. Con relacion a la referencia , con el objeto de presentar el informe de Contrato N° 32/2024 LPN "Construcción de Empedrados en el Departamento Central" - ID N° 449.826 **Contratista: COG** de Cesar Alejandro Ortiz Gaona

El presente informe, presenta datos verificados correspondiente al Contrato N° 32/2024 " Construcción de Empedrados en el Departamento Central", tiene por objeto poner en conocimiento del Contratante el estado actual de las obras ejecutadas de acuerdo al Certificado y Acta de Medicion, presentado por la empresa.

Esta fiscalización manifiesta que acompaño los procesos de la Construcción de Empedrados en el Departamento Central , asi también el avance fisico financiero ha realizado verificaciones in situ y en la fecha de hoy cuenta con un avance de los rubros ejecutados, según el Acta de Medicion, cabe resaltar que la empresa constructora ha cumplido con las especificaciones tecnicas establecidas para la obras mencionadas, con la calidad de los materiales utilizados en la misma.

Certificado según Acta de Medición N° 02

LPN CONSTRUCCION DE EMPEDRADOS EN EL DEPARTAMENTO CENTRAL										
EMPRESA: C.O.G. EMPRENDIMIENTOS S.A.										
FISCAL DE OBRA: ING. CARLOS PARODI										
OBRA: CONSTRUCCION DE EMPEDRADOS EN EL DEPARTAMENTO CENTRAL.										
COMPUTO MÉTRICO Y PRESUPUESTO										
CONTRATO N° 32/2024 CERT. N° 02						Lote N°8				
N°	CALLE/TRAMO	E ini	N ini	E fin	N fin	UNIDAD	CANTIDAD	P. UNITARIO	ACTUAL	ACUMULADA
	Calle Buenaventura - Barrio San Buenaventura	457438	7193901	457572	7193823					
1	Marcacion y replanteo					m2	1.150	2.000	2.300.000	2.300.000
2	Desmonte, destronque					m2	1.150	5.000	5.750.000	5.750.000
3	Relleno de suelo mejorado y compactacion					m2	1.150	5.000	5.750.000	5.750.000
4	Construcción de pavimento tipo empedrado					m2	1.150	53.000	60.950.000	60.950.000
5	Compactación y relleno de espacios entre piedras.					m2	1.150	3.000	3.450.000	3.450.000
6	Limpieza final					m2	1.150	1.000	1.150.000	1.150.000
	Calle Sin nombre- Barrio Buenaventura	457484	7193876	457504	7193920					
1	Marcacion y replanteo					m2	205	2.000	410.000	410.000
2	Desmonte, destronque					m2	205	5.000	1.025.000	1.025.000
3	Relleno de suelo mejorado y compactacion					m2	205	5.000	1.025.000	1.025.000
4	Construccion de pavimento tipo empedrado					m2	205	53.000	10.865.000	10.865.000
5	Compactacion y relleno de espacios entre piedras.					m2	205	3.000	615.000	615.000
6	Limpieza final					m2	205	1.000	205.000	205.000

Según el Acta de Medición el Certificado: 93.495.000 gs.
Fondo de Reparo: 4.674.750 gs.
Sin otro motivo, hago propicia la ocasión para saludadarle, por lo que se sugiere el pago del Certificado N° 02

Ing. Carlos Parodi M.

Fiscal de Obras.

Ing. Carlos Parodi M.
Fiscal de Obras

COG
EMPRENDIMIENTOS S.A.

REPÚBLICA DEL PARAGUAY

GOBERNACIÓN
DEPARTAMENTO
CENTRAL

"REGISTROS FOTOGRAFICOS"

CERTIFICADO N° 02

CONTRATO N° 32/2024
" CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO EN EL DEPARTAMENTO CENTRAL "

ID 449.826

C.O.G. EMPRENDIMIENTOS S.A.
RUC: 80097945-1

Calle Cnel. Vicente Machuca N° 294 c/ Araucanos, San Lorenzo - Paraguay
Celular: (0985) 568.114
E-mail: cog.emprendimientos.sa@gmail.com

COG
EMPRENDIMIENTOS S.A.

CALLE SAN BUENAVENTURA – B° SAN BUENAVENTURA

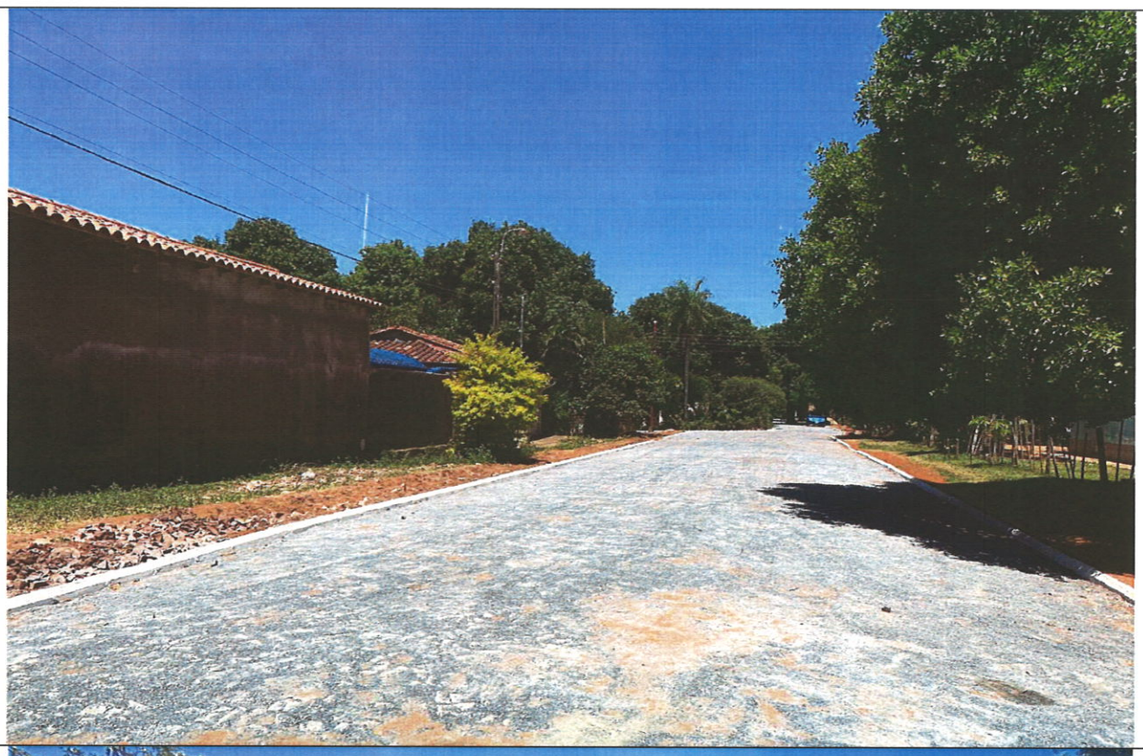

Ing. Carlos Jarodi M.
Fiscal de Obras

C.O.G. EMPRENDIMIENTOS S.A.
RUC 80007945-1

Calle Cnel. Vicente Machuca N° 294 c/ Araucanos, San Lorenzo - Paraguay
Celular: (0985) 568.114
E-mail: cog.emprendimientos.sa@gmail.com

COG
EMPRENDIMIENTOS S.A.

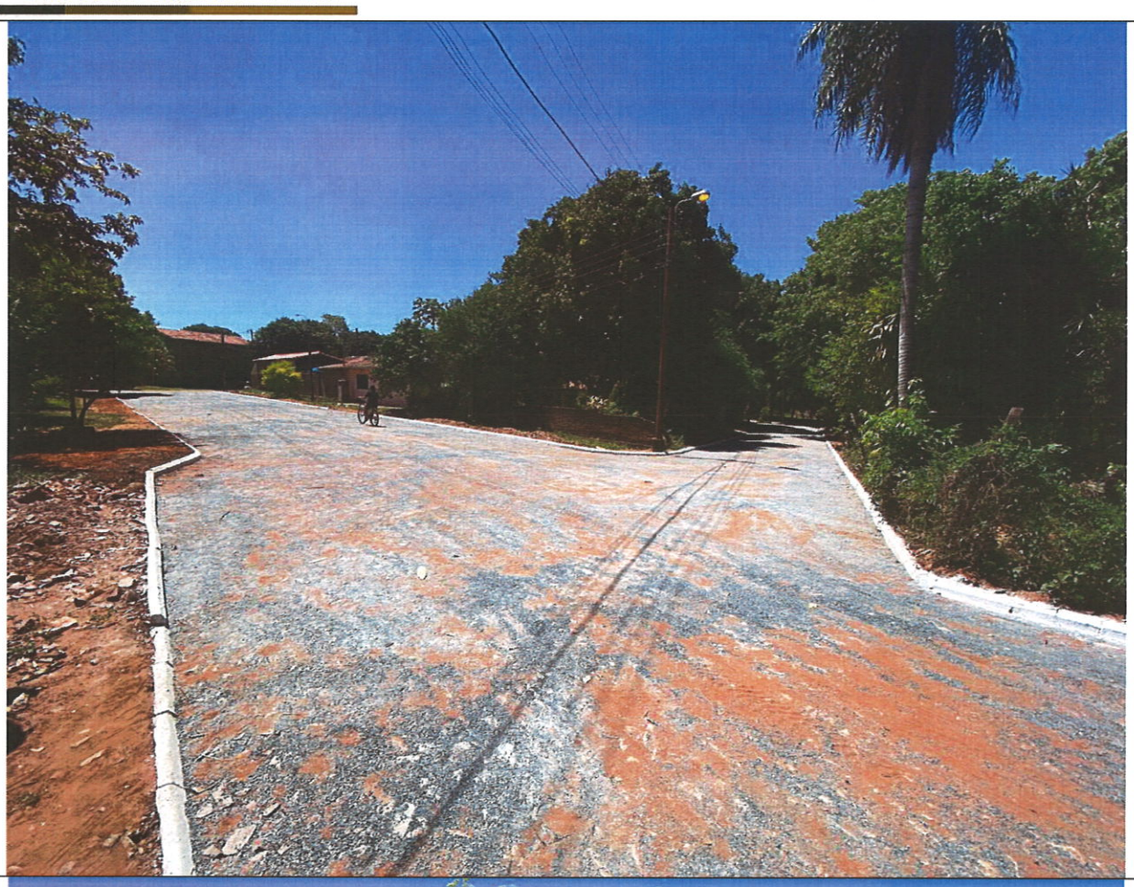

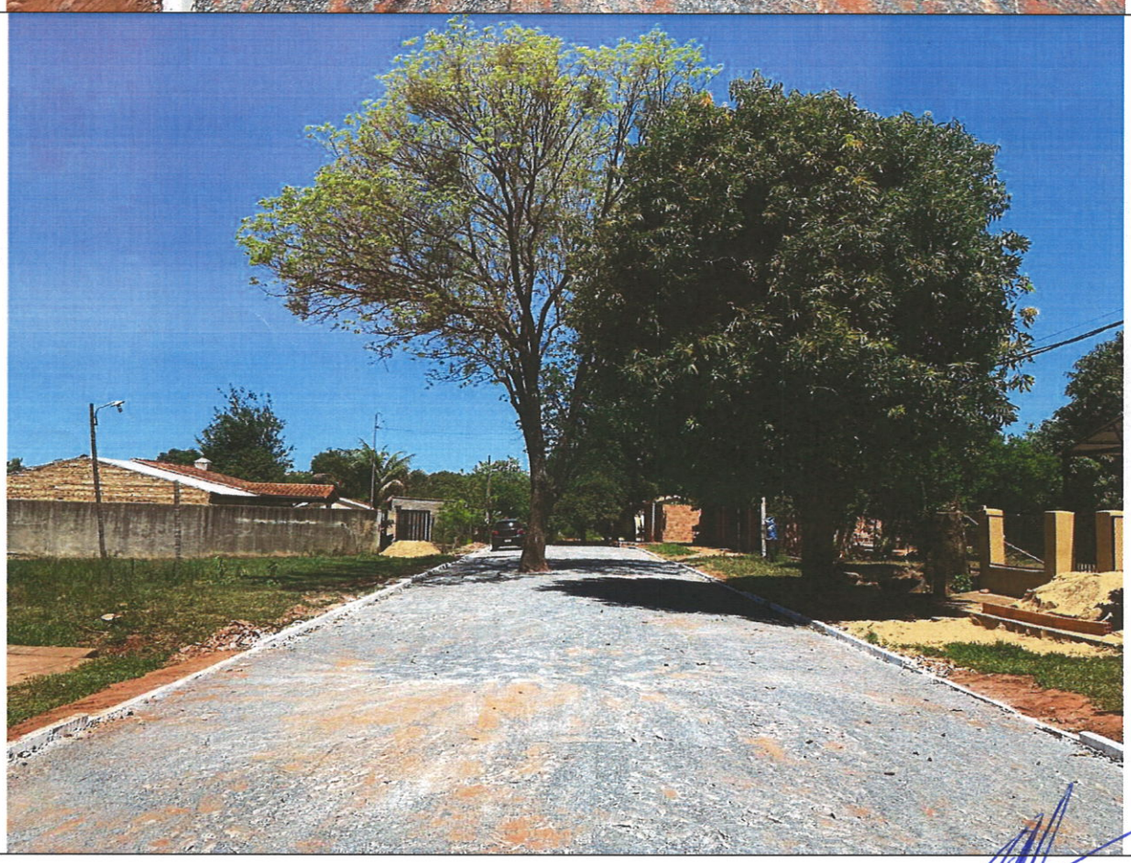

Calle Cnel. Vicente Machuca N° 294 c/ Araucanos, San Lorenzo - Paraguay
Celular: (0985) 568.114
E-mail: cog.emprendimientos.sa@gmail.com

C.O.G. EMPRENDIMIENTOS S.A.
RUC 80097945-1

Ing. Carlos Parodi M.
Fiscal de Obras

COG
EMPRENDIMIENTOS S.A.

CALLE SAN SIN NOMBRE – B° SAN BUENAVENTURA

Calle Cnel. Vicente Machuca N° 294 c/ Araucanos, San Lorenzo - Paraguay
Celular: (0985) 568.114
E-mail: cog.emprendimientos.sa@gmail.com

COG EMPRENDIMIENTOS S.A.
RUC: 80097945-1
Ing. Carlos Parodi M.
Fiscal de Obras
