COD. 12732024

CONTRATISTA CONSORCIO CANALES DEL CHACO AVDA. GUIDO BOGGIANI N° 6990 ESQ. MAYOR EDUARDO VERA Tel: 511967 Email: licitaciones@tocsa.com.py	M.O.P.C. Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones COMISION NACIONAL RIO PILCOMAYO	FISCALIZACIÓN MOPC Tel:

ACTA DE MEDICION Certificado de Trabajo N° 5 Abril/2024	AVANCES (%)	Del mes:	Acumulado:
	A. Prog. Contract.	6,00 %	29,00 %
	Avance ejecutado	0,00 %	31,21 %
	Teórico	0,00 %	31,21 %

En la localidad de CHACO PARAGUAYO, Departamento de BOQUERON, a los 5 dias del mes de Abril del año 2024, se reúnen, por una parte, el ING WILMA ROSANNA CABRERA CABRAL, SUPERINTENDENTE DE OBRA, en representación de CONSORCIO CANALES DEL CHACO, el ING. CARLOS ALBERTO ESTIGARRIBIA ALBAVI, SUPERVISOR/A DE OBRA, en representación de MOPC y el ING. RODRIGO FERNANDO RIOS GONZALEZ, FISCALIZADOR/A DE OBRA, en representación de MOPC; Obra: "CONTRATO DE EJECUCION DE OBRAS PARA AMPLIACION, PROFUNDIZACION DEL CANAL DE TOMA DE AGUAS DEL RIO PILCOMAYO, LIMPIEZA E INTERCONEXION DE CAÑADAS PARA LA CONDUCCION DE LAS AGUAS QUE INGRESAN AL TERRITORIO NACIONAL LOTE I, LOTE II Y LOTE III.", que suscriben el presente Acta, han procedido a la verificación de los trabajos ejecutados en obra durante el mes de Abril del año 2024.-

De acuerdo a las C.G.C., las cantidades que figuran en el acta del presente certificado no tienen carácter definitivo, por lo tanto cualquier error u omisión serán rectificados en los próximos certificados. Los ítems ejecutados son los siguientes:

Item N°	Descripción de los trabajos	U/M	Cantidades ejecutadas		
			Anterior	Presente	Acumulado
	LOTE 1				
1	**ITEMS**				
8.1	Mantenimietno del canal: remosion de sedimentos y limpuieza vegetal del caal, desde la Embocadura hasta el lugar conocido como Mistolar, en una longuitud de 70 Km aproximadamente.	m3	198.550,00	0,00	198.550,00

ING WILMA ROSANNA CABRERA CABRAL
SUPERINTENDENTE DE OBRA
CONSORCIO CANALES DEL CHACO

ING. CARLOS ALBERTO ESTIGARRIBIA ALBAVI
SUPERVISOR/A DE OBRA
MOPC

ING. RODRIGO FERNANDO RIOS GONZALEZ
FISCALIZADOR/A DE OBRA
MOPC

COD. 12732024

CONTRATISTA CONSORCIO CANALES DEL CHACO AVDA. GUIDO BOGGIANI N° 6990 ESQ. MAYOR EDUARDO VERA Tel: 511967 Email: licitaciones@tocsa.com.py	M.O.P.C. Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones COMISION NACIONAL RIO PILCOMAYO	FISCALIZACIÓN Tel:
Obra: CONTRATO DE EJECUCION DE OBRAS PARA AMPLIACION, PROFUNDIZACION DEL CANAL DE TOMA DE AGUAS DEL RIO PILCOMAYO, LIMPIEZA E INTERCONEXION DE CAÑADAS PARA LA CONDUCCION DE LAS	**Fecha orden inicio:** 27/11/2023 **Plazo contractual:** 24 Meses	**Certificado Nº:** 5 **Mes/Año:** Abril/2024

HOJA DE MEDICIÓN

Item N°	Descripción - Unidad de medida

LOTE 1						
8.1	Mantenimietno del canal: remosion de sedimentos y limpuieza vegetal del caal, desde la Embocadura hasta el lugar conocido como Mistolar, en una longuitud de 70 Km aproximadamente.					
	Progresiva			Total certificado		
	Desde	Hasta	Obs.	Anterior	Presente	Acumulado
	0	0		198.550,000	0,000	198.550,000
	0	0		0,000	0,000	0,000
	0	0		0,000	0,000	0,000
	0	0		0,000	0,000	0,000
	Total hasta el presente certificado			198.550,000	0,000	198.550,000

ING WILMA ROSANNA CABRERA CABRAL
SUPERINTENDENTE DE OBRA
CONSORCIO CANALES DEL CHACO

ING. CARLOS ALBERTO ESTIGARRIBIA ALBAVI
SUPERVISOR/A DE OBRA
MOPC

ING. RODRIGO FERNANDO RIOS GONZALEZ
FISCALIZADOR/A DE OBRA
MOPC

COD. 12732024

Curva de avance físico financiero - CONSORCIO CANALES DEL CHACO - Certificado N°: 5 - Abril/2024

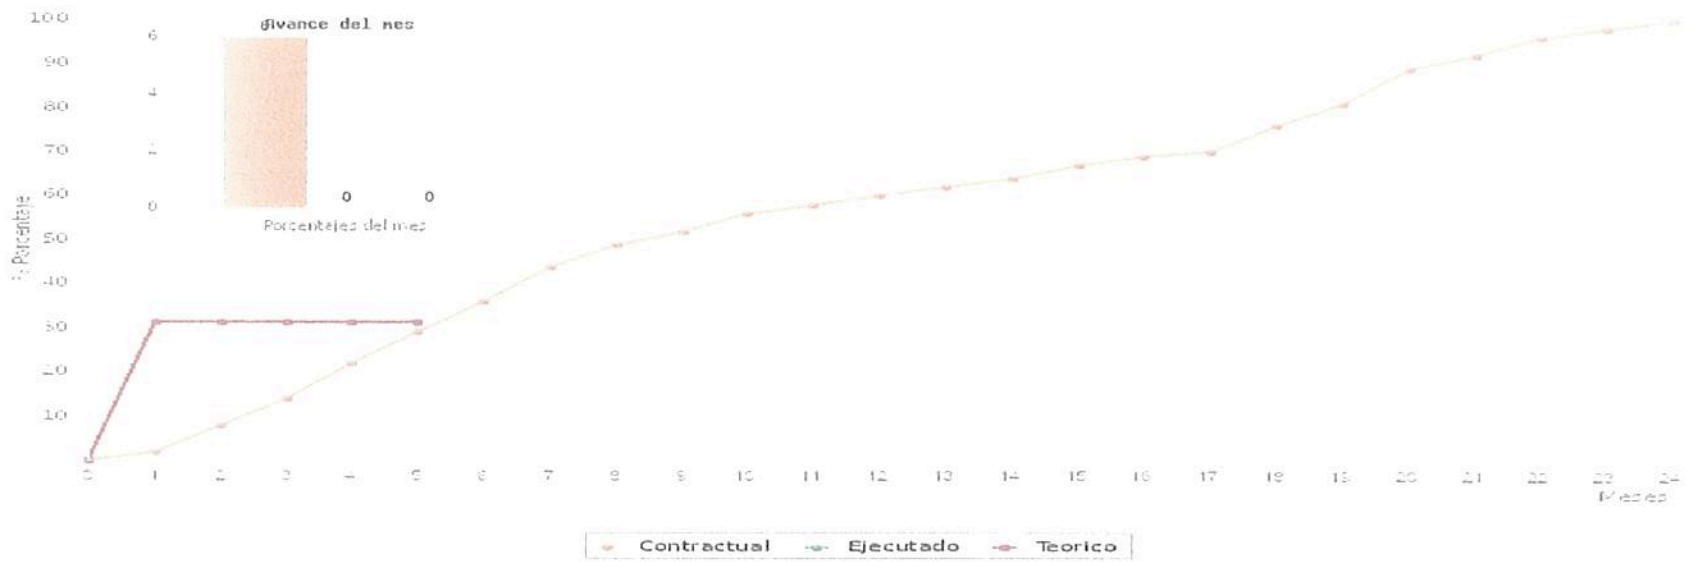

Porcentajes acumulados

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
Contr. Parcial	2,00 %	6,00 %	6,00 %	9,00 %	6,00 %	8,00 %	8,00 %	5,00 %	3,00 %	4,00 %	2,00 %	2,00 %	1,00 %	2,00 %	4,00 %	1,00 %	1,00 %	5,00 %	6,00 %	7,00 %	4,00 %	4,00 %	1,00 %	2,00 %
Contr. Acum.	2,00 %	8,00 %	14,00 %	22,00 %	29,00 %	36,00 %	44,00 %	49,00 %	52,00 %	56,00 %	58,00 %	60,00 %	62,00 %	64,00 %	67,00 %	69,00 %	70,00 %	76,00 %	81,00 %	89,00 %	92,00 %	96,00 %	98,00 %	100,00 %
Ejec. Parcial	31,21 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %																			
Ejec. Acum.	31,21 %	31,21 %	31,21 %	31,21 %	31,21 %																			
Teor. Parcial	31,21 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %																			
Teor. Acum.	31,21 %	31,21 %	31,21 %	31,21 %	31,21 %																			

ING WILMA ROSANNA CABRERA CABRAL
SUPERINTENDENTE DE OBRA
CONSORCIO CANALES DEL CHACO

ING. CARLOS ALBERTO ESTIGARRIBIA ALBAVI
SUPERVISOR/A DE OBRA
MOPC

ING. RODRIGO FERNANDO RIOS GONZALEZ
FISCALIZADOR/A DE OBRA
MOPC

009

COD. 12732024

CUADRO DE LLUVIA Y/O HUMEDAD EXCESIVA

CONTRATO DE EJECUCION DE OBRAS PARA AMPLIACION, PROFUNDIZACION DEL CANAL DE TOMA DE AGUAS DEL RIO PILCOMAYO, LIMPIEZA E INTERCONEXION DE CAÑADAS PARA LA CONDUCCION DE LAS AGUAS QUE INGRESAN AL TERRITORIO NACIONAL LOTE I, LOTE II Y LOTE III.

Certificado de Trabajo Nº: 5 - Abril/2024

		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Total lluvias (días)	Total humedad (días)	Total no laborables (días)	Total laborables (días)
2023	Nov																											B	B	B	B		0	0	0	4
	Dic	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B																					0	0	0	11

ING WILMA ROSANNA CABRERA CABRAL
SUPERINTENDENTE DE OBRA
CONSORCIO CANALES DEL CHACO

ING. CARLOS ALBERTO ESTIGARRIBIA ALBAVI
SUPERVISOR/A DE OBRA
MOPC

ING. RODRIGO FERNANDO RIOS GONZALEZ
FISCALIZADOR/A DE OBRA
MOPC

008

		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Total lluvias (días)	Total humedad (días)	Total no laborables (días)	Total laborables (días)
2024	Ene	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	0	0	0	31
	Feb	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B			0	0	0	29
	Mar	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	0	0	0	31
	Abr	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B		0	0	0	30
	May																																0	0	0	0
	Jun																																0	0	0	0
	Jul																																0	0	0	0
	Ago																																0	0	0	0
	Sep																																0	0	0	0
	Oct																																0	0	0	0
	Nov																																0	0	0	0
	Dic																																0	0	0	0

ING WILMA ROSANNA CABRERA CABRAL
SUPERINTENDENTE DE OBRA
CONSORCIO CANALES DEL CHACO

ING. CARLOS ALBERTO ESTIGARRIBIA ALBAVI
SUPERVISOR/A DE OBRA
MOPC

ING. RODRIGO FERNANDO RIOS GONZALEZ
FISCALIZADOR/A DE OBRA
MOPC
