GOBERNACION DE ITAPÚA

Resúmen del Certificado Básico Nº 02

Mes: Marzo

LICITACIÓN POR CONTRATACIÓN DIRECTA N° 30/2023 Construcción de Empedrado en la Compañía Potrero Yapepo sobre camino viejo de la Ruta N° 8 - José Leandro Oviedo - Plurianual ID N° 436.867

Posición	Conceptos	Importes Autorizados		Importes Certificados					
				Hasta Certificado Anterior		Presente Certificado		Total Certificado a la Fecha	
		%	(1)	% Avance de Obra	(2)	% Avance de Obra	(3)	% Avance de Obra	(2+3)
A	Certificaciones de Obra Ejecutada por Precio Unitario								
A.I	Construcción de Empedrado en la Compañía Potrero Yapepo sobre camino viejo de la Ruta N° 8 – José Leandro Oviedo - Plurianual ID N° 436.867	100,00%	166.277.236	14,56%	24.204.713	29,23%	48.605.862	43,79%	72.810.575
A	**Total por Contrato**	**100,00%**	**166.277.236**	**1**	**24.204.713**	29,23%	**48.605.862**	43,79%	**72.810.575**

B	**Deducciones a la fecha**			**Hasta Certificado Anterior**	**Presente Certificado**	**Total Certificado a la Fecha**
B.I	Devolución de Anticipo	*20,00%*	33.255.447	4.840.943	9.721.172	14.562.115
B.II	Para Fondo de Reparo	*0,00%*	0	0	0	0
B	**Total Deducciones**		**33.255.447**	**4.840.943**	**9.721.172**	**14.562.115**
C.I	**Importe Liquido a Pagar Según Presente Certificado (A - B)**				38.884.690	
C.II	Multas				0	
C	**Importe Neto a Pagar Según Presente Certificado (A - B)**				**38.884.690**	

SON GUARANJES: Treinta y ocho millones ochocientos ochenta y cuatro mil seiscientos noventa.

Certificado Básico Nº 02

Mes: Marzo

Contrato N°: 81/2023

Monto Básico: 166.277.236 gs

Contratista: Itinera S.A. - Ing. Juan F. Canatta Ruiz

Fecha de Inicio: 20/Diciembre/2023

Plazo de Ejecución: 90 dias

Prorrogas: 30 dias - Resolución N° 350/2024

Fecha de Terminación: 18/Abril/2024

Secretario de Obras Públicas y Transporte
Gobernación de Itapúa

Ing. Fernando Ortellani
Secretario Departamental de Obras Públicas y Transporte
Gobernacion de Itapúa

Itinera S.A - Ing. Juan Fernando Canatta Ruiz
Contratista

ITINERA S.A.
RUC:80072876-9

Fiscal de Obra
Gobernación de Itapúa

Arq. FÉLIX MORINIGO
Fiscal de Obras
Reg. Prof. N° 3.265

02

ACTA DE MEDICIÓN

CERTIFICADO BASICO N° 02

CONTRATO N° 81/2023

REFERENCIA: LICITACIÓN POR CONTRATACIÓN DIRECTA N° 30/2023 Construcción de Empedrado en la Compañía Potrero Yapepo sobre camino viejo de la Ruta N° 8 – José Leandro Oviedo - Plurianual ID N° 436.867

CONTRATISTA: Ing. Juan Fernando Canatta Ruiz - Itinera S.A.

En la Ciudad de José Leandro Oviedo, Departamento de Itapúa, República del Paraguay, a los 26 días del mes de marzo del año 2024, se reúnen en representación de la Gobernación de Itapúa, el Arq. Hernán Morínigo, encargado de la Verificación y Fiscalización de las Obras, y el Ing. Juan Fernando Canatta Ruiz, representante legal de la empresa Itinera S.A, para la;

- Construcción de Empedrado en la Compañía Potrero Yapepo sobre camino viejo de la Ruta N° 8 – José Leandro Oviedo.

Quienes suscriben la presente Acta, han procedido a la verificación y medición de los trabajos ejecutados durante el mes de marzo del corriente año.

En la verificación y medición realizada se observó que las obras se encuentran de acuerdo a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones y los resultados se anexan en las planillas correspondientes.

De plena conformidad de las partes, se suscribe el presente Acta en 2 (dos) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en el lugar y fecha indicados más arriba. –

.....

Ing. Juan Fernando Canatta Ruiz
Itinera S.A.
Contratista

ITINERA S.A.
RUC:80072876-9

.....

Fiscal de Obras
Gobernación de Itapúa

GOBERNACION DEPARTAMENTAL DE ITAPUA
Fiscalización de Obras

Arq. FÉL... MORÍNIGO
Fiscal de Obras
Reg. Prof. N° ...65

03

CERTIFICADO BÁSICO DE OBRAS N° 02

PLANILLA DE MEDICIÓN Y CERTIFICADO

LICITACIÓN POR CONTRATACIÓN DIRECTA N° 30/2023 Construcción de Empedrado en la Compañía Potrero Yapepo sobre camino viejo de la Ruta N° 8 – José Leandro Oviedo - Plurianual ID N° 436.867

CONTRATISTA: Itinera S.A. - Ing. Juan Fernando Canatta Ruiz	**CONTRATO N°:** 81/2023
MONTO DE LA OFERTA: 166.277.236 gs	**PLAZO:** 90 dias + 30 dias
LOTE N°: 1	**FECHA DE MEDICIÓN:** 26/03/2024

CAUDRO DE PRECIOS ADJUDICADOS						INCIDENCIA DEL RUBRO SOBRE EL TOTAL	PLANILLA DE MEDICIÓN N° 02						PLANILLA DE CERTIFICADO BÁSICO N° 02					
Construcción de Empedrado en la Compañía Potrero Yapepo sobre camino viejo de la Ruta N° 8 – José Leandro Oviedo - Plurianual ID N° 436.867				Itinera S.A. - Ing. Juan Canatta			EN PORCENTAJE			EN INCIDENCIA			CANTIDAD EJECUTADA			CANTIDAD EJECUTADA EN GS.		
Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total		ACUMUL. ANTERIOR	PRESENTE	ACUMUL. TOTAL	ACUMUL. ANTERIOR	PRESENTE	ACUMUL. TOTAL	ACUMUL. ANTERIOR	PRESENTE	ACUMUL. TOTAL	ACUMUL. ANTERIOR	PRESENTE	ACUMUL. TOTAL
1	Replanteo y marcación - Replanteo y marcación de obra, con Equipo Topográfico	Metro lineal	2.800	800	2.240.000	0,013	100%	0%	100%	0,013	0,000	0,013	2800	0	2800,00	2.240.000	0	2.240.000
2	Cartel de Obra (Estructura de madera y chapa N°. 24) 2,00 x 1,50 m, con impresión adhesiva.-	Unidad	1,00	1.183.175	1.183.175	0,007	100%	0%	100%	0,007	0,000	0,007	1	0,00	1,00	1.183.175	0	1.183.175
3	Carteles de señalización de chapa N° 24 (0,30 x 0,80).	Unidad	2,00	1.665.669	3.331.338	0,020	100%	0%	100%	0,020	0,000	0,020	2	0,00	2,00	3.331.338	0	3.331.338
4	Construcción de empedrado - Colchón de tierra colorada limpia para asiento de piedra (esp. 0,20 m).	Metros cuadrados	700	7.095	4.966.500	0,030	0%	100%	100%	0,000	0,030	0,030	0	700	700	0	4.966.500	4.966.500
5	Cordon Escondido de Hº (30x15 cm)	Metros cúbicos	3,2	1.024.954	3.279.853	0,020	0%	0%	0%	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	0
6	Cordón cuneta de Hormigón, 60 cm de ancho.	Metro lineal	700	86.931	60.851.700	0,366	27,29%	71,71%	99,00%	0,100	0,262	0,362	191	502	693	16.603.821	43.639.362	60.243.183
7	Construcción de empedrado - Pavimento tipo EMPEDRADO.-	Metros cuadrados	2.625	32.374	84.981.750	0,511	0%	0%	0%	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	0
8	Relleno y compactacion de terreno - Relleno y compactación para soporte de cordón cuneta.	Metros cúbicos	70	33.756	2.362.920	0,014	35,82%	0,00%	36%	0,005	0,000	0,005	25,0735	0,00	25,07	846.379	0	846.379
9	Limpieza Final de Obras.	Metros cuadrados	2.800	1.100	3.080.000	0,019	0%	0%	0%	0,000	0,000	0,000	0	0	0,00	0	0	0
					166.277.236	**100%**				**14,56%**	**29,23%**	**43,79%**				**24.204.713**	**48.605.862**	**72.810.575**

Itinera S.A. - Ing. Juan Fernando Canatta Ruiz
Contratista

ITINERA S.A.
RUC:80072376-9

Fiscal de Obras
Gobernacion de Itapúa

Ing. FÉL... MORINIGO
Fiscal de Obras
Reg. Prof. N° 3.265

Fiscalización de Obras

10

GOBERNACIÓN DE ITAPÚA

CERTIFICADO BÁSICO DE OBRAS N° 02

LICITACIÓN POR CONTRATACIÓN DIRECTA N° 30/2023 Construcción de Empedrado en la Compañía Potrero Yapepo sobre camino viejo de la Ruta N° 8 – José Leandro Oviedo - Plurianual ID N° 436.867

Contrato N°: 81/2023	
Monto del Contrato: 166.277.236 gs	**Term. Prevista:** 18/Abril/2024
Plazo Contractual: 90 dias	**Prorrogas:** 30 dias - Resolución N° 350/2024
Inicio de Obra: 20/Diciembre/2023	**Mes:** Marzo

CUADRO DE AVANCE PREVISTO Y EJECUTADO

Contrato N°: 81/2023

MES	PREVISTO GS.		EJECUTADO GS.		PREVISTO %		EJECUTADO %	
	MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO
INICIO	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
DICIEMBRE	6.754.513	6.754.513	6.754.513	6.754.513	4,06%	4,06%	4,06%	4,06%
ENERO	30.425.850	37.180.363	11.805.684	18.560.197	18,30%	22,36%	7,10%	11,16%
FEBRERO	35.392.350	72.572.713	5.644.516	24.204.713	21,29%	43,65%	3,39%	14,56%
MARZO	24.525.290	97.098.003	48.605.862	72.810.575	14,75%	58,40%	29,23%	43,79%
ABRIL	69.179.233	166.277.236			41,60%	100,00%		

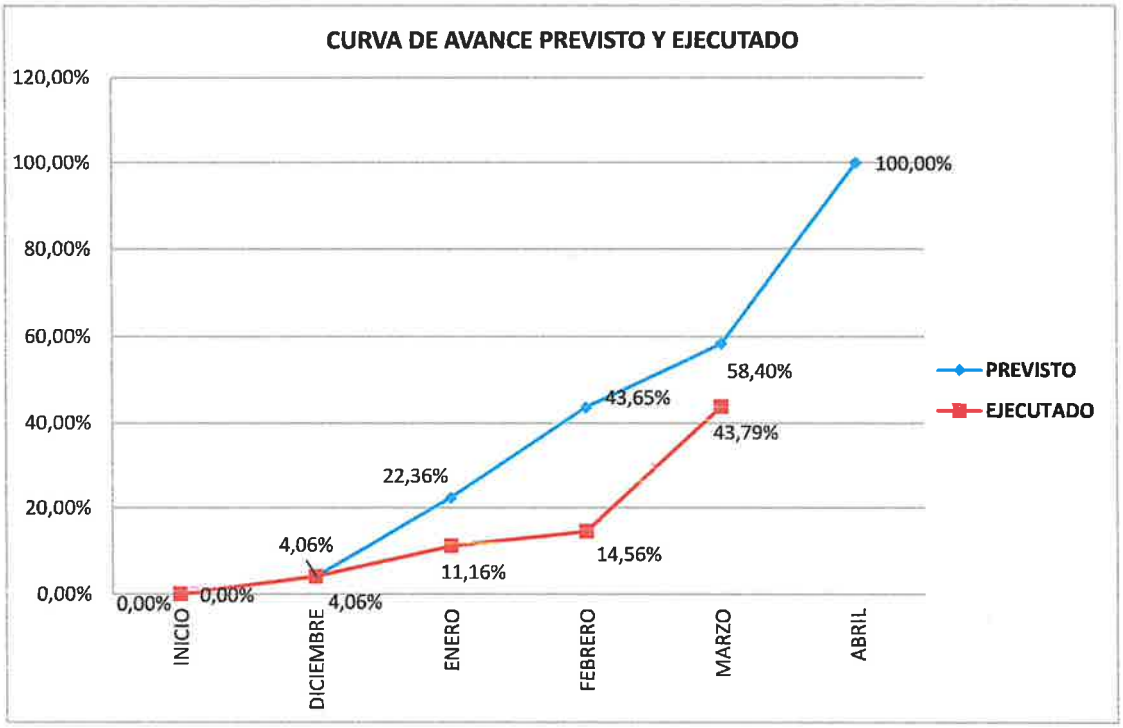

Itinera S.A. - Ing. Juan Fernando Canatta Ruiz
CONTRATISTA

ITINERA S.A.
RUC:80072876-9

Fiscal de Obras
GOBERNACIÓN DE ITAPÚA

Arq. FE... MARINO
Fiscal de Obras
Reg. Prof. N° ...

05

CERTIFICADO BÁSICO DE OBRAS N° 02

CRONOGRAMA FISICO FINANCIERO

LICITACIÓN POR CONTRATACIÓN DIRECTA N° 30/2023 Construcción de Empedrado en la Compañía Potrero Yapepo sobre camino viejo de la Ruta N° 8 – José Leandro Oviedo - Plurianual ID N° 436.867

CONTRATISTA: Itinera S.A. - Ing. Juan Fernando Canatta Ruiz	**CONTRATO N°:** 81/2023
MONTO DE LA OFERTA: 166.277.236 gs	**PLAZO:** 90 dias + 30 dias
LOTE N°: 1	**FECHA DE MEDICIÓN:** 26/03/2024

CAUDRO DE PRECIOS ADJUDICADOS						**PLAZO DE EJECUCIÓN:** 90 dias + 30 dias					**TOTAL**
Construcción de Empedrado en la Compañía Potrero Yapepo sobre camino viejo de la Ruta N° 8 – José Leandro Oviedo - Plurianual ID N° 436.867				Itinera S.A. - Ing. Juan Canatta		**DICIEMBRE 20/12/2023**	**ENERO**	**FEBRERO**	**MARZO**	**ABRIL 18/04/2024**	
Ítem	**Descripción del Bien**	**Unidad de Medida**	**Cantidad**	**Precio unitario (IVA incluído)**	**Precio total**						
1	Replanteo y marcación - Replanteo y marcación de obra, con Equipo Topográfico	Metro lineal	2.800	800	2.240.000	2.240.000					100%
2	Cartel de Obra (Estructura de madera y chapa N° 24) 2,00 x 1,50 m, con impresión adhesiva.-	Unidad	1,00	1.183.175	1.183.175	1.183.175					100%
3	Carteles de señalización de chapa N° 24 (0,30 x 0,80).	Unidad	2,00	1.665.669	3.331.338	3.331.338					100%
4	Construcción de empedrado - Colchón de tierra colorada limpia para asiento de piedra (esp. 0,20 m).	Metros cuadrados	700	7.095	4.966.500			4.966.500			100%
5	Cordon Escondido de Hº (30x15 cm)	Metros cúbicos	3,2	1.024.954	3.279.853				3.279.853		100%
6	Cordón cuneta de Hormigón, 60 cm de ancho.	Metro lineal	700	86.931	60.851.700		30.425.850	30.425.850			100%
7	Construcción de empedrado - Pavimento tipo EMPEDRADO.-	Metros cuadrados	2.625	32.374	84.981.750				21.245.438	63.736.313	100%
8	Relleno y compactacion de terreno - Relleno y compactación para soporte de cordón cuneta.	Metros cúbicos	70	33.756	2.362.920					2.362.920	100%
9	Limpieza Final de Obras.	Metros cuadrados	2.800	1.100	3.080.000					3.080.000	100%
					166.277.236						

PREVISTO MENSUAL EN GUARANIES	6.754.513	30.425.850	35.392.350	24.525.290	69.179.233	**166.277.236**
PREVISTO MENSUAL EN PORCENTAJE	4,06%	18,30%	21,29%	14,75%	41,60%	**100,00%**

Itinera S.A. - Ing. Juan Fernando Canatta Ruiz
Contratista
ITINERA S.A.
RUC:80072876-9

GOBERNACION DEPARTAMENTAL DE ITAPUA
Fiscalización de Obras

Fiscal de Obras
Gobernación de Itapúa
Arq. FÉLIX H. HORINIGO
Fiscal de Obras
Reg. Prof. N° 2265

06

INFORME DE OBRAS

REFERENCIA: LICITACIÓN POR CONTRATACIÓN DIRECTA N° 30/2023 Construcción de Empedrado en la Compañía Potrero Yapepo sobre camino viejo de la Ruta N° 8 – José Leandro Oviedo - Plurianual ID N° 436.867

OBRA: Construcción de Pavimento Pétreo tipo Empedrado.

BENEFICIARIO: Compañía Potrero Yapepo sobre camino viejo de la Ruta N° 8.

FISCAL DE OBRAS: Arq. Felix H. Morinigo Mesrob

FECHA DE VISITA: 26/marzo/2024

AVANCE DE OBRA: 43.79 %

UBICACIÓN	DISTRITO	COORDENADAS UTM	MONTO DE LA OBRA
Compañía Potrero Yapepo sobre camino viejo de la Ruta N° 8	José Leandro Oviedo	x1= 577738 - 7038849	166.277.236 gs.
CONTRATISTA	**N° DE TELEFONO**	**N° DE CONTRATO**	**LOTE / ITEM**
Ing. Juan F. Canatta Ruiz	0981-407029	81/2023	L 1
PLAZO CONTRACTUAL	**FECHA DE INICIO**	**FECHA DE TERMINACIÓN**	**PRORROGAS**
90 días	20/Diciembre/2023	18/Abril/2024	30 dias - Resolución N° 350/2024

OBSERVACIONES GENERALES:

La obra se encuentra en proceso de avance.

Se han ejecutado los trabajos de preparación y carga de hormigón para cordón cuneta.

Se ha realizado la provisión de tierra para colchón de empedrado, provisión y colocación de piedra basáltica negra.

Arq. FELIX H. MORINIGO
Fiscal de Obras
Reg. Prof. N° 3.265

Teléf: +595971204568
Correos: general@itapua.gov.py
generalitapuapy@gmail.com
Gobernación de Itapúa / RUC: 80009721-1
Dirección: Avda. Cnel. Luis Irazábal e/ Cap. Pedro Juan Caballero y Sgto. Reverchon
Encarnación - Itapúa - Paraguay

GOBERNACIÓN DEPARTAMENTAL DE ITAPÚA
Fiscalización de Obras

Arq. FÉLIX M. MORINIGO
Fiscal de Obras
Reg. Prof. N° [illegible]
