Sevicio Nacional de Calidad y Salud Animal - SENACSA

Dirección Operativa de Contrataciones

Departamento de Administración de Contratos

Nro: 4780

Informe de Recepción

Proveedor: SIEMI S.R.L.

Fecha: 11/03/25

Orden provision/trabajo: 16

Factura N°:

Remisiones N°:

Item	Codigo	Servicios	Dirección	Unidad	Cantidad	Costo Unit.	Costo Total
1	1825	Provisión de filtro de aceite - Generador d	División Electrom	Unidad	1,0000	524781	52478
2	1826	Provisión de filtro de combustible-Genera	División Electrom	Unidad	1,0000	453268	45326
3	1827	Provisión de filtro de aire-Generador de 6	División Electrom	Unidad	1,0000	815033	81503
4	1828	Provisión de aceite 15W40. por litro - Ge	División Electrom	Unidad	18,0000	104754	188557
5	1829	Provisión de liquido refrigerante por litro -	División Electrom	Unidad	40,0000	112249	448996
6	1830	Mano de Obra por Servicio Técnico en el	División Electrom	Unidad	1,0000	2158163	215816
7	1831	Transporte por km (camioneta) punto de	División Electrom	kilómetros	324,0000	9923	321505
8	1832	Provisión de bateria de 90 Ah - Generado	División Electrom	Unidad	2,0000	2022418	404483
9	1833	Mano de Obra por cambio - Generador d	División Electrom	Unidad	1,0000	629100	62910

Total General: 18215765

Observación: Corresponde al Grupo Generador Eléctrico de 83KVA - Estación de Aislamiento - Quyquyho

Confeccionado Por: PAMELA SOLEDAD MARECO

Fecha: 11/03/25

Recibido Por: GENARO VERA

Fecha: 11/03/25

SIEMI

GERENCIA DEPARTAMENTO TÉCNICO

ORDEN DE TRABAJO: MANTENIMIENTO PREVENTIVO ANUAL GG - SENACSA QUYQUYO

INF: SER000531

Datos de cliente

Cliente: SENACSA

Nro de identificación: 80000215-6

Dirección: .

Técnico(s) a cargo

Técnico responsable: Ricardo Gomez

Técnicos adicionales: Kevin Espinola.

Conclusión de trabajo: 11/03/2025 08:00

FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO

ESTADO DEL EQUIPO: NORMAL

MEDICIONES ESTACIONARIAS

NIVEL DE COMBUSTIBLE (%): 15

NIVEL DE ACEITE: NORMAL

NIVEL DE REFRIGERANTE: NORMAL

TEMPERATURA MOTOR APAGADO (ºC): 30

FUNCIONAMIENTO DEL CARGADOR ESTATICO: SI

TENSION DE LAS BATERIAS (VOLTS): 26.50

FUNCIONAMIENTO DEL CONTROLADOR: SI

MEDICIONES DE ARRANQUE

TIEMPO DE ARRANQUE (MINUTOS): 15

FUNCIONAMIENTO DEL CARGADOR DINAMICO: SI

PARAMETROS AC GENERADOR

TTA LADO ANDE

TENSION - L/L (VAC): 415

TENSION - L/N (VAC): 240

TENSION - L/GND (VAC): 239

TENSION - N/GND (VAC): 2

Corriente fase R (AMPERIOS): 6

Corriente fase S (AMPERIOS): 7

Corriente fase T (AMPERIOS): 6

Corriente N (AMPERIOS): 7

Frecuencia (Hz): 50

Ing. Juan Torres
Reg. Nº 4240
Siemi S.R.L.

Siemi S.R.L. – Amancio González Nº 129 c/ Avda. Fernando de la Mora – Asunción, Paraguay
Tel.: 021 301 225/6 - **Fax:** 021 301 295 - **E-mail:** siemisrl@siemi.com.py - **Web:** www.siemi.com.py

SIEMI

ESTADO VISUAL DEL EQUIPO

ESTADO DE CABINA: BUENO

LIMPIEZA GENERAL DEL EQUIPO: BUENA

VERIFICACION PANAL DE RADIADOR: REGULAR

SERVICIOS REALIZADOS

CAMBIO DE ACEITE DE MOTOR: SI

CAMBIO DE FILTRO DE ACEITE: SI

CAMBIO DE BATERÍA - LIBRE DE MANTENIMIENTO: SI

VERIFICACIÓN SISTEMA DE COMBUSTIBLE: SI

REAPRIETES DE LAS PIEZAS MECÁNICAS: SI

CAMBIO DE FILTRO DE COMBUSTIBLE: SI

CAMBIO DE FILTRO DE AIRE: SI

CAMBIO DE LÍQUIDO REFRIGERANTE DE RADIADOR: SI

REVISIÓN DE SISTEMAS DE LUBRICACIÓN: SI

CALIBRACIÓN DE LOS COMPONENTES ELECTRÓNICOS: NO

RECOMENDACIONES

RECOMENDACIONES:

Se recomienda reemplazar el motor de arranque ya que el mismo esta con fallas, también reemplazar mangueras de combustible y la tapa de radiador.

FIRMAS DE CLIENTE

Genaro Vera
SENACSA

Ing. Juan Torres
Reg. Nº 4240
Siemi S.R.L.

SIEMI S.R.L. – Amancio González Nº 129 c/ Avda. Fernando de la Mora – Asunción, Paraguay
Tel.: 021 301 225/6 - **Fax:** 021 301 295 - **E-mail:** siemisrl@siemi.com.py - **Web:** www.siemi.com.py

SIEMI

REPORTE FOTOGRAFICO

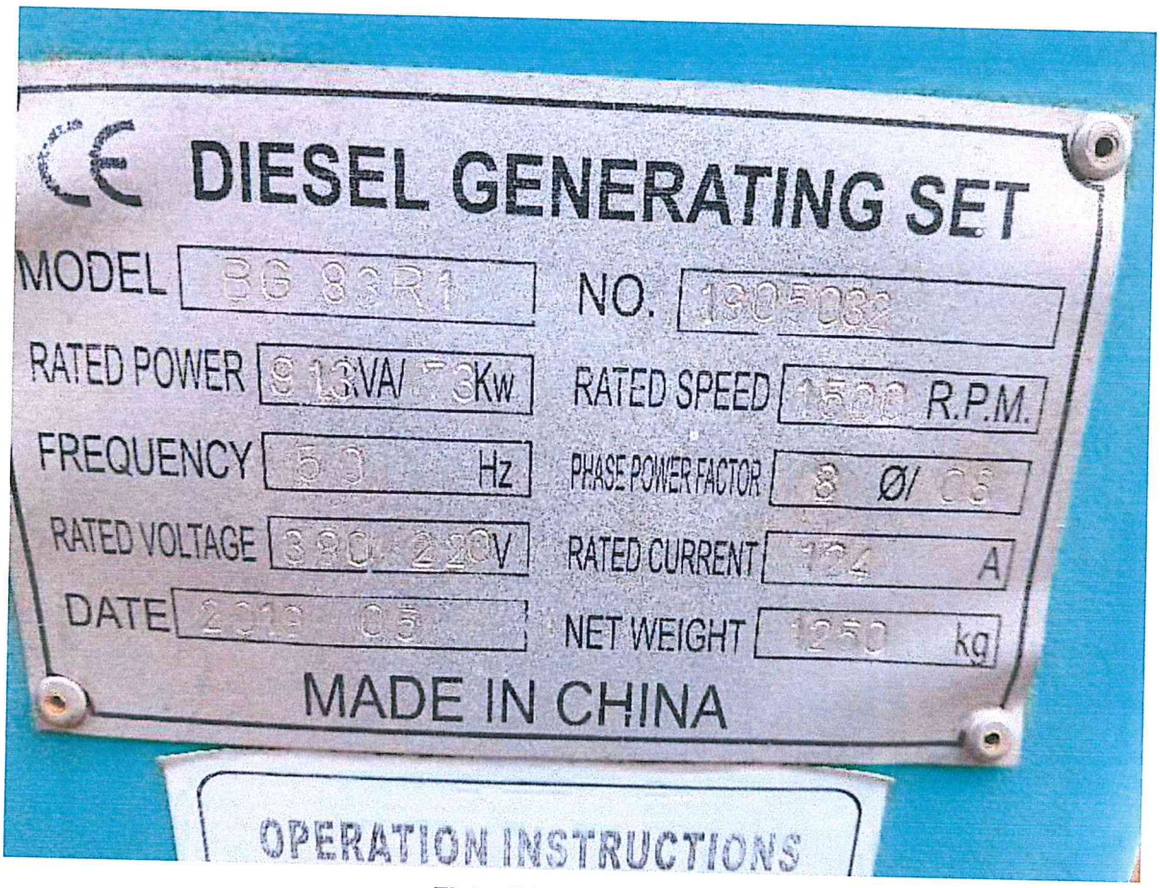

Ficha Técnica del G.G

Ing. Juan Torres
Reg. Nº 4240
Siemi S.R.L.

SIEMI S.R.L. – Amancio González Nº 129 c/ Avda. Fernando de la Mora – Asunción, Paraguay
Tel.: 021 301 225/6 - **Fax:** 021 301 295 - **E-mail:** siemisrl@siemi.com.py - **Web:** www.siemi.com.py

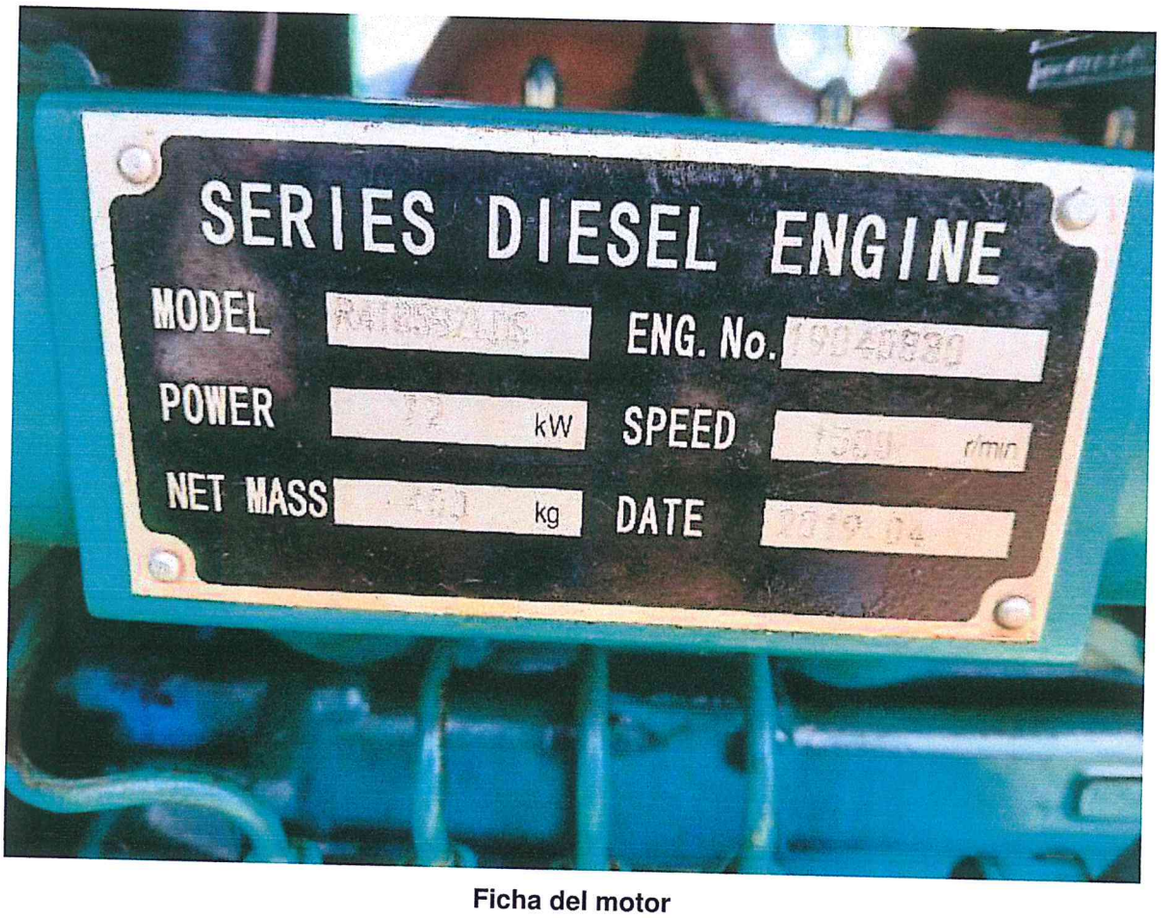

Ficha del motor

Ing. Juan Torres
Reg. Nº 4240
Siemi S.R.L.

SIEMI S.R.L. – Amancio González Nº 129 c/ Avda. Fernando de la Mora – Asunción, Paraguay
Tel.: 021 301 225/6 - **Fax:** 021 301 295 - **E-mail:** siemisrl@siemi.com.py - **Web:** www.siemi.com.py

Vista lateral del G.G

Ing. Juan Torres
Reg. Nº 4240
Siemi S.R.L.

SIEMI S.R.L. – Amancio González Nº 129 c/ Avda. Fernando de la Mora – Asunción, Paraguay
Tel.: 021 301 225/6 - **Fax:** 021 301 295 - **E-mail:** siemisrl@siemi.com.py - **Web:** www.siemi.com.py

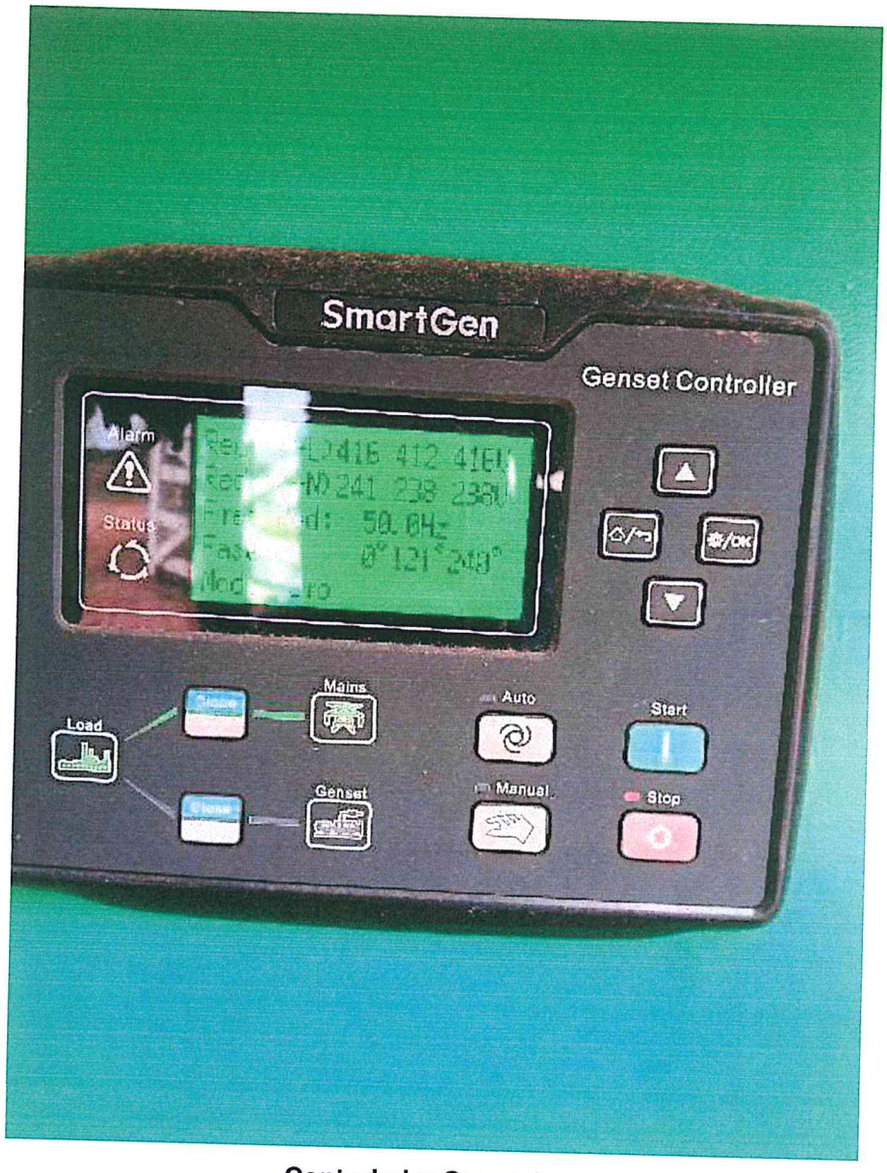

Controlador Smart Gen

Ing. Juan Torres
Reg. Nº 4240
Siemi S.R.L.

SIEMI S.R.L. – Amancio González Nº 129 c/ Avda. Fernando de la Mora – Asunción, Paraguay
Tel.: 021 301 225/6 - **Fax:** 021 301 295 - **E-mail:** siemisrl@siemi.com.py - **Web:** www.siemi.com.py

Vista Lateral del G.G

Ing. Juan Torres
Reg. Nº 4240
Siemi S.R.L.

SIEMI S.R.L. – Amancio González Nº 129 c/ Avda. Fernando de la Mora – Asunción, Paraguay
Tel.: 021 301 225/6 - **Fax:** 021 301 295 - **E-mail:** siemisrl@siemi.com.py - **Web:** www.siemi.com.py

Baterías Nuevas

Ing. Juan Torres
Reg. Nº 4240
Siemi S.R.L.

SIEMI S.R.L. – Amancio González Nº 129 c/ Avda. Fernando de la Mora – Asunción, Paraguay
Tel.: 021 301 225/6 - **Fax:** 021 301 295 - **E-mail:** siemisrl@siemi.com.py - **Web:** www.siemi.com.py

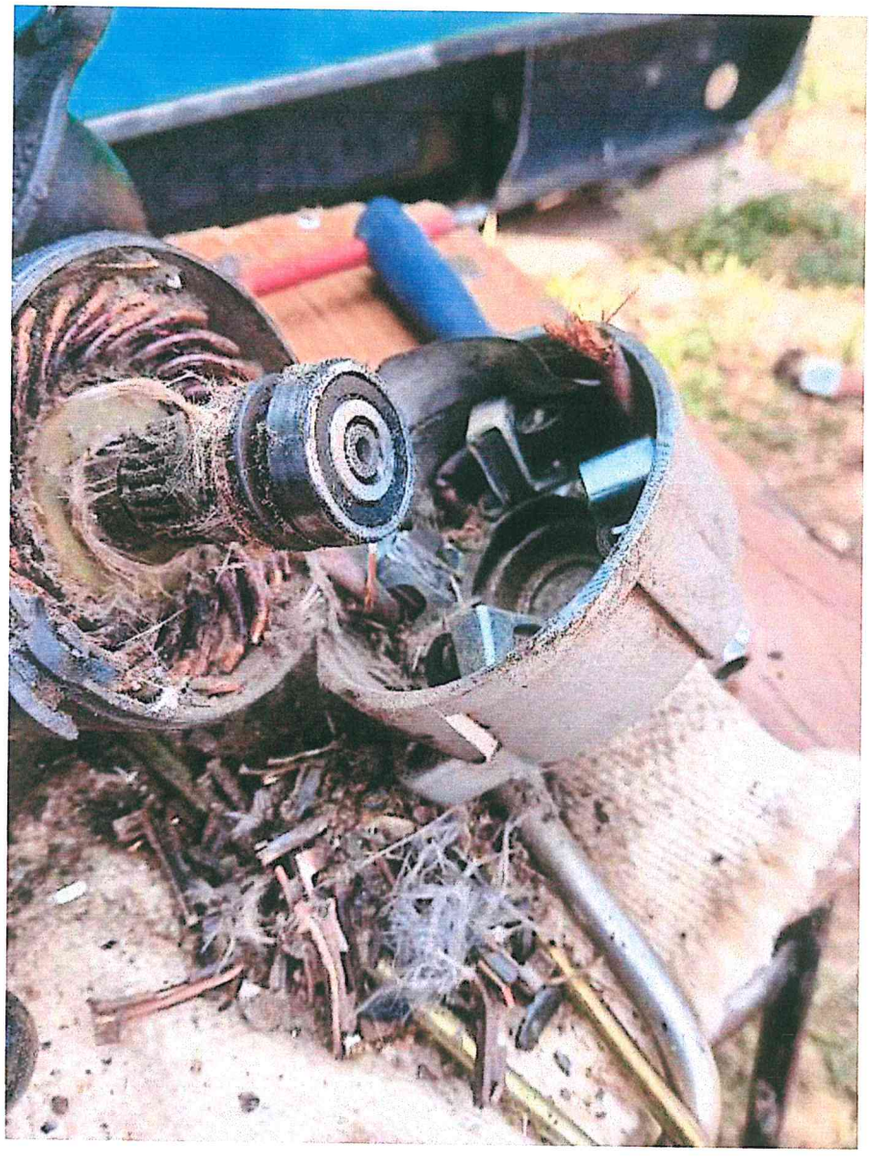

Motor de Arranque con falla

Ing. Juan Torres
Reg. Nº 4240
Siemi S.R.L.

SIEMI S.R.L. – Amancio González Nº 129 c/ Avda. Fernando de la Mora – Asunción, Paraguay
Tel.: 021 301 225/6 - **Fax:** 021 301 295 - **E-mail:** siemisrl@siemi.com.py - **Web:** www.siemi.com.py
