MUNICIPALIDAD DE MINGA GUAZÚ

MINGA GUAZÚ

OBRA: ***Construcción de pavimento tipo empedrado***

DISTRITO: Minga Guazú **DEPTO: Alto Paraná**

UBICACIÓN: Km 34 Acaray - El triunfo

CERTIFICADO DE OBRAS N° 01

Nº	Descripción	Un	Cant.	P.Unit	Total	CERTIFICADOS ACTUAL: ACUMULADO EN CANTIDADES	% EN CANTIDADES	ACUMULADO EN MONTO
	Trabajos Preliminares							
1	Cartel de obra (2,00x1,80mts)	m2	3,60	498.865	1.795.914	3,60	100	1.795.914
2	Replanteo: Levantamiento plani-altimétrico y marcación	m2	1.808,50	2.430	4.394.655	1.808,50	100	4.394.655
3	Preparación de suelo con Motoniveladora.	m2	1.808,50	3.197	5.781.775	1.808,50	100	5.781.775
	Pavimento Tipo Empedrado con colchón de tierra colorada							
4	Colchón: Tierra Colorada (12cm de espesor)	m3	217,02	26.308	5.709.362	217,02	100	5.709.362
5	Piedra bruta basáltica (0,20m3/m2)	m2	1.808,50	36.965	66.851.203	1.808,50	100	66.851.203
6	Enripiado: Triturada tipo VI: (0,02 tn/m2)	m2	1.808,50	3.846	6.955.491	1.808,50	100	6.955.491
	Cordón de Hº							
7	Cordón prefabricado de Ho. 10x50x30(cm) c/ protección lateral	ml	250,00	39.629	9.907.250	250,00	100	9.907.250
8	Cordón cuneta	ml	275,00	109.896	30.221.400	275,00	100	30.221.400
9	Cordón cuneta de (0,10x0,40m)	ml	35,00	102.237	3.578.295	35,00	100	3.578.295
	Canal a cielo abierto de PBC							
10	Excavación manual de suelo natural para canal de PBC	m3	29,40	67.603	1.987.528	29,40	100	1.987.528
11	Base de Hº, esp. 10cm	m3	2,80	716.994	2.007.583	2,80	100	2.007.583
12	Muro de PBC	m3	12,60	537.828	6.776.633	12,60	100	6.776.633
	Compactación							
13	Compactación preliminar	m2	1.808,50	2.964	5.360.394	1.808,50	100	5.360.394
14	Compactación final	m2	1.808,50	3.197	5.781.775	1.808,50	100	5.781.775
	Limpieza final							
15	Limpieza final	m2	1.808,50	1.598	2.889.983	1.808,50	100	2.889.983
	TOTAL SEGÚN CONTRATO SEGÚN CONTRATO N° 31/2023			Total	₲ 159.999.240	TOTAL SEGÚN CERTIFICADO		₲ 159.999.240

Monto de Certificado	159.999.240
Descuento de Anticipo	15.999.924
Fondo de Reparo	7.999.962
Total a Pagar por Certificado	135.999.354

un unidad
m metro
m2 metro cuadrado
m3 metro cúbico

Municipalidad de Minga Guazú
Dirección Obras y Servicios
Período 2021-2026

Tel.: 0742 10
Km. 6 Ro. Dom Bosco - Av. Martín Toledo
Ciudad del Este - Paraguay

MUNICIPALIDAD DE
MINGA GUAZU

Municipalidad de Minga Guazú
Dirección de Obras

Avda. Mcal. Estigarribia Esq. Bernardino Caballero– Km. 16 Minga Guazú
ALTO PARANÁ – PARAGUAY
Teléf. (0644) 20666 Fax. (0644) 21397

ACTA DE RECEPCION PROVISORIA.

VERIFICACION Y CUMPLIMENTO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS

ACTA Nº 1

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO PARA EL DISTRITO DE MINGA GUAZU - CONTRATO N° 31 /2.023-ID: N° 422.716.

CONTRATISTA: SR. JUAN CARLOS BERNAL – ELIAN CONSTRUCCIONES -RUC: 880202-5

En la ciudad de Minga Guazú, Decimo Departamento de Alto Paraná, a los 28 días del mes de diciembre del año dos mil veintitrés, siendo las nueve horas. Yo Arq. Miguel Cáceres en mi carácter de Director de Obras en representación de la Municipalidad de Minga Guazú y en común acuerdo con la empresa contratista me constituyo en el sitio de la obra **"CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO PARA EL DISTRITO DE MINGA GUAZU - CONTRATO N° 31 /2.023-ID: N° 422.716 : LOTE N° 45 Construcción de Pavimento Tipo Empedrado- km 34 Acaray-El Triunfo "** para la RECEPCION PROVISORIA de los trabajos previstos en las especificaciones de obras de la empresa contratista del **SR. JUAN CARLOS BERNAL – ELIAN CONSTRUCCIONES -RUC: 880202-5 .**

Por tanto, la Municipalidad a través de esta Fiscalización RECIBE EN FORMA PROVISORIA en todo de acuerdo a las especificaciones y calidades de obra requeridas, quedando todavía bajo la responsabilidad del contratista los vicios ocultos que puedan surgir a posterior.

Sin otro particular, la saludo atentamente.

Municipalidad de Minga Guazú
Dirección Obras y Servicios
Periodo 2021-2025

Arq. Miguel Cáceres
Director de Obras y Servicios

ELIAN CONSTRUCCIONES
Telef: 574233
Km. 6 Bo. Don Bosco - Av. Fortin Toledo
Ciudad del Este - Paraguay

Elián CONSTRUCCIONES

de: Juan Carlos Bernal Rodriguez

Construcciones de Edificios
Comercio al por menor de otros Materiales de Construcción
Tales como ladrillos, madera y equipos sanitarios

CONSTRUCCIONES DE OBRA CIVILES * PAVIMENTACIÓN DE CALLES Y CALZADAS

Av. Fortín Toledo y Bolivia · Tel:.(061) 574 293 / (0983) 400 102 · Ciudad del Este · Alto Paraná · Paraguay

TIMBRADO Nº 16673164
R.U.C.: 880202 - 5
Fecha Inicio Vigencia 13/09/2023
Fecha Fin Vigencia 30/09/2024

FACTURA

001 - 001 0001472

Fecha de Emisión: 28 de Diciembre de 2023 Condición de Venta: Contado [ ] Crédito [X]

Nombre o Razón Social: Municipalidad de Minga Guazu

R.U.C.: 80010478-1 Nota de Remisión Nº:

Dirección: Tel.:

Cant.	Descripción	Precio Unitario	Valor de Venta		
			Exentas	I.V.A.5%	I.V.A. 10%
1	Certificado Nº1 Contrato Nº31/23	135.999.354			135.999.354
	Lote 45. Km 34 Acaray - El Triunfo				
	ID: 422.716				
Sub Total					135.999.354

Total a Pagar: GS. [X] U$. [ ] (En Letras) Ciento treinta y cinco millones novecientos noventa y nueve mil trescientos cincuenta y cuatro 135.999.354

Liquidación del IVA: 5% 10% 12.363.577 Total IVA 12.363.577

ARTES GRÁFICAS NIÑO JESÚS S.R.L. - Matriz: Calle Boquerón entre Adrian Jara Y Pa i Perez. entre Banco Vision Y Banco Atlas Nº 133 - Suc: Santa Ana Calle Heriberto Matiauda E/ 28 de Julio y Primer Presidente a 30mts. de la "Iglesia el mas Vencedor" - RUC 80052469/1- Telefax: 061-512551 - 02 Tal 50x3 del 0001401 al 0001500 - 09/2023 - Cédula de Habilitación de Imprenta Nº 1663

ORIGINAL: Cliente
DUPLICADO: Arch. Tributario
TRIPLICADO: Contabilidad

Ministerio de
INDUSTRIA
Y COMERCIO

GOBIERNO
NACIONAL

Paraguay de la gente

CONSTANCIA DE REGISTRO DE PRESTADORES DE SERVICIOS - REPSE

Ruc : 8802025 JUAN CARLOS BERNAL RODRIGUEZ

Teléfono/s : 061-574293 **Website** :

Fax : 061-574293 **Email Corp.:** elianconstruciones@hotmail.com

Dirección : AVENIDA, AV. FORTIN TOLEDO Y LA BLANCA - ALTO PARANA - CIUDAD DEL ESTE(PLANTA URBANA)

Estado : Activo

Se registró en REPSE bajo el N° 014867

Conforme al Decreto N° 6866/11 y Normativas Vigentes. Este registro tiene fecha de vencimiento el 18/10/2024

Otorgado en Asunción, el 18/10/2018

Renovado el 03/11/2022

Este certificado no implica la habilitación para la obtención de licencias, permisos o registros que puedan ser exigidos por otras reparticiones o instituciones gubernamentales.

Para mayor información ingresar, con la clave y usuario correspondientes, al Sistema Electrónico VUE - Página Web www.vue.org.py

8802025

13042023 1448 8802025 8802025

014867

DIRECCIÓN NACIONAL DE INGRESOS TRIBUTARIOS

GERENCIA GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS **NUMERO 4270167490040**

FORM.427-1 **FECHA 16/12/2023**

CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO TRIBUTARIO

DATOS DEL SOLICITANTE

RUC	880202	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL
DV	5	BERNAL RODRIGUEZ JUAN CARLOS

A LA FECHA DE EXPEDICIÓN DEL PRESENTE DOCUMENTO EL CONTRIBUYENTE HA CUMPLIDO CON SUS OBLIGACIONES ANTE LA ADMINISTRACIÓN Y SE EMITE EL PRESENTE CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO TRIBUTARIO EN CARÁCTER NORMAL EN VIRTUD A LO ESTABLECIDO EN EL ART. Nº 194 DE LA LEY Nº 125/91 Y SU MODIFICACIÓN CON LA LEY Nº 2421/04 Y DEMÁS DISPOSICIONES VIGENTES.

VALIDO HASTA: 15/01/2024 NÚMERO DE CONTROL : A7CA090D

DIRECCIÓN NACIONAL DE INGRESOS TRIBUTARIOS

4271880202A7CA090D

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

DNCP DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS

Formulario de Informe de Servicios Personales - FIS

Proveedor Adjudicado

JUAN CARLOS BERNAL RODRIGUEZ

RUC

880202-5

Entidad Contratante

Municipalidad de Minga Guazú

Descripción del llamado / Contrato

ID: 435976 / CONCURSO DE OFERTAS Nº 08/23 CONSTRUCCIÓN DE AULAS, AULA NIVEL INICIAL Y PISTA EN DISTINTAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO. PLURIANUAL EJERCICIOS 2023/2024

Monto del contrato

441.592.731

Año: 2023 Periodo: Diciembre

Empleados vinculados al contrato

Nro.	Nombres	Apellidos	Funciones Exclusivas	Remuneración	Relación	Estado
1	Altagracio Iran	Bernal Rodriguez	Cumplio	1855638	Contratista	Activo

Usuario Impresión: elianconstruciones

Fecha Impresión: 16/12/2023

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

DNCP
DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS

Formulario de Identificación del Personal - FIP

Proveedor Adjudicado

JUAN CARLOS BERNAL RODRIGUEZ

RUC

980202-5

Entidad Contratante

Municipalidad de Minga Guazú

Descripción del llamado / Contrato

ID: 422716 / LICITACION PUBLICA NACIONAL 01/23 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO PARA EL DISTRITO DE MINGA GUAZÚ

Monto del contrato

1.320.084.548

Empleados vinculados al contrato

Nro.	Nombres	Apellidos	Nro. Documento	Dedicación	Relación	Fecha desvinculación
1	Altagracio Iran	Bernal Rodriguez	1207290	EXCLUSIVA	LABORAL	

Usuario Impresión: elianconstruciones

Fecha Impresión: 16/12/2023

Elián CONSTRUCCIONES

Av. Fortín Toledo y La Blanca – Km. 6 – Barrio Don Bosco Ciudad del Este
Tel.: (061) 574 293 – Cel. :(0983) 400 102.-

LPN 01/23 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO PARA EL DISTRITO DE MINGA GUAZÚ. ID Nº: 422.716

Contrato Nº 31/23 - Lote 45 Km 34 Acaray - El Triunfo

Monto: 159.999.240

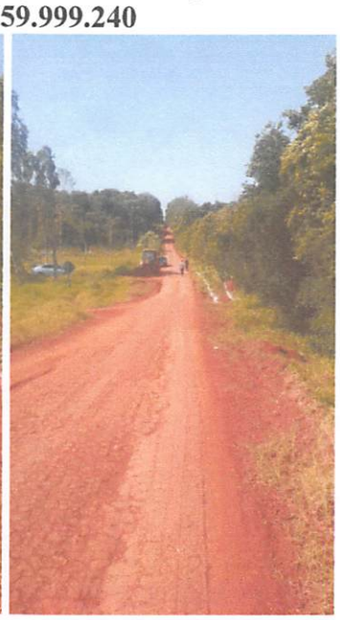

ELIAN CONSTRUCCIONES
TELEF.:574 293
KM 6 Bº Don Bosco-Av. Fortín Toledo
Ciudad del Este- Paraguay
