ACTA DE MEDICION

En la ciudad de Luque a los Veintiún días del mes de Setiembre del año dos mil veintidós, se reúnen por una parte el Ing. Benigno Ramírez, Fiscal de Obra, en representación de la Municipalidad de la Ciudad de Luque, y por otra parte el Sr. Marcelino Vera en representación de la firma MULTISERVIS, a los efectos de labrar el Acta de Medición que corresponde a los Rubros de la **"Obras: "PROYECTO DE MEJORAMIENTO VIAL CALLE 2° CAPITAL E/CNEL. BOGADO Y ALBERDI LOMA MERLO, DE LA CIUDAD DE LUQUE."** Adjudicataria según **Contrato N°59/2022.**Suscripto con la Municipalidad de la Ciudad de Luque, se ha procedido a la medición y verificación de los trabajos realizados hasta el 20 de Setiembre del 2022 correspondiente al Certificado de Obra N° 2 Addenda Ampliatoria en proceso.

Las Mediciones citadas arrojaron las siguientes cantidades:

Especificaciones Técnicas

1. **Empedrado**

$(\frac{1.20+0.80}{2})$ x46,00	=	46,00m2
$(\frac{1.50+0.80}{2})$ x8,00	=	9,20m2
Diferencia	=	31,00m2
Total	**=**	**86,20m2**

2. **Muro de Piedra**

Volumen	**=**	**18,00m3**

PROCESADO

3. **Losa de Alcantarilla**

Longitud	=	2,40m
Ancho	=	1,50m
Espesor	=	8,00cm
Volumen	**=**	**0,288m3**

Se da Acta de avance de los trabajos culminados, firmándose el acta en dos copias de un mismo tenor y en total acuerdo entre el representante de la Municipalidad de Luque y el Contratista.

Contratista.

MUNICIPALIDAD DE LUQUE * DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS *

Ing. Benigno D. Ramirez B.
Fiscalización de Obras.
Municipalidad de Luque

PLANO DE MEDICION

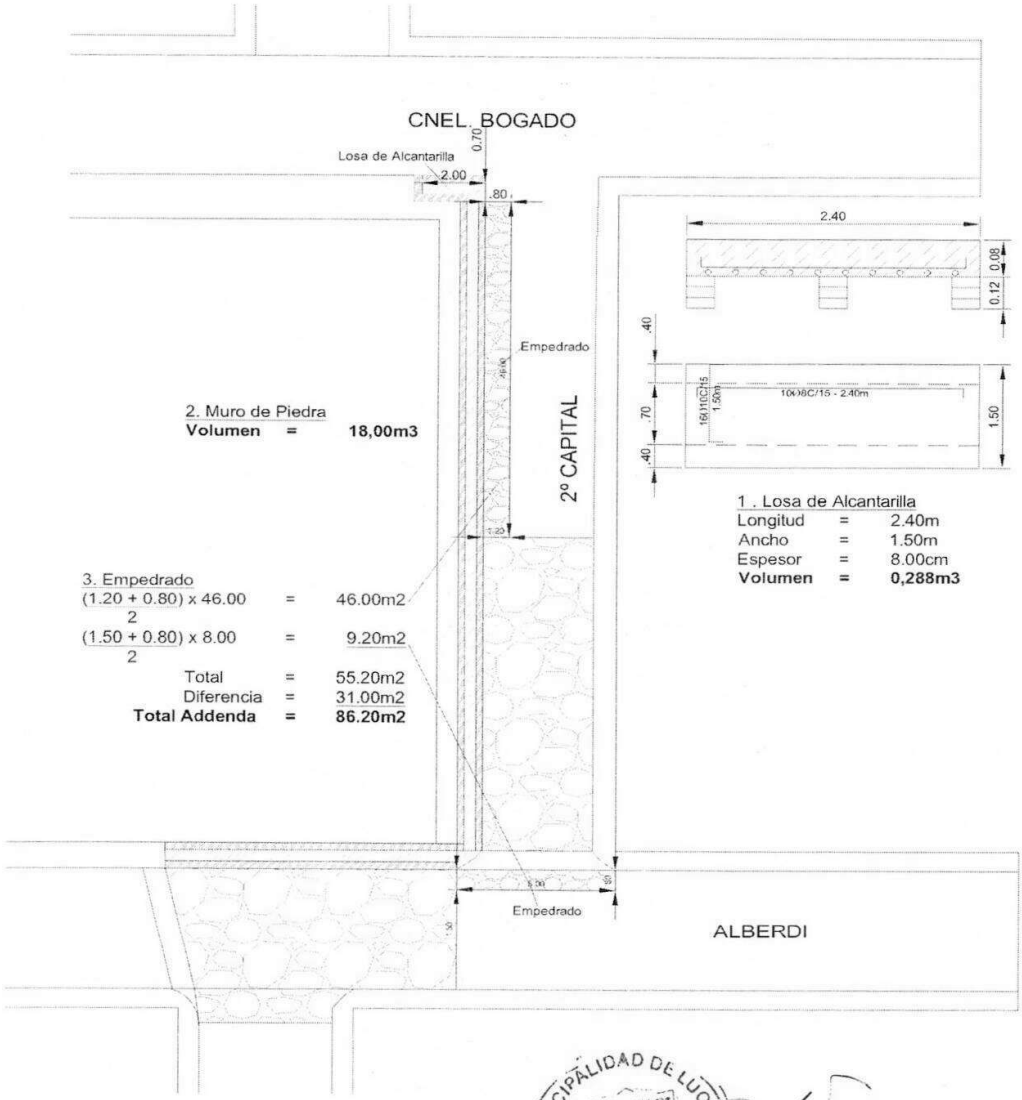

2. Muro de Piedra
Volumen = 18,00m3

3. Empedrado

(1.20 + 0.80) / 2 x 46.00	=	46.00m2
(1.50 + 0.80) / 2 x 8.00	=	9.20m2
Total	=	55.20m2
Diferencia	=	31.00m2
Total Addenda	=	**86.20m2**

1 . Losa de Alcantarilla

Longitud	=	2.40m
Ancho	=	1.50m
Espesor	=	8.00cm
Volumen	=	**0,288m3**

M. UNICIPALIDAD DE LUQUE
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

Ing. Benigno D. Ramirez B.
Jefe de Obras Públicas
Municipalidad de Luque

PROCESADO

TOMAS FOTOGRAFICAS

PROCESADO

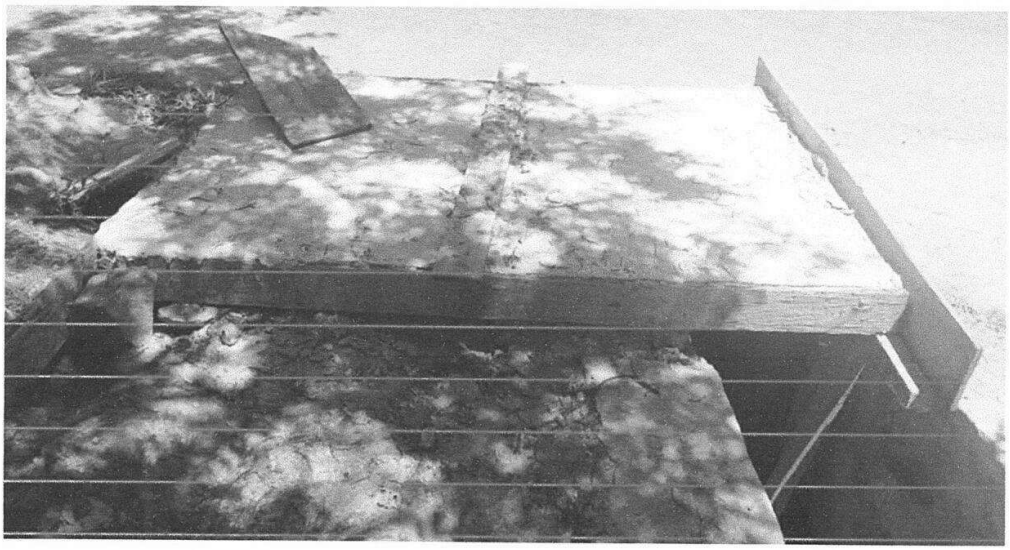

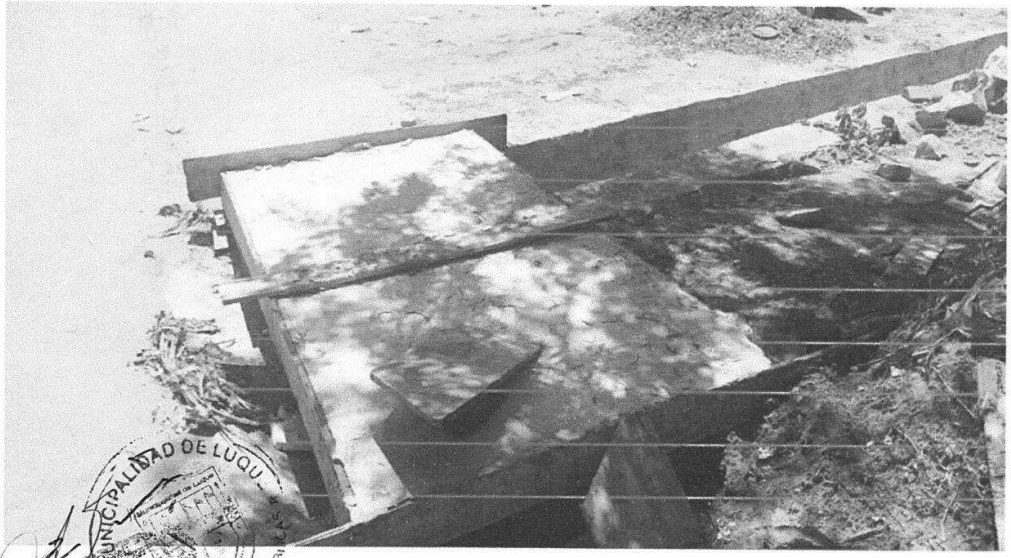

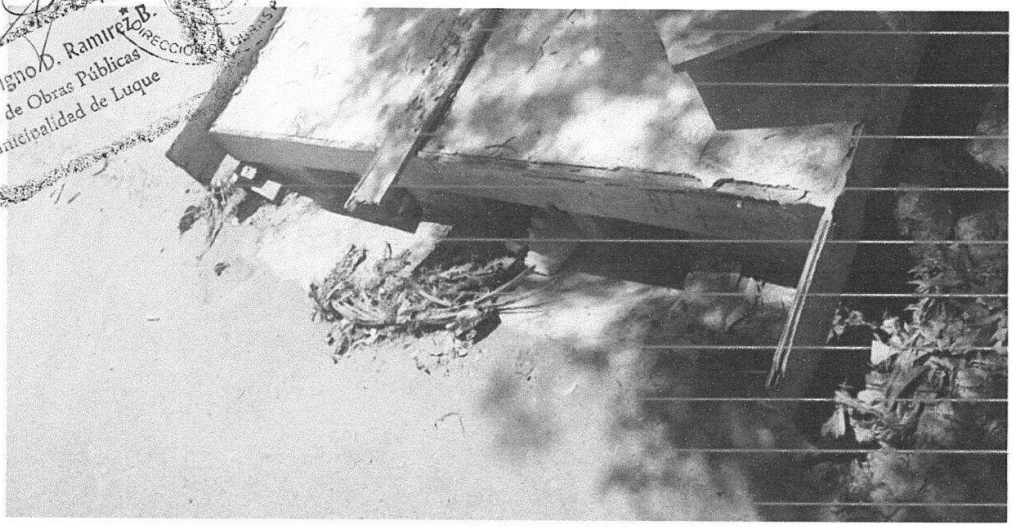

MUNICIPALIDAD DE LUQUE
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
Benigno D. Ramírez B.
Jefe de Obras Públicas
Municipalidad de Luque

PROCESADO

MUNICIPALIDAD DE LUQUE

Ing. Virgino D. Ramirez B.
Jefe de Obras Públicas
Municipalidad de Luque
