GOBERNACION DEL X DEPARTAMENTO ALTO PARANA

Av. Bernardino Caballero y Rogelio Benítez – Tel/Fax; (595) 61 518 105

Ciudad del Este – República del Paraguay

www.altoparana.gov.py

Paraguay de la gente

CIUDAD DEL ESTE, 04 DE DICIEMBRE DE 2019.-

INFORME TECNICO

A: PROF. DR. ROBERTO GONZALEZ VAESKEN
GOBERNADOR DEL ALTO PARANÁ.

C.C.: ABOG. ANTONIO DUARTE
SECRETARIA DE HACIENDA.

DE: LIC. MIGUEL ANGEL RESTAINO
SECRETARIO DE OBRAS.

Referencia: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO EN DIFERENTES DISTRITOS DEL DEPARTAMENTO DE ALTO PARANÁ - PLURIANUAL 2020 - CONTRATO N° 55/2019 - ID N° 368.600 - LOTE N° 6

Objeto: Dictamen de Certificación de Obra.

Se realizó la verificación y medición de la obra LUGAR KM 5 Y MEDIO LA BLANCA, KM 10 ACARAY FRACCION CAACUPEMI – CIUDAD DEL ESTE , que forma parte de la LICITACION PUBLICA NACIONAL Nº 07/2019, CONTRATO Nº 55/2019 para la CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO EN DIFERENTES DISTRITOS DEL DEPARTAMENTO DE ALTO PARANÁ - PLURIANUAL 2020 - ID Nº 368600, adjudicado por Resolución Nº 1852/2019 GAP, Adjudicado a la Empresa **CONSTRUCTORA PEREIRA THALMANN S.R.L.,** representado por la Sr. Juan José Pereira Thalmann.

El resultado de la medición, obran en el Acta de Medición Nº 2 y es refrendada en la Certificación de Obra Nº 2 en la cual se mencionan los montos de los rubros ya ejecutados, descuento por anticipo y las retención caucional que corresponde a la obra, y lo que corresponde al pago por parte de la Gobernación del Alto Paraná.

La fiscalización informa que los trabajos están siendo ejecutados en plazo y forma, conforme a las especificaciones técnicas y el pliego de bases y condiciones.

Es mi informe.

Lic. Miguel Ángel Restaino
Secretario de Obras

CONSTRUCTORA
PEREIRA THALMANN
Víctor Cáceres 409 c/Pindó – Telefax 571651 – E-mail: pereirathalmann@hotmail.com
San Lorenzo – Paraguay

Ciudad del Este, ___ de Diciembre de 2019

SEÑOR
ABOG. ROBERTO GONZALEZ VAEZKEN, GOBERNADOR
DEPARTAMENTO DE ALTO PARANÁ
PRESENTE

Por la presente me dirijo a Ud, y por su digno intermedio a quién corresponda con relación al llamado LPN 07/2019, a los efectos de presentar CERTIFICADO DE OBRA Nº 2 y Documentaciones Adicionales, correspondiente al Contrato Nº 55/2019 para la **"CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO EN DIFERENTES DISTRITOS DEL DEPARTAMENTO DE ALTO PARANA – PLURIANUAL 2020"**

Sin otro motivo aprovecho la oportunidad para saludarle muy atentamente.

Ing. Juan José Pereira
Representante Legal

CONSTRUCTORA
PEREIRA THALMANN S.R.L.

GOBERNACION DEL X DEPARTAMENTO ALTO PARANA
Av. Bernardino Caballero y Rogelio Benítez – Tel/Fax; (595) 61 518 105
Ciudad del Este – República del Paraguay

CERTIFICADO DE OBRAS Nº 02

OBRA: Construccion de pavimento tipo Empedrado en diferentes distritos del Departamento de Alto Paraná - Plurianual 2020 - Contrato N° 55/2019 - ID N° 368.600 - Lote N° 6

FECHA: 17 de diciembre 2019

						CERTIFICADOS ANTERIORES			CERTIFICADO Nº2		
Nº	RUBRO	UNIDAD	CANT.	PRECIO UNITARIO	TOTAL	ANTERIOR	%	ACUMULADO	ACTUAL	%	ACUMULADO
1	***Trabajos Preliminares***										
2	*Cartel de Obra:*	m2	4,00	425.000	1.700.000	4,00	100%	1.700.000	-	0%	-
3	*Replanteo: Levantamiento plani-altimétrico y Marcación*	m2	4.390,00	2.125	9.328.750	4.000,00	91%	8.500.000	200,00	5%	425.000,00
4	*Preparación de Suelo con Motoniveladora*	m2	4.390,00	2.550	11.194.500	4.000,00	91%	10.200.000	200,00	5%	510.000,00
5	*Colchón: Tierra Colorada*	m3	1.975,50	2.550	5.037.525	1.800,00	91%	4.590.000	90,00	5%	229.500,00
6	*Piedra Bruta Basáltica (0,20 m^3/m^2)*	m2	4.390,00	24.650	108.213.500	3.900,00	89%	96.135.000	200,00	5%	4.930.000,00
7	*Enripiado: Triturada Tipo VI: (0,02 tn/m^2)*	m2	4.390,00	2.550	11.194.500	-	0%	-	-	0%	-
8	*Cordón prefabricado de Ho. 10x 30 [cm] c/ proteccion lateral*	ml	1.105,00	24.650	27.238.250	1.000,00	90%	24.650.000	55,00	5%	1.355.750,00
9	*Compactación preliminar*	m2	4.390,00	2.550	11.194.500	-	0%	-	3.950,00	90%	10.072.500,00
10	*Compactación Final*	m2	4.390,00	2.550	11.194.500	-	0%	-	3.950,00	90%	10.072.500,00
11	*Limpieza final de obra*	m2	4.390,00	1.275	5.597.250	-	0%	-	-	0%	-
12	*Cartel de Obra:*	m2	4,00	425.000	1.700.000	4,00	100%	1.700.000	-	0%	-
13	*Replanteo: Levantamiento plani-altimétrico y Marcación*	m2	3.487,00	2.125	7.409.875	3.150,00	90%	6.693.750	200,00	6%	425.000,00
14	*Preparación de Suelo con Motoniveladora*	m2	3.487,00	2.550	8.891.850	3.150,00	90%	8.032.500	200,00	6%	510.000,00
15	*Colchón: Tierra Colorada*	m3	1.569,15	2.550	4.001.333	1.250,00	80%	3.187.500	200,00	13%	510.000,00
16	*Piedra Bruta Basáltica (0,20 m^3/m^2)*	m2	3.487,00	24.650	85.954.550	1.750,00	50%	43.137.500	1.380,00	40%	34.017.000,00
17	*Enripiado: Triturada Tipo VI: (0,02 tn/m^2)*	m2	3.487,00	2.550	8.891.850	-	0%	-	-	0%	-
18	*Cordón prefabricado de Ho. 10x 30 [cm] c/ proteccion lateral*	ml	362,00	24.650	8.923.300	255,00	70%	6.285.750	80,00	22%	1.972.000,00
19	*Cordon cuneta*	ml	136,00	76.500	10.404.000	-	0%	-	-	0%	-
20	*Construccion de Canal a Cielo Abierto*	ml	397,00	340.000	134.980.000	-	0%	-	150,00	38%	51.000.000,00
21	*Compactación preliminar*	m2	3.487,00	2.550	8.891.850	-	0%	-	2.800,00	80%	7.140.000,00
22	*Compactación Final*	m2	3.487,00	2.550	8.891.850	-	0%	-	2.800,00	80%	7.140.000,00
23	*Limpieza final de obra*	m2	3.487,00	1.275	4.445.925	-	0%	-	-	0%	-
	TOTAL SEGÚN CONTRATO				495.279.658	**CERTIFCACION ACUMULADO**		**214.812.000**	**TOTAL CERT.**		**130.309.250**

Lic. Miguel Restaino
Secretario de Obras

Ing. Juan José Pereira Thalmann
Constructora Pereira Thalmann S.R.L

CONSTRUCTORA
PEREIRA THALMANN S.R.L.

Monto de Certificado	130.309.250
Descuento de Anticipo	0
Fondo de Reparo	6.515.463
Total a pagar por Certificado	**123.793.788**

GOBERNACION DEL X DEPARTAMENTO ALTO PARANA
Av. Bernardino Caballero y Rogelio Benítez – Tel/Fax; (595) 61 518 105
Ciudad del Este – República del Paraguay

ACTA DE MEDICION 02

En Ciudad del Este, a los **17 días del mes de diciembre del año 2019** se reúnen el **Lic. Miguel Restaino**, el Secretario de Obras en representación de la Gobernacion del Alto Paraná. y el **Sr. Juan Jose Pereira Thalmann** representante de la Empresa Contratista de Obras **Constructora Pereira Thalmann S.R.L**, a efectos de realizar las mediciones del **Certificado Nº 02**, correspondiente a de la Obra: **Construccion de pavimento tipo Empedrado en diferentes distritos del Departamento de Alto Paraná - Plurianual 2020 - Contrato N° 55/2019 - ID N° 368.600 - Lote N° 6,** firmado entre la Gobernacion del Alto Paraná y el Contratista de Obras.

Ítem	Rubros	Unidad	Cant. Anterior	Cant. Actual	Cant. Acumulada
1	***Trabajos Preliminares***				
2	*Cartel de Obra:*	m2	4,00	-	4,00
3	*Replanteo: Levantamiento plani-altimétrico y Marcación*	m2	4.000,00	200,00	4.200,00
4	*Preparación de Suelo con Motoniveladora*	m2	4.000,00	200,00	4.200,00
5	*Colchón: Tierra Colorada*	m3	1.800,00	90,00	1.890,00
6	*Piedra Bruta Basáltica (0,20 m^3/m^2)*	m2	3.900,00	200,00	4.100,00
7	*Enripiado: Triturada Tipo VI: (0,02 tn/m^2)*	m2	-	-	-
8	*Cordón prefabricado de Ho. 10x 30 [cm] c/ proteccion lateral*	ml	1.000,00	55,00	1.055,00
9	*Compactación preliminar*	m2	-	3.950,00	3.950,00
10	*Compactación Final*	m2	-	3.950,00	3.950,00
11	*Limpieza final de obra*	m2	-	-	-
12	*Cartel de Obra:*	m2	4,00	-	4,00
13	*Replanteo: Levantamiento plani-altimétrico y Marcación*	m2	3.150,00	200,00	3.350,00
14	*Preparación de Suelo con Motoniveladora*	m2	3.150,00	200,00	3.350,00
15	*Colchón: Tierra Colorada*	m3	1.250,00	200,00	1.450,00
16	*Piedra Bruta Basáltica (0,20 m^3/m^2)*	m2	1.750,00	1.380,00	3.130,00
17	*Enripiado: Triturada Tipo VI: (0,02 tn/m^2)*	m2	-	-	-
18	*Cordón prefabricado de Ho. 10x 30 [cm] c/ proteccion lateral*	ml	255,00	80,00	335,00
19	*Cordon cuneta*	ml	-	-	-
20	*Construccion de Canal a Cielo Abierto*	ml	-	150,00	150,00
21	*Compactación preliminar*	m2	-	2.800,00	2.800,00
22	*Compactación Final*	m2	-	2.800,00	2.800,00
23	*Limpieza final de obra*	m2	-	-	-

Lic. Miguel Restaino
Gobernación del Alto Paraná
Secretario de Obras Publicas

Ing. Juan Jose Pereira Thalmann
Constructora Pereira Thalmann S.R.L
Contratista

CONSTRUCTORA
PEREIRA THALMANN S.R.L

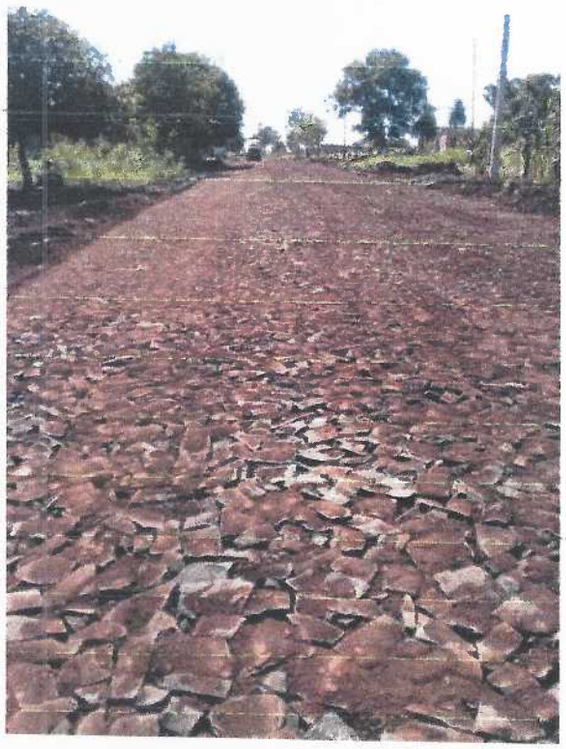

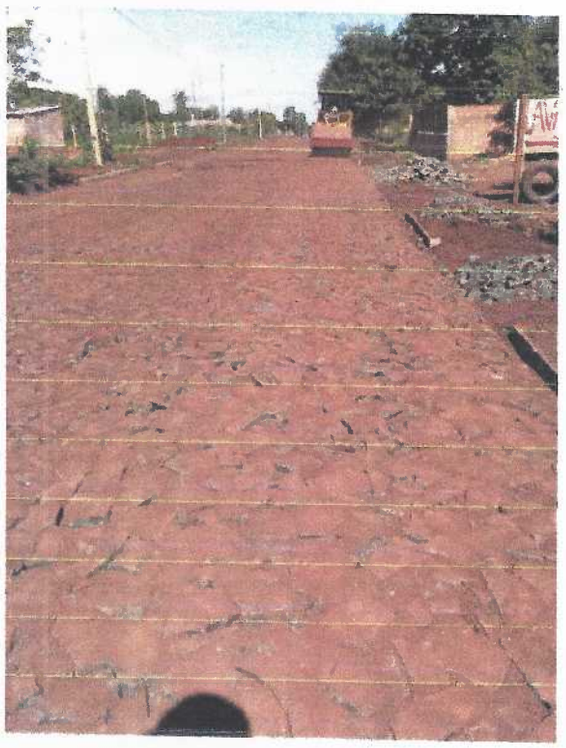

CONSTRUCTORA PEREIRA
THALMANN S.R.L.

CONSTRUCTORA PEREIRA
THALMANN S.R.L.

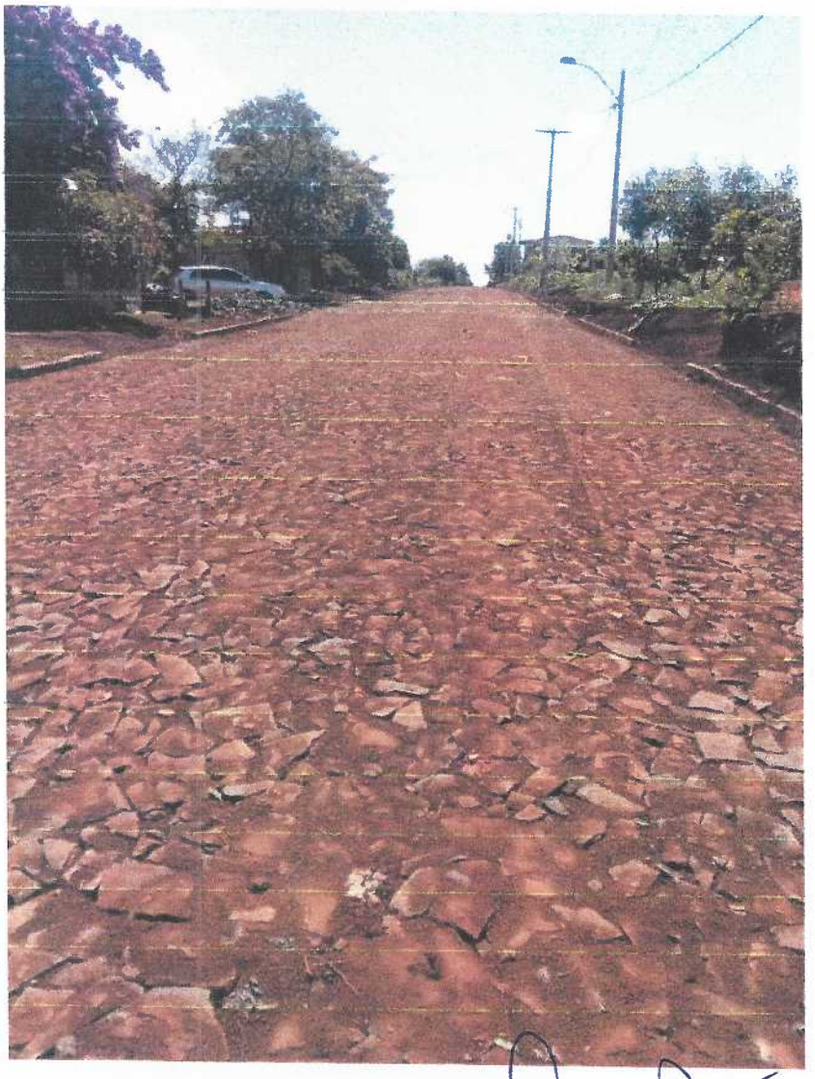

CONSTRUCTORA PEREIRA
THALMANN S.R.L.

CONSTRUCTORA PEREIRA
THALMANN S.R.L.

CONSTRUCTORA PEREIRA
THALMANN S.R.L.

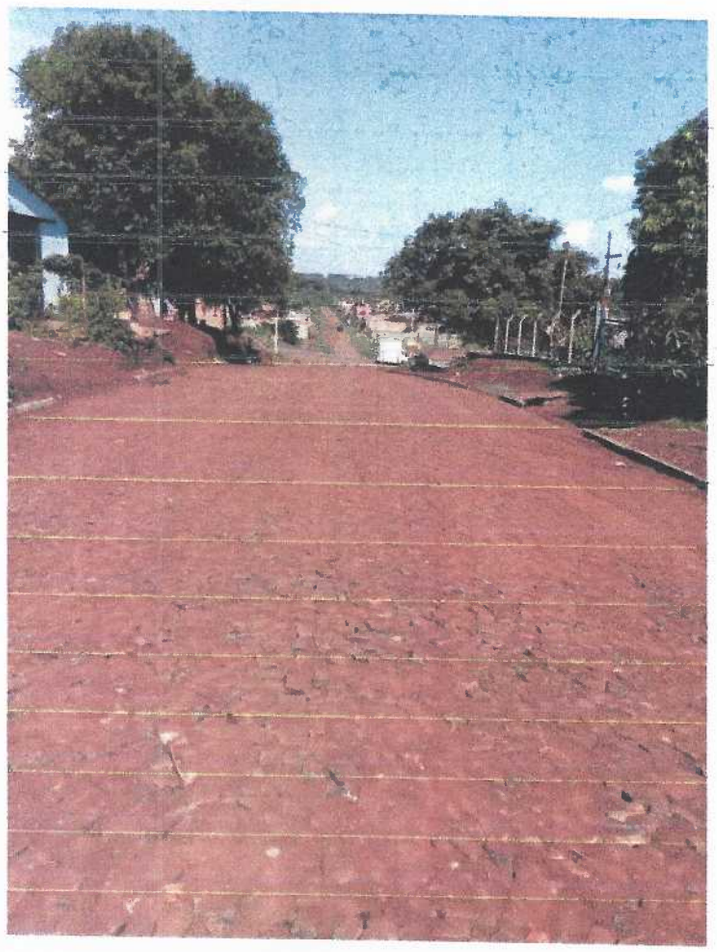

CONSTRUCTORA PEREIRA
THALMANN S.R.L.
