GOBERNACION DE ITAPÚA

Resúmen del Certificado Básico Nº 01

Mes: Diciembre - Enero - Febrero

LICITACIÓN POR CONTRATACIÓN DIRECTA N° 30/2023 Construcción de Empedrado en la Compañía Potrero Yapepo sobre camino viejo de la Ruta N° 8 – José Leandro Oviedo - Plurianual ID N° 436.867

Posición	Conceptos	Importes Autorizados		Importes Certificados					
				Hasta Certificado Anterior		Presente Certificado		Total Certificado a la Fecha	
		%	(1)	% Avance de Obra	(2)	% Avance de Obra	(3)	% Avance de Obra	(2+3)
A	Certificaciones de Obra Ejecutada por Precio Unitario								
A.I	Construcción de Empedrado en la Compañía Potrero Yapepo sobre camino viejo de la Ruta N° 8 – José Leandro Oviedo - Plurianual ID N° 436.867	100,00%	166.277.236	0,00%	0	14,56%	24.204.713	14,56%	24.204.713
A	**Total por Contrato**	**100,00%**	**166.277.236**	**1**	**0**	14,56%	**24.204.713**	14,56%	**24.204.713**

B	Deducciones a la fecha			Hasta Certificado Anterior	Presente Certificado	Total Certificado a la Fecha
B.I	Devolución de Anticipo	*20,00%*	33.255.447	0	4.840.943	4.840.943
B.II	Para Fondo de Reparo	*0,00%*	0	0	0	0
B	**Total Deducciones**		**33.255.447**	**0**	**4.840.943**	**4.840.943**
C.I	**Importe Liquido a Pagar Según Presente Certificado (A - B)**				19.363.770	
C.II	Multas				0	
C	**Importe Neto a Pagar Según Presente Certificado (A - B)**				**19.363.770**	

Certificado Básico Nº 01

Mes: Diciembre - Enero - Febrero

Contrato N°: 81/2023

Monto Básico: 166.277.236 gs

Contratista: Itinera S.A. - Ing. Juan F. Canatta Ruiz

Fecha de Inicio: 20/Diciembre/2023

Plazo de Ejecución: 90 dias

Fecha de Terminación: 19/Marzo/2024

SON GUARANIES: Diecinueve millones trescientos sesenta y tres mil setecientos setenta.

.....

Secretario de Obras Públicas y Transporte

Gobernacion de Itapúa

Ing. Fernando Oreggioni
Secretario Departamental de Obras Públicas y Transporte
Gobernacion de Itapúa

.....

Itinera S.A. - Ing. Juan Fernando Canatta Ruiz

Contratista

Itinera S.A.
RUC: 80072876-9

20

CERTIFICADO BÁSICO DE OBRAS N° 01

PLANILLA DE MEDICIÓN Y CERTIFICADO

LICITACIÓN POR CONTRATACIÓN DIRECTA N° 30/2023 Construcción de Empedrado en la Compañía Potrero Yapepo sobre camino viejo de la Ruta N° 8 – José Leandro Oviedo - Plurianual ID N° 436.867

CONTRATISTA: Itinera S.A. - Ing. Juan Fernando Canatta Ruiz	**CONTRATO N°:** 81/2023
MONTO DE LA OFERTA: 166.277.236 gs	**PLAZO:** 90 dias
LOTE N°: 1	**FECHA DE MEDICIÓN:** 22/02/2024

CAUDRO DE PRECIOS ADJUDICADOS							PLANILLA DE MEDICIÓN N° 01						PLANILLA DE CERTIFICADO BÁSICO N° 01					
Construcción de Empedrado en la Compañía Potrero Yapepo sobre camino viejo de la Ruta N° 8 – José Leandro Oviedo - Plurianual ID N° 436.867				Itinera S.A. - Ing. Juan Canatta		INCIDENCIA DEL RUBRO SOBRE EL TOTAL	EN PORCENTAJE			EN INCIDENCIA			CANTIDAD EJECUTADA			CANTIDAD EJECUTADA EN GS.		
Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total		ACUMUL. ANTERIOR	PRESENTE	ACUMUL. TOTAL	ACUMUL. ANTERIOR	PRESENTE	ACUMUL. TOTAL	ACUMUL. ANTERIOR	PRESENTE	ACUMUL. TOTAL	ACUMUL. ANTERIOR	PRESENTE	ACUMUL. TOTAL
1	Replanteo y marcación - Replanteo y marcación de obra, con Equipo Topográfico	Metro lineal	2.800	800	2.240.000	0,013	0%	100%	100%	0,000	0,013	0,013	0	2800	2800,00	0	2.240.000	2.240.000
2	Cartel de Obra (Estructura de madera y chapa N°. 24) 2,00 x 1,50 m, con impresión adhesiva.-	Unidad	1,00	1.183.175	1.183.175	0,007	0%	100%	100%	0,000	0,007	0,007	0	1,00	1,00	0	1.183.175	1.183.175
3	Carteles de señalización de chapa N° 24 (0,30 x 0,80).	Unidad	2,00	1.665.669	3.331.338	0,020	0%	100%	100%	0,000	0,020	0,020	0	2,00	2,00	0	3.331.338	3.331.338
4	Construcción de empedrado - Colchón de tierra colorada limpia para asiento de piedra (esp. 0,20 m).	Metros cuadrados	700	7.095	4.966.500	0,030	0%	0%	0%	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	0
5	Cordon Escondido de Hº (30x15 cm)	Metros cúbicos	3,2	1.024.954	3.279.853	0,020	0%	0%	0%	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	0
6	Cordón cuneta de Hormigón, 60 cm de ancho.	Metro lineal	700	86.931	60.851.700	0,366	0%	27,29%	27%	0,000	0,100	0,100	0	191	191	0	16.603.821	16.603.821
7	Construcción de empedrado - Pavimento tipo EMPEDRADO.-	Metros cuadrados	2.625	32.374	84.981.750	0,511	0%	0%	0%	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	0
8	Relleno y compactacion de terreno - Relleno y compactación para soporte de cordón cuneta.	Metros cúbicos	70	33.756	2.362.920	0,014	0%	35,82%	36%	0,000	0,005	0,005	0	25,07	25,07	0	846.379	846.379
9	Limpieza Final de Obras.	Metros cuadrados	2.800	1.100	3.080.000	0,019	0%	0%	0%	0,000	0,000	0,000	0	0	0,00	0	0	0
					166.277.236	**100%**				**0,00%**	**14,56%**	**14,56%**				**0**	**24.204.713**	**24.204.713**

.....

Itinera S.A. - Ing. Juan Fernando Canatta Ruiz

Contratista

Itinera S.A.

RUC: 80072876-9

.....

Fiscal de Obras

Gobernacion de Itapúa

Ing. Fernando Oreggioni

Secretario Departamental de Obras Publicas y Transporte

Gobernacion de Itapúa

GOBERNACIÓN DE ITAPÚA

CERTIFICADO BÁSICO DE OBRAS N° 01

LICITACIÓN POR CONTRATACIÓN DIRECTA N° 30/2023 Construcción de Empedrado en la Compañía Potrero Yapepo sobre camino viejo de la Ruta N° 8 – José Leandro Oviedo - Plurianual ID N° 436.867

Contrato N°: 81/2023	
Monto del Contrato: 166.277.236 gs	**Term. Prevista:** 19/Marzo/2024
Plazo Contractual: 90 dias	**Prorrogas:**
Inicio de Obra: 20/Diciembre/2023	**Mes:** Diciembre - Enero - Febrero

CUADRO DE AVANCE PREVISTO Y EJECUTADO

Contrato N°: 81/2023

MES	PREVISTO GS.		EJECUTADO GS.		PREVISTO %		EJECUTADO %	
	MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO
INICIO	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
DICIEMBRE	6.754.513	6.754.513	6.754.513	6.754.513	4,06%	4,06%	4,06%	4,06%
ENERO	30.425.850	37.180.363	11.805.684	18.560.197	18,30%	22,36%	7,10%	11,16%
FEBRERO	55.392.350	92.572.713	5.644.516	24.204.713	33,31%	55,67%	3,39%	14,56%
MARZO	73.704.523	166.277.236			44,33%	100,00%		

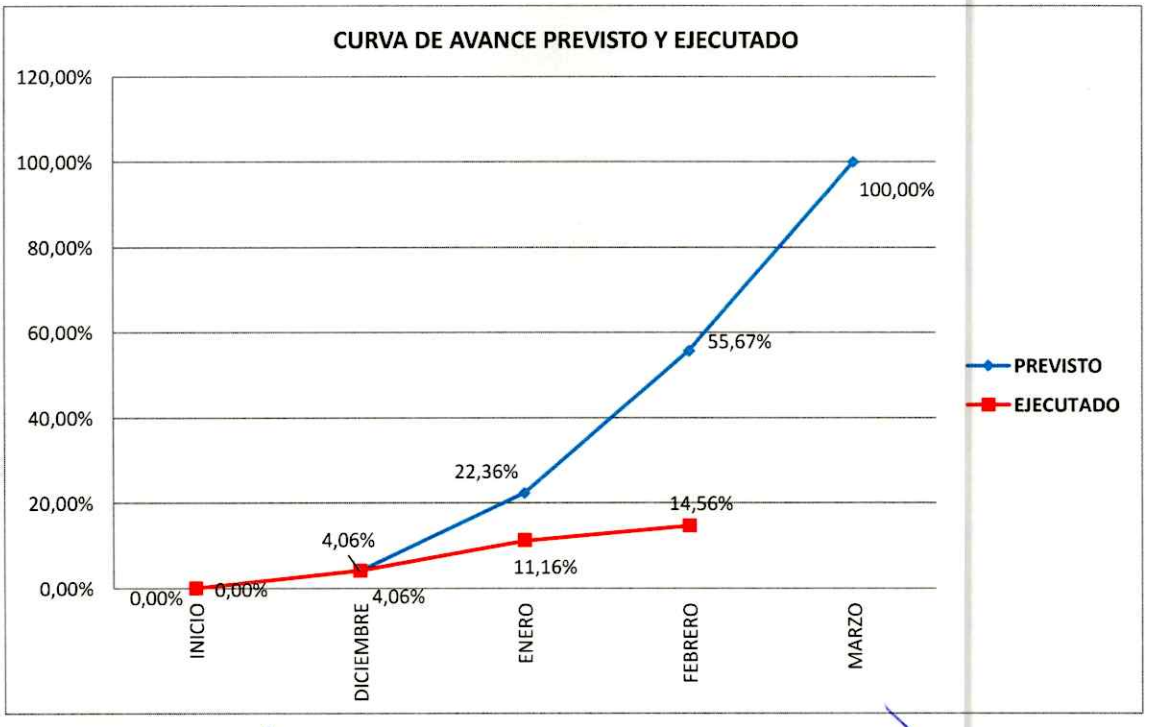

.....

Itinera S.A. - Ing. Juan Fernando Canatta Ruiz

CONTRATISTA

Itinera S.A.

RUC: 80072876-9

.....

Fiscal de Obras

GOBERNACIÓN DE ITAPÚA

GOBIERNO DEPARTAMENTAL ITAPUA Secretaría Públicas y Trans

Ing. Fernando Oreggioni
Secretario Departamental de
Obras Públicas y Transporte
Gobernación de Itapúa

05

CERTIFICADO BÁSICO DE OBRAS N° 01

CRONOGRAMA FISICO FINANCIERO

LICITACIÓN POR CONTRATACIÓN DIRECTA N° 30/2023 Construcción de Empedrado en la Compañía Potrero Yapepo sobre camino viejo de la Ruta N° 8 – José Leandro Oviedo - Plurianual ID N° 436.867

CONTRATISTA: Itinera S.A. - Ing. Juan Fernando Canatta Ruiz	**CONTRATO N°:** 81/2023
MONTO DE LA OFERTA: 166.277.236 gs	**PLAZO:** 90 dias
LOTE N°: 1	**FECHA DE MEDICIÓN:** 22/02/2024

CAUDRO DE PRECIOS ADJUDICADOS						**PLAZO DE EJECUCIÓN:** 90 dias				**TOTAL**
Construcción de Empedrado en la Compañía Potrero Yapepo sobre camino viejo de la Ruta N° 8 – José Leandro Oviedo - Plurianual ID N° 436.867				Itinera S.A. - Ing. Juan Canatta		**DICIEMBRE 20/12/2023**	**ENERO**	**FEBRERO**	**MARZO 19/03/2024**	
Ítem	**Descripción del Bien**	**Unidad de Medida**	**Cantidad**	**Precio unitario (IVA incluído)**	**Precio total**					
1	Replanteo y marcación - Replanteo y marcación de obra, con Equipo Topográfico	Metro lineal	2.800	800	2.240.000	2.240.000				100%
2	Cartel de Obra (Estructura de madera y chapa N° 24) 2,00 x 1,50 m, con impresión adhesiva.-	Unidad	1,00	1.183.175	1.183.175	1.183.175				100%
3	Carteles de señalización de chapa N° 24 (0,30 x 0,80).	Unidad	2,00	1.665.669	3.331.338	3.331.338				100%
4	Construcción de empedrado - Colchón de tierra colorada limpia para asiento de piedra (esp. 0,20 m).	Metros cuadrados	700	7.095	4.966.500			4.966.500		100%
5	Cordon Escondido de Hº (30x15 cm)	Metros cúbicos	3,2	1.024.954	3.279.853				3.279.853	100%
6	Cordón cuneta de Hormigón, 60 cm de ancho.	Metro lineal	700	86.931	60.851.700		30.425.850	30.425.850		100%
7	Construcción de empedrado - Pavimento tipo EMPEDRADO.-	Metros cuadrados	2.625	32.374	84.981.750			20.000.000	64.981.750	100%
8	Relleno y compactacion de terreno - Relleno y compactación para soporte de cordón cuneta.	Metros cúbicos	70	33.756	2.362.920				2.362.920	100%
9	Limpieza Final de Obras.	Metros cuadrados	2.800	1.100	3.080.000				3.080.000	100%
					166.277.236					

PREVISTO MENSUAL EN GUARANIES	6.754.513	30.425.850	55.392.350	73.704.523	**166.277.236**
PREVISTO MENSUAL EN PORCENTAJE	4,06%	18,30%	33,31%	44,33%	**100,00%**

.....

Itinera S.A. - Ing. Juan Fernando Canatta Ruiz

Contratista

Itinera S.A.

RUC: 80072876-9

.....

Fiscal de Obras

Gobernacion de Itapúa

GOBIERNO DEPARTAMENTAL ITAPUA – Secretaría de Obras Públicas y Transporte

Ing. Fernando Bergoggioni

Secretario Departamental de Obras Públicas y Transporte

Gobernación de Itapúa

90

INFORME DE OBRAS

REFERENCIA: LICITACIÓN POR CONTRATACIÓN DIRECTA N° 30/2023 Construcción de Empedrado en la Compañía Potrero Yapepo sobre camino viejo de la Ruta N° 8 – José Leandro Oviedo - Plurianual ID N° 436.867

OBRA: Construcción de Pavimento Pétreo tipo Empedrado.

BENEFICIARIO: Compañía Potrero Yapepo sobre camino viejo de la Ruta N° 8.

FISCAL DE OBRAS: Ing. Fernando Oreggioni

FECHA DE VISITA: 22/Febrero/2024

AVANCE DE OBRA: 14.56 %

UBICACIÓN	DISTRITO	COORDENADAS UTM	MONTO DE LA OBRA
Compañía Potrero Yapepo sobre camino viejo de la Ruta N° 8	José Leandro Oviedo	x1= 577738 - 7038849	166.277.236 gs.
CONTRATISTA	**N° DE TELEFONO**	**N° DE CONTRATO**	**LOTE / ITEM**
Ing. Juan F. Canatta Ruiz	0981-407029	81/2023	L 1
PLAZO CONTRACTUAL	**FECHA DE INICIO**	**FECHA DE TERMINACIÓN**	**PRORROGAS**
90 días	20/Diciembre/2023	19/Marzo/2024	------

OBSERVACIONES GENERALES:

La obra se encuentra en proceso de avance.

Se han ejecutado los trabajos de relevamiento topográfico y marcación, trabajos de movimientos de suelo, apertura de caja y terraplén. Se está realizando trabajos de preparación y carga de hormigón para cordón cuneta.

Ing. Fernando Oreggioni
Secretario Departamental de Obras Publicas y Transporte
Gobernación de Itapúa
