29 (veintinueve)

Ministerio de OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

Paraguay de la gente

MESA DE ENTRADA ÚNICA
EXPEDIENTE Nº 15900/2023

TITULAR:
CONSORCIO IATASA CIA S. A.

NOMBRE Y APELLIDO:
Tania Chavez

TELEFONO:
0976318934

CORREO ELECTRONICO:

REFERENCIA:
1 FJ. LLAMADO MOPC N° 59/2021. REF: CONSULTA SOBRE LA APROBACION DEL PRODUCTO N° 2

FACTURA: Nro. 0 **Monto: GS.** 0

USUARIO/FECHA/HORA DE REGISTRO.:

GFDUARTE 24/03/2023 07:23:10

CONSULTA AL : 021-4149000

"La recepción del documento no implica conformidad ni aceptación de su contenido. Sujeto a verificación y control por parte de los órganos intervinientes\"

28 (veintiocho)

Acuse
4to piso Sofia

Consorcio IATASA INGENIERIA CIA

Asunción, 22 de marzo de 2023

Señor

Ing. Julio Ríos, Jefe UEP

Unidad ejecutora del Programa de Rehabilitación y Viviendas del Bañado Sur Tacumbú-PR-L1152-MOPC
PRESENTE

Nota: 04.2023
Ref.: Llamado MOPC N° 59/2021 "Consultoría para estudios de Saneamiento de la Laguna Yrupé, Recuperación de zonas naturales de amortiguamiento, elaboración de Diseño Ejecutivo y permisos de infraestructura para construcción de Parque Lineal Yrupé-Barrio Tacumbú" ID 392.135

De nuestra consideración,

Nos dirigimos a Ud. por el presente, con el objeto de consultar respecto a la aprobación del Producto 2-Diagnóstico del Proyecto de Referencia presentado el 26 de febrero del corriente.

Cabe resaltar que los plazos que cuenta el proyecto para la entrega del proyecto ejecutivo son muy ajustados por la envergadura del mismo, por lo tanto se requiere dicha aprobación a fin de proseguir con la siguiente etapa, Producto 3-Alternativas.

Aguardando una respuesta favorable me despido saludando atentamente

Ing. Willian Campos Cervera
Representante Legal

M.O.P.C.
UEP - PRVBT
Programa Barrio Tacumbú
Exp. N°: 128
Fecha: 23-03-2023
Hora: 10:25
Recibido:
Rodrigo Jara D

27 (veintisiete)

Ministerio de OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

Paraguay de la gente

MESA DE ENTRADA ÚNICA
EXPEDIENTE Nº 26464/2023

TITULAR:
CONSORCIO IATASA - CIA

NOMBRE Y APELLIDO:
Tania Chavez

TELEFONO:
(0976) 318 934

CORREO ELECTRONICO:

REFERENCIA:
3F. LLAMADO MOPC Nº 59/2021.
SOLICITUD DE PRORROGA DE PLAZOS DE EJECUCION.

M.O.P.C. V.M.O.P.
Exp. Nº 8269
Fecha 09 JUN 2023 Hora 8:26
Firma

FACTURA: Nro. 0 Monto: GS. 0

USUARIO/FECHA/HORA DE REGISTRO.:

SARDIAN 08/06/2023 12:09:1

SECRETARIA GENERA
GABINETE DEL MINISTRO
Jef. Gabinete ____ DIPE
D.Asuntos Jur. ____ D.de Tic'
D.Relaciones P. ____ D.Auditoria
Secretaria Privada ____ U.O.C
D.Comunicaciones ____ DAPSA
Patrullia Caminera ____ DGES
C.RR.II. ____ DT
VMOP ____
D.Obras Públicas ____ Comisión P c. ____
D.Vialidad ____ D.Caminos V c. ____
Div.Arch y Bib. ____ D.B.I ____ UE E
VMAF ____
D.Finanzas ____ D.Planif.Eco
D.Contaduría ____ D.Bienes y
D.Rec.Humanos ____ D.Crédito
VMME ____
D.Rec.Energ. ____ D.Rec.Minerales ____
VMT ____
Dirección de Marina Mercante ____
OTROS ____

M.O.P.C.
G.V.M.O.P.C.
Fecha: 13 JUN 2023

☐ VMAF	☑ DV	☐ DCV	☐ DOP
☐ C. TEC.	☐ DPV	☐ DBI	☐ CNRP
☐ COAF	☐ RU/BTR	☐ UGPAS	☐ SG
☐ CAPE	☐ DAJ	☐ CDTV	☐ UEPIP
☐ UOC	☐ JGM		

Ing. Rubén Andino Lezcano
Viceministro de Obras Públicas y Comunicaciones

BRENDA MARIA JOSE GIMENEZ GONZALEZ
Firmado digitalmente por BRENDA MARIA JOSE GIMENEZ GONZALEZ
Fecha: 2023.06.08 13:21:23 -04'00'

M.O.P.C.
DIRECCION DE VIALIDAD
Exp. Nº: 7781/26464
Fecha: 14 JUN 2023
Hora: 11:00

M.O.P.C.
DIRECCION DE VIALIDAD
☐ VMOP ☐ DE ☐ DGC ☐ DGV
☐ ATD ☐ DSV ☐ DAV ☐ DPV
☐ DC
VER PRUEBA

Ing. Víctor Olmedo
Director de Vialidad

26 (veintiseis)

M.O.P.C.
UEP - PRVBT
Programa Barrio Tacumbú
Exp. Nº: 253
Fecha: 15-06-2023
Hora: 14:29
Recibido:

PROGRAMA PRVBT Exp. Nº: 253
Fecha de Recep: 15/06/23
A: SUPERVISIÓN DE CONTRATO.
G. GONZÁLEZ, R. ORTIZ.
Obs.: P/ su verificación e informe.
Fecha: 15/06/23.

Ing. Julio A. Ríos M.
Jefe UEP PRL 1152
DV MOPC

ACUNE - OFICINA DE DOBLECTO STO ALSO

25 (veinticinco)

Consocio
IATASA INGENIERÍA
CIA

Asunción, 6 de junio de 2023

Señor
Ing. Julio Ríos, Jefe UEP
Unidad ejecutora del Programa de Rehabilitación y
Viviendas del Bañado Sur Tacumbú-PR-L1152-MOPC
PRESENTE

Nota: 06/2023
Ref.: Llamado MOPC N° 59/2021 "Consultoría para estudios de Saneamiento de la Laguna Yrupé, Recuperación de zonas naturales de amortiguamiento, elaboración de Diseño Ejecutivo y permisos de infraestructura para construcción de Parque Lineal Yrupé-Barrio Tacumbú" ID 392.135
Objeto: Solicitud de Prórroga. Ampliación Nota 05/2023

De nuestra consideración,

Me dirijo a Ud. por el presente en relación con la consultoría de referencia, a fin de ampliar la nota N° 5.2023, a través de la cual se solicita la prórroga de los plazos de ejecución de este contrato debido al tiempo que llevó la aprobación del Producto N°2, principalmente, a causa de que no fueron incorporados al cronograma de ejecución y entrega de los productos, los plazos de revisión y aprobación correspondiente a cada producto.

El Consorcio CIA-IATASA había entregado para revisión el Producto N°2 "Diagnostico" el 22/12/2022, entregado la versión final el 26/02/2023 luego de una serie de entregas y revisiones (Ver informe técnico adjunto). El 28/02/2023, a través de la nota DV N°420/2023 fue remitido al BID el Producto N°2. En fecha 22/03/2023 se había consultado a través de la nota N°04/2023 y MEU 15900/2023 consulta sobre la aprobación del Producto N°2, alertando que no podríamos iniciar la etapa de Anteproyecto (Producto N°3) antes de la aprobación del Producto N°2. El cual fue aprobado con observaciones el 23/03/2023 a través de la nota N°39/2023.

Además, un tema bien relevante fue el cambio del personal Clave del Arquitecto Arq. Javier Corvalán en fecha 21 de marzo de 2022 por solicitud de la UEP en su Nota UEP-PRVBT N° 34/2023 (Adjunto) y que fuera aprobado el reemplazo por la Arq. Patricia Mariano en fecha 11 de abril de 2023 en la Nota UEP-PRVBT N° 39/2023 (Adjunto). Dicho cambio implicó un período de reestructuración, reconocimiento del proyecto de los profesionales incorporados para continuar con el desarrollo del proyecto.

Teniendo en cuenta lo anterior y que el cronograma de entregables previsto en el contrato no contempla los periodos de revisión, ajuste y socialización de cada producto, se propone el siguiente cronograma de productos entregables:

CONSORCIO
IATASA-CIA

24 (veinticuatro)

M.O.P.C.
UEP - PRVBT
Programa Barrio Tacumbú
Exp. Nº: 239
Fecha: 07/06/13
Hora: 15:42
Recibida: Abel Maxlery

Consocio

IATASA INGENIERÍA

CIA

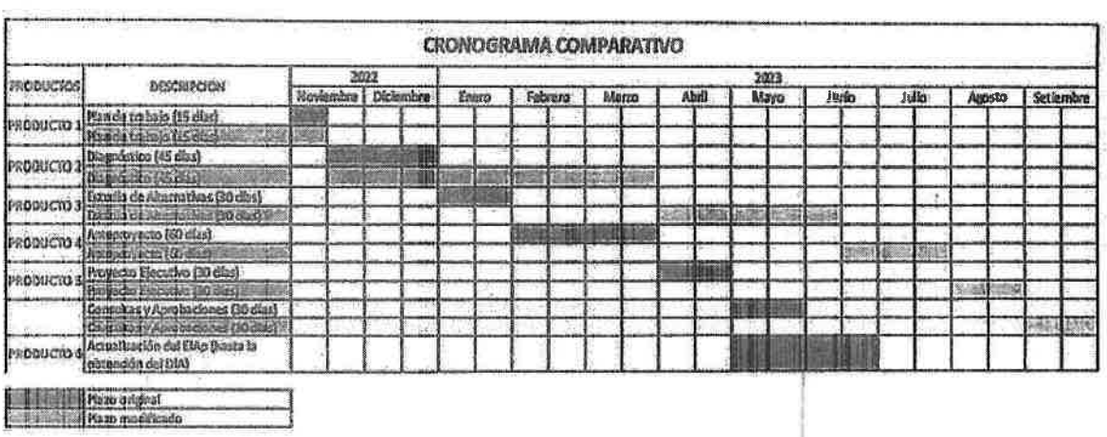

Por tanto, conforme a lo expresado y en la necesidad de incorporar al cronograma los periodos de revisión y aprobación de manera a contar con un Proyecto ejecutivo adecuado y ejecutado en forma integral, en el periodo de tiempo razonable; solicitamos extender el plazo de presentación del Producto N°3 y los siguientes a este, otorgándonos una prórroga al plazo de ejecución del contrato, de acuerdo al siguiente calendario:

Producto	Descripción	Fecha original	Tiempo Original de Ejecución del Producto/días	Propuesta de ampliación de plazos	Tiempo propuesto a partir de la orden de inicio
PRODUCTO 1	Plan de trabajo	16/11/2022	15		15
PRODUCTO 2	Diagnóstico	31/12/2022	45	23/03/2023	128
PRODUCTO 3	Alternativas	30/01/2023	30	5/6/2023	78
PRODUCTO 4	Anteproyecto	31/03/2023	60	4/8/2023	56
PRODUCTO 5	Proyectro Ejecutivo	30/04/2023	30	3/9/2023	30
	Aprobaciones	30/05/2023	30	3/10/2023	30
PRODUCTO 6	Actualización del EIAp	30/06/2023	30		
			240		337

Por otra parte, teniendo en cuenta que los tiempos de Socialización y de la Emisión de la Declaración de Impacto ambiental, no se puede establecer en forma precisa, el plazo final de la entrega del producto 6 debería ser hasta la obtención de la declaración de Impacto ambiental.

Esta solicitud de prórroga implica un cambio en las condiciones contractuales en lo relacionado al Plazo, pero no implica variación en el monto del contrato ni en el alcance de los entregables.

Aguardando una respuesta favorable me despido saludando atentamente.

Ing. William Campos Cervera
Representante Legal

22(veinti dos)

Ministerio de OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

Paraguay de la gente

MESA DE ENTRADA ÚNICA

EXPEDIENTE Nº 53870/2022

TITULAR:
CONSORCIO IATASA CIA

NOMBRE Y APELLIDO:
Tania Chavez

TELEFONO:
(0976) 318 934

CORREO ELECTRONICO:

REFERENCIA:
1F. LLAMADO MOPC Nº 59/2021 -
SOLICITA SUSTITUCION DE PERSONAL.

FACTURA: Nro. 0 **Monto: GS.** 0

USUARIO/FECHA/HORA DE REGISTRO.:

SARDIAN 28/11/2022 12:12:31

CONSULTA AL : 021-4149000

"La recepción del documento no implica conformidad ni aceptación de su contenido. Sujeto a verificación y control por parte de los órganos intervinientes\"

21 (veintiuno)

Acuse recibo 4to Piso

Consorcio IATASA INGENIERIA CIA

Asunción, 25 de noviembre del 2.022

Sres.:
Ing. Julio Ríos
Jefe Interino UEP
UNIDAD EJECUTORA DEL PROGRAMA DE REHABILITACIÓN Y VIVIENDAS DEL BAÑADO SUR BARRIO TACUMBU – PR – L1152
MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES-MOPC.

Nota: 08.2022
Referencia: LLAMADO MOPC N°59/2021 "CONSULTORIA PARA ESTUDIOS DE SANEAMIENTO DE LA LAGUNA YRUPE, RECUPERACIÓN DE ZONAS NATURALES DE AMORTIGUAMIENTO, ELABORACIÓN DE DISEÑO EJECUTIVO Y PERMISOS DE INFRAESTRUCTURA PARA CONSTRUCCIÓN DE PARQUE LINEAL YRUPE- BARRIO TACUMBÚ" ID: 392.135
Tema: Solicitud de Sustitución de Personal Clave

De nuestra consideración:

Nos dirigimos a Ud. y por su intermedio a quienes corresponda con relación ha llamado de referencia, a fin de proponer la sustitución del Personal Clave el Ing. Luis Pablino Segovia, Ingeniero Sanitarista por el Ing. Roberto Lima quien cumple a cabalidad los requerimientos para el cargo según lo solicitado por el Pliego de Bases y Condiciones.

Esta pedido obece a que el Ing. Luis Segovia se encuentra con problemas de salud que le imposibilita continuar en el cargo, causa no imputable al Consorcio Consultor. Se adjunta copia del Curriculum Vitae del Ing. Roberto Lima

Sin otro particular, hacemos propicia la ocasión para saludarlo atentamente.

M.O.P.C.
UEP - PRVBT
Programa Barrio Tacumbú
Exp. Nº: 482
Fecha: 14:48
Hora: 25/11/22
Recibido: Noel Martinez

Ing. Willian Campos Cervera
Representante Legal

20 (veinte)

Ministerio de OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

Paraguay de la gente

MESA DE ENTRADA ÚNICA

EXPEDIENTE Nº 17886/2023

TITULAR:
CONSORCIO IATASA - CIA

NOMBRE Y APELLIDO:
Tania Chavez

TELEFONO:
0976318934

CORREO ELECTRONICO:

REFERENCIA:
1 FJ. LLAMADO MOPC N° 59/2021. REF: REMITE CV DE LA ARQ. PATRICIA MARIANO EN REEMPLAZO DEL ARQ. CORVALAN.

FACTURA: Nro. 0 **Monto: GS.** 0

USUARIO/FECHA/HORA DE REGISTRO.:

GFDUARTE 11/04/2023 07:36:26

CONSULTA AL : 021-4149000

"La recepción del documento no implica conformidad ni aceptación de su contenido. Sujeto a verificación y control por parte de los órganos intervinientes\"

19 (diecinueve)

safiva 440 H63

Consorcio IATASA INGENIERIA CIA

Asunción, 5 de abril de 2023

Señor

Ing. Julio Ríos, Jefe UEP

Unidad ejecutora del Programa de Rehabilitación y Viviendas del Bañado Sur Tacumbú-PR-L1152-MOPC

PRESENTE

Ref.: Llamado MOPC N° 59/2021 "Consultoría para estudios de Saneamiento de la Laguna Yrupé, Recuperación de zonas naturales de amortiguamiento, elaboración de Diseño Ejecutivo y permisos de infraestructura para construcción de Parque Lineal Yrupé-Barrio Tacumbú" ID 392.135-Presentación de CV para Perfil del Arquitecto Paisajista.

Asunto:

De nuestra consideración,

Me dirijo a Ud., con el objeto de presentar el Currículo Vitae de la Arq. Patricia Mariano en reemplazo del Arq. Corvalán como personal clave de Arquitecto/a paisajista, diseños urbanos o Ambientalista que fuera solicitada en Nota UEP-PRVBT N° 34/2023 de fecha 21 de marzo de 2023.

Se pone a consideración para su aprobación a fin de continuar con el desarrollo del proyecto.

Aguardando una respuesta favorable, me despido saludando atentamente

Ing. William Campos Cervera
Representante Legal

M.O.P.C.
UEP - PRVBT
Programa Barrio Tacumbú
Exp. N°: 152
Fecha: 10-04-2023
Hora: 15:11
Recibido:

Rodrigo Jara D.

18 (dieciocho)

Ministerio de
OBRAS PÚBLICAS
Y COMUNICACIONES

GOBIERNO
NACIONAL

Paraguay de la gente

Asunción, 29 de noviembre de 2022

Nota UEP-PRVBT N° 318/2022

Señor
Ing. Willian G. Campos Cervera,
Representante legal
Consorcio IATASA-CIA
Presente

Ref.: CONTRATO S.G. MINISTRO N°434/2022, "Consultoría para Estudios de Saneamiento de la Laguna Yrupé, Recuperación de Zonas Naturales de Amortiguamiento, Elaboración de Diseño Ejecutivo y Permisos de Infraestructura para Construcción de Parque Lineal Yrupé – Barrio Tacumbú" ID: 392.135

ASUNTO: Sustitución de personal Clave – Ing. Sanitarista

Tengo el agrado de dirigirme a usted, en el marco del contrato de la referencia y en relación a su Nota 08/2022, de fecha 25 de noviembre, en la cual proponen la sustitución del personal clave para el cargo de Ingeniero Sanitarista, al Ing. Roberto Lima en reemplazo del Ing. Luis Segovia debido a problemas de salud que lo impiden continuar.

Al respecto, de acuerdo indicado Contrato, numeral 27. "Reemplazo de Expertos Clave, en el ítem b": *la sustitución de Expertos Clave durante la ejecución del Contrato podrá considerarse solo con base en solicitud escrita del consultor y debido a circunstancias fuera de control razonable del Consultor, incluido, más no limitado a muerte o incapacidad médica. En tal caso, el Consultor deberá suministrar inmediatamente un reemplazo que sea una persona con calificaciones y experiencias equivalente o mejores y a la misma tarifa de remuneración.* Realizada la evaluación correspondiente y teniendo en cuanta lo anteriormente mencionado, se informa que el Ing. Roberto Lima cumple con los requisitos contractuales y técnicos para reemplazar al del Ing. Luis Segovia como Ing. Sanitarista.
En este sentido, le comunico que se iniciará el proceso de elaboración de la adenda correspondiente.

Sin otro particular, le saludo cordialmente.

Ing. Julio Ríos, Jefe Interino de la UEP
Programa de Rehabilitación y Vivienda
del Bañado Sur (Barrio Tacumbú) - PRVBT

	Un (1) INGENIERO SANITARISTA	CUMPLE /NO CUMPLE	CUMPLE /NO CUMPLE
7	**a) Calificaciones Generales:** **Formación académica: Ingeniería civil.** Para el cumplimiento del sub-criterio se debe **presentar copia del Título.** **b) Experiencia:** Experiencia General de al menos **ocho (8) años** contados a partir de la obtención del título universitario. Experiencia Específica de al menos **tres (3)** trabajos en desarrollo de saneamientos de arroyos urbanos y manejo de aguas negras o similares. Para el cumplimiento del sub-criterio se tendrá en cuenta lo declarado en el CV.	Luis Paulino Segovia Ing. Civil Copia de título: CUMPLE Experiencia general: 50 años. CUMPLE Expereriencia Específica: CUMPLE. 1) Proyecto Ejecutivo de la Red de Agua potable y Alcantarillado Sanitario para la Zona Norte de la Ciudad de Encarnación (2001) 2) Especialista Sanitario Proyecto y Calculo de la **Planta de Tratamiento de Efluentes Industriales** Itagua (1993) 3) Especialista Sanitario Proyecto y Calculo de la Planta de Tratamiento de Efluentes Cloacales para el Nucleo Intermedio de la Entidad Binacional Yacyreta. (1993)	Ing. Roberto Lima Ing. Civil Copia de título: CUMPLE Experiencia general: 31 años. CUMPLE Expereriencia Específica: CUMPLE. 1) Proyectos y ejecución de Planta de Tratamiento de Efluentes Industriales y Domésticos, como así, su puesta en funcionamiento y monitoreo. (2005) 2) Proyecto de Desagüe cloacal y Planta de Tratamiento de Efluentes de las instalaciones de la empresa. MONTE ALEGRE S.A.. CIUDAD DE MARIANO ROQUE ALONSO. 2009. **3) Proyecto: Abastecimiento de Agua, Instalación de** Incendio, Desagüe cloacal y Pluvial, y Planta de Tratamiento de Efluentes de las instalaciones de la Sucursal Fernando de la Mora de la cooperativa. COOPERATIVA COLONIAS UNIDAS AGRO. IND. LIM.. Ciudad de FERNANDO DE LA MORA. 2010 4) Proyecto ejecutivo para la planta de tratamiento de efluentes para el Palacio de Justicia de la Ciudad de San Lorenzo y su Estudio de Impacto Ambiental. (2013 y 2014)

Ing. Gustavo Gonzalez

17 (diecisiete)

16 (dieciseis)

Ministerio de OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

Asunción, 11 de abril de 2023

NOTA UEP-PRVBT N° 39/2023

Señor
Ing. Willian G. Campos Cervera, Representante Legal
Consorcio IATASA-CIA.
william.cc@cia.com.py
PRESENTE

Ref.: Contrato N° 434/2022 "CONSULTORÍA PARA ESTUDIOS DE SANEAMIENTO DE LA LAGUNA YRUPE, RECUPERACIÓN DE ZONAS NATURALES DE AMORTIGUAMIENTO, ELABORACIÓN DE DISEÑOS EJECUTIVO Y PERMISO DE INFRAESTRUCTURA PARA CONSTRUCCIÓN DE PARQUE LINEAL YRUPE - BARRIO TACUMBU"
– ID 392135.
Aprobación de cambio de personal clave: Arquitecto/a paisajista, diseños urbanos o Ambientalista.

Me dirijo a usted, a fin de comunicarle que se ha realizado la evaluación del Currículo Vitae de la Arq. Patricia Mariano, presentado por nota de fecha 5 de abril del 2023, recepcionada según Exp. **UEP N° 152/2023**, en donde se propone el reemplazo del personal clave Arq. Javier Corvalán, Arquitecto/a paisajista, diseños urbanos o Ambientalista.

Al respecto, se comunica la aprobación del personal clave propuesto, Arq. Patricia Mariano.

Sin otro particular, le saludo atentamente.

Ing. JULIO RIOS, Jefe Interino UEP
Programa de Rehabilitación y
Viviendas del Bañado Tacumbú

15 (quince)

Ministerio de OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

NOTA UEP-PRVBT N° 34 /2023

Asunción, 21 de marzo de 2023

Señor
Ing. William G. Campos Cervera, Representante legal
Consorcio IATASA - CIA.
PRESENTE

Ref.: CONTRATO S.G. MINISTRO N°434/2022, "CONSULTORÍA PARA ESTUDIOS DE SANEAMIENTO DE LA LAGUNA YRUPÉ, RECUPERACIÓN DE ZONAS NATURALES DE AMORTIGUAMIENTO, ELABORACIÓN DE DISEÑO EJECUTIVO Y PERMISOS DE INSFRAESTRUCTURA PARA CONSTRUCCIÓN DE PARQUE LINEAL YRUPÉ" - BARRIO TACUMBÚ – ID N°392.135
ASUNTO: Solicitud de cambio de experto clave.

Me dirijo a Usted, en el marco del Contrato de la referencia, a fin de comunicarle la solicitud de cambio del Experto Clave, Arq. Javier Corvalán, en virtud a lo establecido en la **Cláusula CGC 28.b** Remoción de Expertos o subconsultores, atendiendo que su desempeño según lo señalado por la Supervisión del Contrato, no se alinea con los objetivos del programa y su intervención produce demoras innecesarias en la ejecución del Contrato.

En este sentido, a efectos de evitar más retrasos se solicita el reemplazo del experto clave indicado.

Sin otro particular, le saludo atentamente,

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES
COORDINACION PROGRAMA BID 1152

ING. JULIO RIOS, *Jefe Interino UEP*
Programa de Rehabilitación y Vivienda del Bañador Sur
- Barrio Tacumbú
