ENMIENDA N° 1 AL CONTRATO N° 52/2022 "SUMINISTRO, INSTALACIÓN, PUESTA EN SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PARA PROVISIÓN INTERNET GRATUITO EN ESPACIOS PÚBLICOS (INFRAESTRUCTURA-IGEP)" - ID N° 388.552"

En la ciudad de Asunción, capital de la República del Paraguay a los 5 días del mes de diciembre del año 2022; por una parte, el MINISTERIO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN, en adelante el "Contratante", con domicilio en las calles Gral. Santos 1170 c/ Concordia, Complejo Santos E2, de la ciudad de Asunción, representado por el Señor Ministro, DON FERNANDO JOSÉ SAGUIER CABALLERO BERNARDES nombrado por Decreto Nº 5330 del 25 de mayo 2021, y por la otra el CONSORCIO INSIDE, en adelante el "Proveedor" ubicada en la Avda. Boggiani 5899 esq. R.I. 6 Boquerón representada en este acto por la Sra. ADRIANA MARÍA VAESKEN GONZÁLEZ, en su calidad de Representante Legal, ambas en adelante las "Partes", convienen en suscribir la presente ENMIENDA N° 1 al Contrato UEP N° 52/2022 "SUMINISTRO, INSTALACIÓN, PUESTA EN SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PARA PROVISIÓN INTERNET GRATUITO EN ESPACIOS PÚBLICOS (INFRAESTRUCTURA-IGEP) en adelante la "enmienda" la cual estará sujeta a las siguientes cláusulas y condiciones:

D.G.A.J.

OBJETO

1. Modificar la duración del hito "Entrega de equipos, instalación y puesta en servicio del Datacenter" y de los tres hitos de "Proveedor de infraestructura instala" de la instalación de los puntos IGEP de Prioridad 3 del Cronograma de Ejecución de los IGEP.

1 – MODIFICAR DURACION DE HITOS DEL CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DE LOS IGEP.

Fernando Saguier Caballero Bernardes
Ministro
Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicación

CONSORCIO INSIDE
RUC: 80121400-9
Avda. Boggiani 5899
Cel.: (595) 981 439965

DONDE DICE:

Duración máxima a partir de la firma de la emisión de la orden de servicio (días corridos)

Nombre	Duración
Instalación de Data Center - Conectividad	37
Instalación en el Data Center y NOC - Infraestructura	127
MITIC y Proveedor es de Infraestructura en conjunto realizan el Site Survey	10
Proveedor de Infraestructura entrega, instala y realiza la migración de los equipos a la nueva sala del DC	120
Recepción de Infraestructura en el Datacenter y el NOC por parte del MITIC	7
IGEP Prioridad 1	255
MITIC presenta cronograma de site survey	10
MITIC y Proveedores de Infraestructura y Conectividad en conjunto realizan Site survey	30
Proveedor de Infraestructura presenta cronograma de instalación	15
Proveedor de Conectividad presenta cronograma de instalación	15
MiTIC aprueba PID y Plan de Trabajo de ambos proveedores	10
Proveedor de Infraestructura instala	115
Proveedor de Conectividad instala luego de recepción de O/S	115
MITIC recepciona Internet e infraestructura	115
IGEP Prioridad 2	285
MITIC presenta cronograma de site survey	10
MITIC y Proveedores de Infraestructura y Conectividad en conjunto realizan Site survey	70
Proveedor de Infraestructura presenta cronograma de instalación	15
Proveedor de Conectividad presenta cronograma de instalación	15
MiTIC aprueba PID y Plan de Trabajo de ambos proveedores	10
Proveedor de Infraestructura instala	145
Proveedor de Conectividad instala luego de recepción de O/S	145
MITIC recepciona Internet e infraestructura	145
IGEP Prioridad 3	360
MITIC presenta cronograma de site survey	10
MITIC y Proveedores de Infraestructura y Conectividad en conjunto realizan Site survey	130
Proveedor de Infraestructura presenta cronograma de instalación	15
Proveedor de Conectividad presenta cronograma de instalación	15
MiTIC aprueba PID y Plan de Trabajo de ambos proveedores	10
Proveedor de Infraestructura instala	175
Proveedor de Conectividad instala luego de recepción de O/S	175
MITIC recepciona Internet e infraestructura	175

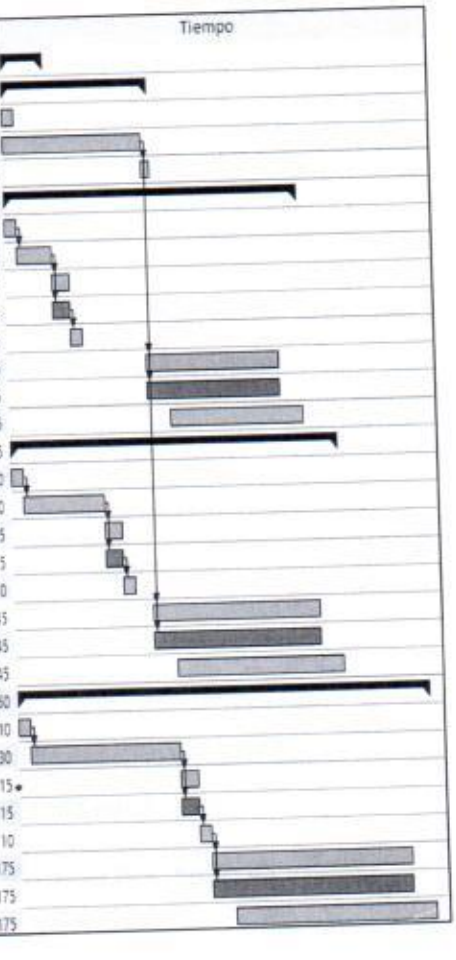

Fernando Saguier Caballero Bernardes
Ministro
Ministerio de Tecnologías
de la Información y Comunicación

CONSORCIO INSIDE
RUC: 801214[illegible]-9
Avda. Boggiani 5899
Cel.: (595) 981 439965

DEBE DECIR:

Duración máxima a partir de la firma de la emisión de la orden de inicio (días corridos)

Nombre	Duracion
Instalación de Data Center - Conectividad	37
MITIC y el proveedor de Conectividad realizan el Site Survey	10
Instalación de enlace en el DC - Proveedor Conectividad	30
Recepción de enlace de Internet en el DC por parte del MITIC	7
Instalación en el Data Center y NOC - Infraestructura	215
MITIC y Proveedor de Infraestructura en conjunto realizan el Site Survey	10
Proveedor de Infraestructura entrega, instala y realiza la migración de los equipos a la nueva sala del DC	208
Recepción de Infraestructura en el Datacenter y el NOC por parte del MITIC	7
IGEP Prioridad 1	326
MITIC presenta cronograma de site survey	10
MITIC y Proveedores de Infraestructura y Conectividad en conjunto realizan Site survey	30
Proveedor de Infraestructura presenta cronograma de instalación	15
Proveedor de Conectividad presenta cronograma de instalación	15
MITIC aprueba PID y Plan de Trabajo de ambos proveedores	20
Proveedor de Infraestructura instala	118
Proveedor de Conectividad instala luego de recepción de O/S	118
MITIC recepciona Internet e infraestructura Prioridad 1	118
IGEP Prioridad 2	326
MITIC presenta cronograma de site survey	10
MITIC y Proveedores de Infraestructura y Conectividad en conjunto realizan Site survey	70
Proveedor de Infraestructura presenta cronograma de instalación	15
Proveedor de Conectividad presenta cronograma de instalación	15
MITIC aprueba PID y Plan de Trabajo de ambos proveedores	10
Proveedor de Infraestructura instala	118
Proveedor de Conectividad instala luego de recepción de O/S	118
MITIC recepciona Internet e infraestructura Prioridad 2	118
IGEP Prioridad 3	326
MITIC presenta cronograma de site survey	10
MITIC y Proveedores de Infraestructura y Conectividad en conjunto realizan Site survey	130
Proveedor de Infraestructura presenta cronograma de instalación	15
Proveedor de Conectividad presenta cronograma de instalación	15
MITIC aprueba PID y Plan de Trabajo de ambos proveedores	10
Proveedor de Infraestructura instala	118
Proveedor de Conectividad instala luego de recepción de O/S	118
MITIC recepciona Internet e infraestructura Prioridad 3	118

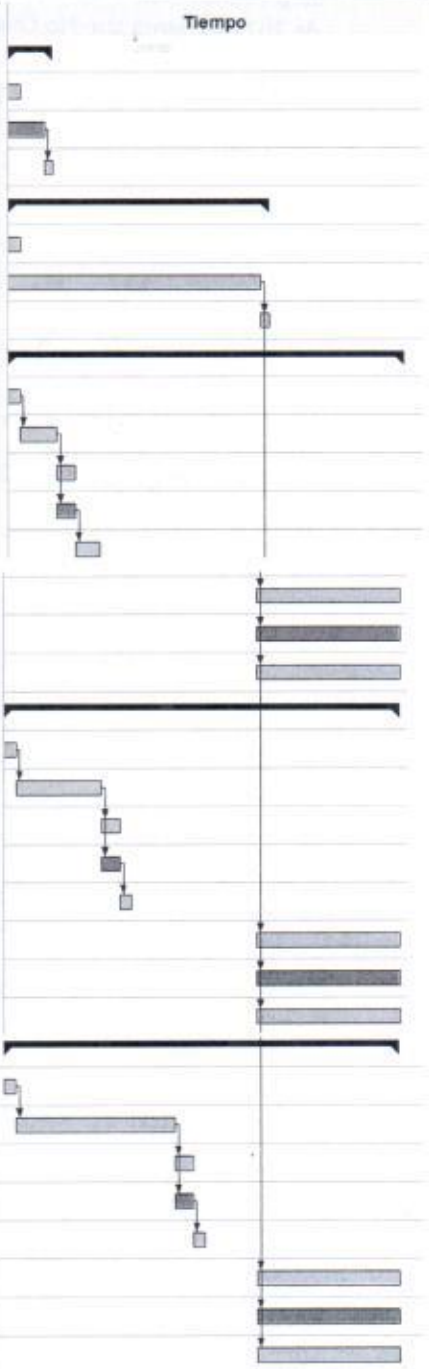

Fernando Saguier Caballero Barriocanal
Ministro Asesor
de la Información y Comunicación

CONSORCIO INSIDE
RUC: 80121400-9
Avda. Boggiani 5899
Cel.: (595) 981 439965

Todas las demás condiciones del contrato quedan sin variación siempre que no sean contradictorias a los términos de la presente enmienda.

La presente Enmienda Nº 1 fue aprobada por Resolución Ministerial Nº 770 de fecha 30 de noviembre de 2022 y cuenta con No Objeción emitida mediante Nota O-CSC/CPR-2598/2022.

En prueba de conformidad y aceptación, suscriben las Partes tres ejemplares de un mismo tenor en el lugar indicado al inicio.

Fernando José Saguier Caballero Bernardes
Representante Legal del CONTRATANTE

Adriana María Vaesken González
Representante Legal del PROVEEDOR

CONSORCIO INSIDE
RUC: 801214[illegible]9
Avda. Boggiani 5899
Cel.: (595) 981 439965
