Informe Complementario de Gestión.

Proyecto de Mejoramiento de las Finanzas Públicas para el desarrollo sostenible del Paraguay

Diciembre del 2023 – Hasta el Sprint 58

Resumen Ejecutivo

El presente informe destaca los principales objetivos y otros ya trabajados en el periodo que va desde el 15/11/2023 al 15/12/2023 en el marco de desarrollo de los MPVs de las verticales de presupuesto, bienes y tesorería, recorriendo los ambientes Desa, Test, UAT, Pre-Prod, Producción, con las reglas de cada uno de los ambientes. Además, el apoyo a toda gestión requerida y encabezada por la Coordinación Tecnológica del proyecto de la Reingeniería del Siare. Los mismos se listan a continuación:

- Llegar hasta UAT, con la versión final del MPV-1 de Sigebys, al término del periodo del siguiente Informe, incluso previendo un Sprint más, el 59.
- Llegar hasta UAT, con la vertical de Presupuesto, Gestión de años y versiones y avance de Indicadores, incluso previendo un Sprint más, el 59.
- Mejora en la toma de decisiones basada en evidencia gracias a la evolución en los indicadores desempeños en los equipos ágiles, mediante constante involucramiento y seguimiento en las ceremonias ágiles los cuales hacen que los equipos sean más dinámicos gracias a la Metodología.
- Continuar con estandarización de las tareas de apoyo en los relevamientos en la vertical de Gestión del Desempeño y de Monitoreo de Gestión del Desempeño, acompañando al equipo de SM y a la analista logrando reducir el tiempo de análisis necesario para cada documento.
- Se reduce la deuda técnica y documental de los sprints atrasados y los actuales mediante él apoyó en el seguimiento de los Desarrollos, desde lo Analítico reduciendo la deuda técnica y documental, de los sprints

atrasados y los actuales.

- Mejora en la planificación de los Sprints mediante el apoyo al equipo de QA, analistas y desarrolladores a estar organizados gracias a la organización de las documentaciones, que nos ayudarán a aplicar las mejores prácticas de nuestro Marco Metodológico.

OSCAR FERNANDO BOGARIN ESQUIVEL

Firmado digitalmente por OSCAR FERNANDO BOGARIN ESQUIVEL
Fecha: 2023.12.20 19:02:49 -03'00'

Índice

	Página
Antecedentes.	**3**
Objetivos.	**4**
Resultados Esperados.	**5**
Cronograma de Actividades del Plan de Trabajo detallado por mes.	**9 y 11**
Principales avances y logros del Periodo en detallado por Actividades.	**12 al 13**
Conclusiones finales y próximos pasos.	**14 al 15**
ANEXO I.	**16 al 24**

Antecedentes

El Gobierno de Paraguay, con el apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), ha implementado un Programa de Mejoramiento de las Finanzas Públicas para el Desarrollo Sostenible del Paraguay- Contrato de Préstamo Nª 4671/OC-PR, con el fin de apoyar e incrementar los niveles de eficiencia de operación de las Subsecretarías de Estado de Tributación (SET) y de Administración Financiera (SSEAF), dependientes del Ministerio de Hacienda. Entre los objetivos principales que destacan en el ámbito de la SSEAF.

En ese contexto, la Sub Secretaría de Estado de Administración Financiera (SSEAF) requiere los servicios de un líder de desarrollo para apoyar al Coordinador Tecnológico, tanto en la coordinación, como en la evaluación de los resultados de cada uno de los equipos, en función a la planificación definida para cada uno de los Sprints.

Objetivo

Liderar, realizar la mentoría y seguimiento de los equipos de desarrollo en el correcto cumplimiento de la metodología de desarrollo ágil y la arquitectura definida durante la implementación de los MPVs (Mínimos Productos Viables) identificados en la estrategia de actualización del SIARE relacionadas con el Sistema de Presupuesto, Tesorería, Contabilidad, en el marco de los requerimientos establecidos en el Modelo Conceptual y en el Plan Estratégico del SIARE y la propuesta e implementación de la NICSP con el fin de asegurar la entrega de los mismos, y gestionar y verificar los informes de Estado del Proyecto, tanto de los miembros contratados por Fábrica de Software como de las consultorías individuales y el personal contratado o permanente de la

DGIC en función a los resultados alcanzados, apoyando en esta tarea al Coordinador Tecnológico del proyecto.

Resultados Esperados

1. Planificación de sprints por trimestre.
2. Informe de los resultados de cada Sprint con respecto a lo planificado.
3. Informe sobre los avances y el funcionamiento en los MPV (Mínimos Productos Viables) definidos en función al Plan Estratégico, junto con la inclusión e interpretación de las métricas generadas.
4. Resumen ejecutivo de los resultados alcanzados por las consultorías de Fábrica y de las consultorías individuales.
5. Reporte de alertas tempranas y propuestas de alternativas de solución en base a oportunidades de mejoras detectadas.

Cronograma de Actividades del Plan de Trabajo

En el cronograma para el año 1 (uno) que se presenta a continuación, discriminado por mes citando las principales actividades que forman parte del presente contrato y corresponde al periodo del 13 de Mayo del 2023 al 15 de Junio en el 2024.

En los cronogramas expuestos en las secciones posteriores se detalla el avance en las tareas realizadas utilizando la siguiente codificación de colores:

Años	2023							2024					
Meses	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
Transversales													
Implementación de Arquitectura.			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Devops							-	-	-	-	-	-	-
Arquitectura													
Presupuesto													
Gestión del Desempeño / Reporting						-	-	-	-	-	-	-	-
Gestión del Desempeño / Monitoreo / Plan Financiero	-	-						-	-	-	-	-	-
Formulación V1	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bienes y Servicios													
Alta de Bienes por Compra. Puesta a Producción.								-	-	-	-	-	-
Alta de Bienes - Conexión con el SIAF								-	-	-	-	-	-
Tesorería													
Catálogo y Cuentas Bancarias. Impulsar su pase a Producción	-							-	-	-	-	-	-

Obs.: El alcance de esta consultoría, prevé un tiempo de 24 meses. La planificación actual solo contempla los primeros 12 meses, los cuales son revisados trimestralmente, según el proceso de planificación utilizado en la metodología ágil.

Estado	Leyenda/Color	Estado	Leyenda / Color
Planificado sin ser trabajados: No se tiene tareas previstas para esa actividad en ese Sprint	-	**Planificado y trabajado:** Sprint en él fue atendido, ya sea de forma , on boarding, directa, o de Apoyo	

Planificación de sprints por trimestre.

Definir y calcular una métrica de velocidad de desarrollo del equipo actual, para ser utilizada de línea base de desempeño

Se describen las planificaciones hasta el Sprint 59, viendo lo que se tiene ya en Backlog, necesidades del propio Sprint en ejecución, grandes hitos a ver hasta el Sprint mencionado y los Sprints 60 y 61, a la espera del nuevo plan estratégico del Nuevo Gobierno

Informe de los resultados de cada Sprint con respecto a lo planificado.

Participar en las reuniones de planificación y análisis retrospectivo para asegurar el cumplimiento de los objetivos de cada Sprint.

Se detallan las Retrospectivas de los Sprints 56 y 57 (Ver Anexo I), en donde se celebraron las ceremonias de la Metodología Ágil ya con Reviews.

También, se continúan con las planificaciones quincenales en cada vertical – SIGEBYS, Tesorería, Monitoreo del Desempeño, según el paso de los Sprints. Planificaciones, Retrospectivas tienen una licencia para extenderse hasta un máximo de 2 horas, ya que no se alinean a los tiempos de las Dailys, por tener mayor carga de análisis, de discusión. Se siguen dos dailys para la vertical SIGEBYS (con compañeros designados por épicas), ya que la cantidad de compañeros supera los 8 miembros recomendados por la metodología y que rompen los 15 minutos diarios generando reuniones muy largas y desgastantes para los miembros del equipo. Esto último hasta el fin del MPV-1 de Contabilidad o de una nueva planificación del PE.

Informe sobre los avances y el funcionamiento en los MPV definidos en función al PE, junto con la inclusión e interpretación de las métricas generadas.

Involucramiento con los funcionarios de la DGP, haciendo el relevamiento de datos y su posterior exposición de las maquetas que van saliendo de los trabajos de relevamiento y análisis. Ya se hizo una Reviews con tareas de desarrollos en ambiente DESA, al final del Sprint 57.

Involucramiento con los funcionarios de la DGCP, ayudando y sobre todo con el análisis de riesgos para el nuevo plan estratégico 2024, que será definido por las autoridades.

Reporte de alertas tempranas y propuestas de alternativas de solución en base a oportunidades de mejoras detectadas en base a los trabajos de cada Sprint.

Realizar tareas de inducción a nuevos recursos en la metodología ágil y el uso de las herramientas de seguimiento definidas, así como también las herramientas de desarrollo y la arquitectura del sistema.

De las Retrospectivas se han conseguido levantar necesidades en comunes:

- Que las Reviews ya se utiliza de insumo para las Retrospectivas.
- Acceso al Log en el ambiente DESA. Se colocará un plugin al ELK para que se pueda ser más flexible.
- Extensión de las reuniones por discusiones técnicas que no ayudan al marco metodológico de las Dailys y cada vez se tiene más cultura para proseguir discusiones en reuniones de trabajo.

- Seguimiento a la gestión de los Back-end en test. Se propone esperar que llegue el front-end y llevar al estado "En espera". Esperamos que eso pueda ayudar a un mejor manejo de los tickets entre los equipos de Desarrollo y los de Testing.
- Documentación de los funcionales aún insuficiente, para los desarrolladores.
- Darle continuidad y seguimiento a las capacitaciones en la herramienta Figma. Es de vital importancia para el correcto maquetado.
- Estabilización de los ambientes Desa-Test-UAT, después de los despliegues de los splits tanto en BE como en FE.
- Se envían mails de aviso cuando se terminan los despliegues, identificando el ambiente y módulo.

A la espera de los tiempos de las autoridades para mostrar el candidato a flujo de trabajo de las nuevas documentaciones con el que se regirán los equipos de la DSI. a Destacar: nomenclaturas de documentaciones, Procedimiento de Gestión del Alcance, Flujo de QA, Diccionario de Datos, Prototipo de Documentación de Aceptación del Usuario, Diagrama de Componentes y Diagramas de Flujo relacionados al circuito, que deberá tener las documentaciones.

Avanzando en las mejoras en la implementación de la metodología ágil, identificando avances tanto en análisis retrospectivo en todas las verticales y nuevas ceremonias a ser implementadas de forma gradual, conforme vaya entiendo mejor la cultura de la de la forma de implantación del marco de trabajo Scrum.

Reorganización de equipos de las verticales constantemente y a la vez el seguimiento semanal de los tickets.

Reorganización de los equipos para darle prioridad a la tarea designada de las nuevas autoridades, que es Gestión de Compras de Bienes.

Participar en las reuniones de planificación y análisis retrospectivo para asegurar el cumplimiento de los objetivos de cada Sprint.

Continuidad con versión del *Comulative Flow Chart (CFC)* que ayudará a complementar el gráfico Burndown, antes mencionado. Aún no está operativo en su totalidad ya que le falta la madurez del ejercicio del seguimiento diario.

Realizar las gestiones técnicas y administrativas que sean necesarias para mantener la correcta productividad del equipo.

Trabajo en conjunto con el Coordinador para las revisiones de los informes de los consultores individuales como también a las consultorías de fábrica.

Seguir trabajando para definir y calcular una métrica de velocidad de desarrollo del equipo actual. Con el equipo de Laboratorio, hemos maquetado un reporte de pase a Test Vs. Incidencias.

Inducción y seguimiento a los nuevos compañeros incorporados al Proyecto de la Reingeniería, desde permisos, el acceso a los sistemas y luego a que vertical irán para apoyar a los equipos de trabajo.

Realizar las gestiones técnicas y administrativas que sean necesarias para mantener la correcta productividad del equipo.

Trabajo continuo con los especialistas en testing y en metodología para la revisión constante de los riesgos, mirando y accionando alertas tempranas dentro del marco metodológico.

Trabajo de Ejecución de la Gestión del Desempeño y Monitoreo del mismo (Ejecución), ayudando a definiciones de CU, dentro de cada uno con sus

particularidades ayudando con sus casuísticas. Este trabajo se viene realizando con una analista en particular y los Scrum Masters de Presupuesto. Independientemente a ello, también se está trabajando con Milagro Lo Cane para que todo pueda desarrollarse bajo la modalidad de agilidad, tanto en la documentación, como en la definición y su posterior desarrollo.

Se realizaron las tareas para presentar la planificación, al Viceministro Oscar Lovera sobre con la vertical SIGEBYS.

Seguimiento constante y rutinario para ofrecer accesos a los integrantes del Proyecto de Reingeniería al Redmine, Nextcloud y a los ambientes de despliegue. Este trabajo lo venimos realizando con Alan Sanier.

Informe sobre los avances y el funcionamiento en los MPV definidos en función al PE, junto con la inclusión e interpretación de las métricas generadas.

Mantener reuniones con el coordinador tecnológico del SIARE, la DGIC y los "product owners" definidos por el proyecto.

Resumen aproximado del % de avances de los desarrollos en las verticales que hoy están siendo desarrollados, hasta el ambiente UAT.

Hasta el Sprint 58 - Complementario	MPV - Formulación V1	MPV - Gestión del desempeño	MPV - SIGEBYS – Hasta la inserción en el REVA	MPV - Gestión de Cuentas	MPV - Monitoreo del Desempeño (c/ Plan Financiero)
Sprint 56	15%	100%	100%	72%	17%
Sprint 57	15%	100%	100%	75%	25%
Sprint 58	15%	100%	100%	80%	40%

Mejora continua en la comunicación, conforme vayamos madurando el marco conceptual de la metodología ágil, que lo venimos hablando directamente con los dos Coordinadores técnicos del proyecto, Milagros Lo Cane, Rafael Palau de manera periódica.

Conclusiones finales.

- Trabajo sostenido sobre el marco metodológico ágil adaptado por el MEF.
- Constante ayuda al Coordinador de la Reingeniería, en lo que iba solicitando a más de tener mayor compenetración en los equipos verticales, acompañamiento a reuniones, y también en las trasversales para que las verticales puedan proseguir con sus tareas.
- Constantes armonización entre los analistas funcionales, de informática y de implantación del Módulo de SIGEBYS trabajando para de forma sincrónica.

Próximos pasos.

- Seguir apoyando a la estandarización de trabajos. Esto es semanal, iterativo y evolutivo.
- En Enero del 2024, se prevé junto al Administrador de la Herramienta Nextcloud hacer una charla para su utilización oficial.
- Se sigue en la línea de tener estandarizado el trabajo de los analistas funcionales informáticos presenciales, en base a rutinas de calibración y de mentoría para la estandarización de trabajos y sobre todo, en los entregables. Esto es semanal e iterativo.
- Tener siempre actualizados los datos de los talentos humanos, asignados al proyecto de Reingeniería del Siare.
- Seguimiento semanal a los pendientes de los expertos funcionales, con las deudas documentales pendientes y registradas en el Redmine o en minutas de las reuniones virtuales.
- Dentro del Ítem: Generar constantemente nuevos indicadores de gestión, para una mejor visualización de los números del proyecto de la Reingeniería, se preparará en el mes de Diciembre 2023 / Enero

2024, una la primera versión del “Resumen Ejecutivo de las Fábricas y de los consultores individuales con sus respectivos avances de los resultados alcanzados por las consultorías de Fábrica y de las consultorías individuales”.

ANEXO I

Gestión de Cuentas - Sprint 56

v1.0.56 ABIERTO

Modificar Borrar Nueva petición

2023-11-17

- Fecha de Inicio: 2023-11-06
- Objetivo:
  Primera integración de catálogos SITE-SIARE
  30% faltante del desarrollo de solicitud de cuentas bancarias
  Definir los pasos desde la recepción de una solicitud hasta el alta o modificación de la cuenta
  Desarrollo de Casos de uso faltantes de jerarquía de firmas
  Creación de scripts para tablas correspondientes jerarquía de firmas, según casos de uso

- Logros:
  Si bien no formaba parte de los objetivos de este sprint, se definió que los atributos de organismo financiador y origen de ingreso en la solicitud de cuentas bancarias, gestión de cuentas bancarias y escriturales, no sean requeridos en esta instancia, hasta tanto no se tenga el módulo de Formulación en producción. A partir de esta definición, se llevó a cabo el desarrollo de los ajustes en los formularios de Solicitud de Cuentas Bancarias, Gestión de Cuentas Bancarias y Escriturales. Teniendo como logro, una versión lista para el pase a producción de estos productos.
  En cuanto a la Aprobación de Solicitudes, donde se genera el documento electrónico, hemos incorporado los reportes según el tipo de sigla de la cuenta bancaria, en este punto, si bien todos los casos fueron desarrollados, en las pruebas, se detectó inconsistencias entre lo establecido en el caso de uso, versus las maquetas, lo que derivó a una actualización de la misma, de manera que el desarrollador pueda realizar los ajustes para el caso de cuentas administrativas. Esta actualización del documento ya fue realizado por el especialista.
  Con respecto al caso de uso de Anulación de Solicitudes, se requirió la actualización del mismo ya que faltaron algunas definiciones para que sea posible el desarrollo. Dicha actualización fue resuelta en este sprint, logrando una nueva versión del documento de casos de uso del especialista, incluyendo además, la anulación no solo de la solicitud, sino además, la anulación del documento electrónico.
  Podemos concluir, el 30% comprometido en este sprint fue desarrollado en un 50%, quedando pendiente el desarrollo de la Aprobación de Solicitudes (se rehace el formulario) más la culminación de todos los modelos de reportes por tipo de cuenta. En este sprint se avanzó con los modelos de Apertura, quedando en desarrollo los modelos de Modificación.
  Además, se incorporaron nuevos casos de uso que serán desarrollados en el siguiente sprint (anulación de solicitud y documento electrónico).
  Por otro lado, se realizó la socialización del nuevo documento funcional de jerarquía de firmas con el equipo técnico. De esta socialización se definió que no es posible llevar a cabo el desarrollo de los cambios introducidos, por afectar directamente al cronograma de pase a producción del módulo de SIGEBYS.
  Del documento funcional, la analista ha realizado el 50% de los casos de uso de jerarquía de firmas.
  En cuanto al formulario de Firma de Solicitudes, fueron incorporados los filtros a ambas pestañas.

- Oportunidades de Mejora:
  Para la interoperabilidad entre el SIARE y SIAF, tener definido el modelo a utilizar.
  Además, para los próximos sprints, sincronizar los objetivos funcionales de todas las verticales, de manera que se puedan manejar mejor las prioridades entre los equipos.
  Se requiere de una revisión del equipo de arquitectura y devops del report-server, de manera a asegurar la disponibilidad del mismo.
  Durante este sprint se ha experimentado varios inconvenientes con el report-server. Esta es una situación que debería ser controlada, para que no afecte el desarrollo y tampoco la disponibilidad en producción.

- Contratiempos:
  Realizar de manera coordinada entre los equipos, las demostraciones al final del sprint a fin de evitar problemas con el ambiente de desarrollo al momento de realizar dicha demo (evitar despliegues de última hora).
  En cuanto al ambiente de desarrollo y testing, últimamente, estamos experimentando inconvenientes con los despliegues, lo que nos atrasa en nuestro desarrollo y pruebas. Esto surge a partir del Split del front de tesorería.

100%

17 peticiones (17 cerradas — 0 abiertas)

Peticiones relacionadas

- ~~Error #9924~~: FE Cuentas Bancarias Solicitudes - Corrección de visualización de Tipo de Fondos y Modalidades de Pago
- ~~Error #9927~~: FE Cuentas Bancarias - Verificar botón Actualizar
- ~~Funcionalidad #8823~~: FE Cuentas Escriturales - Modificar validaciones por SIGLAS del Tipo de Cuenta Bancaria.
- ~~Funcionalidad #8824~~: FE Cuentas Bancarias - Modificar validaciones por SIGLAS del Tipo de Cuenta Bancaria.
- ~~Funcionalidad #8825~~: FE Solicitud de Cuentas Bancarias - Modificar validaciones por SIGLAS del Tipo de Cuenta Bancaria.
- ~~Funcionalidad #8948~~: SIARE-DB-PROD Motivo de Rechazo por Procesos del Sistema
- ~~Incidente #9947~~: Búsquedas en Combos Banco y Sucursal no recuperan valor
- ~~Incidente #9952~~: Se genera error al limpiar filtros
- ~~Refactor #7786~~: Aprobación de Solicitudes de Cuentas Bancarias - Generar Documento electrónico
- ~~Mejora #8683~~: FE Firma de Solicitudes de Cuentas Bancarias
- ~~Mejora #8714~~: FE Cotización de Monedas - Cambiar Título del listado y formulario
- ~~Mejora #9970~~: BE Bancos - Agregar uppercase
- ~~Documentación #8817~~: Documentos de CU para proceso de Jerarquía de Firmas
- ~~Documentación #8822~~: Solicitud de Cuentas Bancarias - Borrar documento pdf
- ~~Documentación #8915~~: Actualización de Documento Funcional - Motivo de Rechazo
- ~~Documentación #8919~~: Solicitud de Cuentas Bancarias - Borrar documento pdf
- ~~Documentación #9940~~: Actualización de Casos de Uso - Solicitud de Cuentas Bancarias - Anulación

Control de tiempo

Tiempo estimado	**252.00 horas**
Tiempo dedicado	**198.60 horas**

Peticiones por Tipo

Error	2/2
Funcionalidad	4/4
Incidente	2/2
Refactor	1/1
Mejora	3/3
Documentación	5/5

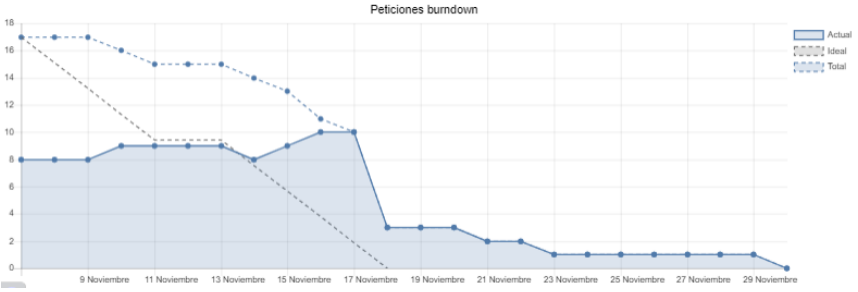

Gestión de Cuentas - Sprint 57

v1.0.57 ABIERTO

Modificar Borrar Nueva petición

5 días tarde (2023-12-01)

- Fecha de Inicio: 2023-11-20
- Objetivo:
  Interoperabilidad de Catálogos SIARE-SITE
  Desarrollo del 20% de tablas y clasificadores del siguiente MPV de Tesorería
  Desarrollo de nuevos casos de uso de Solicitud de Cuentas Bancarias (anulación y borrado del documento electrónico)
  Definir los pasos desde la recepción de una solicitud hasta el alta o modificación de la cuenta

- Logros:
  Si bien no se pudo iniciar el desarrollo, se definió junto con el equipo de arquitectura, la forma de realizar la interoperabilidad entre el SIAF y SIARE. Lo que nos permite avanzar en el desarrollo.
  En cuanto al 20% comprometido del desarrollo de las tablas y clasificadores, se completó el desarrollo de los scripts para la creación de tablas en su totalidad (lo planificado).
  Con respecto a la Solicitudes de Cuentas Bancarias, se logró el desarrollo de los reportes de apertura y modificación de Solicitudes, por tipo de cuenta bancaria.
  Además, se incorporamos los nuevos casos de uso, tanto para la Anulación de Solicitudes como la Anulación de Documento Electrónico.
  También incluimos mejoras en los formularios de Niveles de Control Financiero, Tipo de Gastos, Sucursales y se desarrolló el caso de uso de Origen de la Información de Estimaciones.

- Oportunidades de Mejora:
  Se requiere de una revisión del equipo de arquitectura y devops del report-server, de manera a asegurar la disponibilidad del mismo. Durante este sprint se ha experimentado varios inconvenientes con el report-server. Esta es una situación que debería ser controlada, para que no afecte el desarrollo y tampoco la disponibilidad en producción.
  Además, para los próximos sprints, sincronizar los objetivos funcionales de todas las verticales, de manera que se puedan manejar mejor las prioridades entre los equipos.

- Contratiempos:
  * CONTRATIEMPO: A raíz del inconveniente que se tuvo con el report-server, por tres días no pudimos enviar a Calidad nuestros tickets resueltos. Lo que derivó en un retraso en la revisión de estos tickets, que una vez revisados tuvieron incidencias que actualmente no están cerrados, pero sí desarrollados.
  Además, tuvimos inconvenientes con la red, lo que nos obligó a realizar una mudanza en medio de este sprint, lo que también contribuyó al retraso de algunos tickets.

98%

31 peticiones (30 cerradas — 1 abierta)

Peticiones relacionadas

- ~~Funcionalidad #8238~~: SIARE-DB-PROD - Crear tablas para Vincular Orígenes de Ingreso
- ~~Funcionalidad #8259~~: FE Gasto Tipos - Agregar funcionalidad de Consulta
- ~~Funcionalidad #8266~~: FE Niveles de Control Financieros - Agregar filtros
- ~~Funcionalidad #8293~~: BE Origen de la Información de Estimaciones
- ~~Funcionalidad #8294~~: FE Origen de la Información de Estimaciones
- ~~Funcionalidad #8295~~: BE Vincular Orígenes de Ingreso
- ~~Funcionalidad #9162~~: SIARE-DB-PROD - Crear tablas para Configurar Origen de Valores
- ~~Funcionalidad #9165~~: FE Solicitud de Cuentas Bancarias - Agregar funcionalidad de Anulación de Solicitudes
- ~~Incidente #8962~~: Aprobación - el tab de Nuevas no refresca luego de aprobar la Solicitud
- ~~Incidente #9075~~: No imprime Nombre de la cuenta Bancaria y Tipo de Fondos en ADMGEN, ADMFROT
- ~~Incidente #9092~~: Se emite un error, al quedar vacío el combo Tipo de Fondos.
- ~~Incidente #9354~~: Solicitud sin modificaciones en Tipos de Fondo/Modalidades de Pago (reporte)
- ~~Incidente #9358~~: OPPREST y OPDON en características de la cuenta se imprime el detalle con una cabecera.
- ~~Incidente #9359~~: Corrección de textos
- ~~Incidente #9363~~: No recupera el registro a partir del filtro Siglas.
- ~~Incidente #9364~~: Se emite diferentes validaciones para el campo Nombre.
- ~~Incidente #9365~~: Validar el límite de caracteres a ingresar, para el campo Total de años para promedio.
- ~~Incidente #9366~~: No actualiza el campo Total de años para promedio, cuando se elimina el valor.
- ~~Incidente #9368~~: Favor agregar tilde al enunciado Electronicos.
- ~~Incidente #9369~~: Favor agregar el mensaje de éxito para los registros procesados.
- ~~Incidente #9372~~: La opción Anular se encuentra Activo, por más de que no se haya seleccionado ningún registro.
- ~~Incidente #9403~~: Filtro Sucursales - No se visualiza filtro Código BIC
- Refactor #9009: Aprobación de Solicitudes de Cuentas Bancarias - Generar Documento electrónico
- ~~Refactor #9252~~: SIARE-DB-PROD Motivo de Rechazo por Procesos del Sistema - Rename
- ~~Refactor #9351~~: SIARE-DB-PROD - Agregar y renombrar atributos en tablas para Vincular Orígenes de Ingreso
- ~~Mejora #8599~~: FE Agregar funcionalidad de Anulación de Documento Electrónico de Solicitudes
- ~~Mejora #9060~~: Parámetros para Titularidad de Cuentas Bancarias - Agregar validación para Fuente de Financiamiento
- ~~Mejora #9292~~: FE Sucursales - Agregar filtros
- ~~Mejora #9319~~: SIARE-DB-PROD Agregado de columna descripcion y modificación de la columna anho
- ~~Documentación #9108~~: Documentos de CU para proceso de Jerarquía de Firmas
- ~~Documentación #9218~~: Actualización de Casos de Uso - Solicitud de Cuentas Bancarias y Gestión de Cuentas Bancarias

Control de tiempo

Tiempo estimado	**353.00 horas**
Tiempo dedicado	**303.30 horas**

Peticiones por Tipo

Funcionalidad	8/8
Incidente	14/14
Refactor	2/3
Mejora	4/4
Documentación	2/2

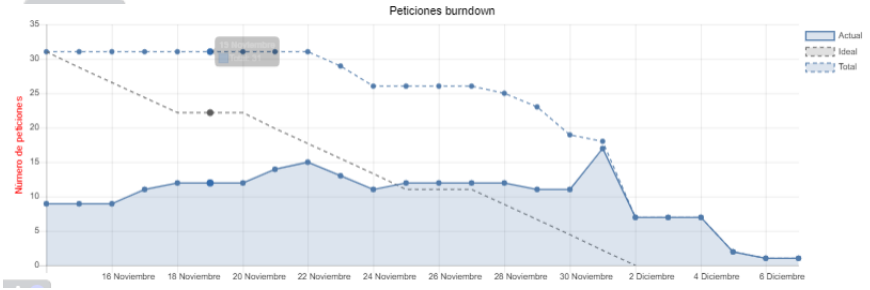

Gestión de Cuentas - Sprint 58

v1.0.58 ABIERTO

2023-12-15

- Fecha de Inicio: 2023-12-04
- Objetivo:
  Concluir con el desarrollo del documento electrónico para las solicitudes de cierre, por tipo de cuenta bancaria.
  Desarrollo del 30% de las tablas y clasificadores del siguiente MPV de Tesorería
  Inicio del desarrollo de interoperabilidad de Catálogos SIARE-SITE
  Evaluación del impacto de los cambios en Jerarquía de Firmas, con respecto a las demás verticales
  Realizar demostración interna con la DGTP del proceso de Solicitud de Cuentas Bancarias

- Logros:
  Si bien no se pudo concluir con el desarrollo del documento electrónico para las solicitudes de tipo cierre, se inició y está avanzado en un 50%. Además, todas las incidencias detectadas, referente a solicitudes de tipo apertura y modificación, fueron resueltas.
  En cuanto al 30% comprometido del desarrollo de las tablas y clasificadores, se completó el desarrollo de los scripts para la creación de tablas en su totalidad (lo planificado).
  Además, se realizó la actualización de los documentos de casos de uso, logrando una nueva versión de los documentos (5.3 y 1.9).
  También actualizamos el formulario de Motivo de Rechazo, incluyendo el proceso por motivo de rechazo, para la configuración de jerarquía de firmas.
  Desarrollamos los casos de uso "Vincular Orígenes del Ingreso" y "Origen de la Información de Estimaciones" e iniciamos el desarrollo de Configuración de Excedentes CUT, y Ejecución Presupuestaria de Años Anteriores.
  PORCENTAJE DE AVANCE: Del primer MPV se tiene desarrollado el 80% y del segundo MVP un 30%.

- Oportunidades de Mejora:
  Para los próximos sprints, sincronizar los objetivos funcionales de todas las verticales, de manera que se puedan manejar mejor las prioridades entre los equipos.
  Mejorar los despliegues de manera que no sean dependientes de la disponibilidad de internet y ver la posibilidad de contar con otro proveedor como backup.
  Mejorar el tiempo de respuesta de las aprobaciones de merge request.
  Mejorar en los documentos de casos de uso, los prototipos y las reglas.

- Contratiempos:
  A raíz del inconveniente con la red, tuvimos problemas con los despliegues, lo que contribuyó al retraso de algunos tickets.

100%

21 peticiones (21 cerradas — 0 abiertas)

Peticiones relacionadas

- ~~Funcionalidad #7409~~: SIARE-DB-PROD Crear tabla de Vinculación Tipo Cuenta y Plan de Cuentas
- ~~Funcionalidad #8240~~: SIARE-DB-PROD - Crear tabla para la Carga de Ejecuciones Presupuestarias de años anteriores
- ~~Funcionalidad #8288~~: SIARE-DB-PROD - Crear tabla de Tipos de Valores Fiscales
- ~~Funcionalidad #8289~~: SIARE-DB-PROD - Crear tabla para Tipos de Solicitudes de Valores Fiscales
- ~~Funcionalidad #8290~~: SIARE-DB-PROD - Crear tabla para Actualizar Datos de Materiales
- ~~Funcionalidad #8291~~: BE Configuración de Excendentes CUT
- ~~Funcionalidad #8298~~: FE Vincular Orígenes de Ingreso
- ~~Funcionalidad #8047~~: BE Motivo de Rechazo por Procesos del Sistema
- ~~Funcionalidad #8049~~: FE Motivo de Rechazo
- ~~Incidente #9525~~: Detalle personas designadas ADMGEN/ADMFROT
- ~~Incidente #9764~~: Se visualiza undefined al seleccionar un registro para la eliminación.
- ~~Incidente #9769~~: Se emite un error, al superar el limite de caracteres dentro del campo Año del Ejercicio.
- ~~Incidente #9772~~: Permite la inserción de un valor negativo en el campo Año del ejercicio.
- ~~Incidente #9787~~: Al limpiar el filtro de búsqueda del listado Orígenes del Ingreso de Ejercicios Anteriores, se visualizan los registros borrados.
- ~~Incidente #9789~~: Permite la inserción y modificación del mismo registro, varias veces.
- ~~Refactor #9749~~: SIARE-DB-PROD Motivo de Rechazo por Procesos del Sistema - Borrar columna
- ~~Documentación #9432~~: Actualización de Casos de Uso - Maquetas para solicitudes de tipo cierre
- ~~Documentación #9456~~: Crear caso de uso - Conceptos para Cuotas Financieras de Gastos
- ~~Documentación #9567~~: Actualización de Diccionario de Datos - Tabla y Clasificadores
- ~~Documentación #9762~~: Actualización de Casos de Uso - Aprobación de Solicitudes de tipo Cierre
- ~~Documentación #9763~~: Actualización de Casos de Uso - Aprobación de vinculación de Orígenes de Ingreso

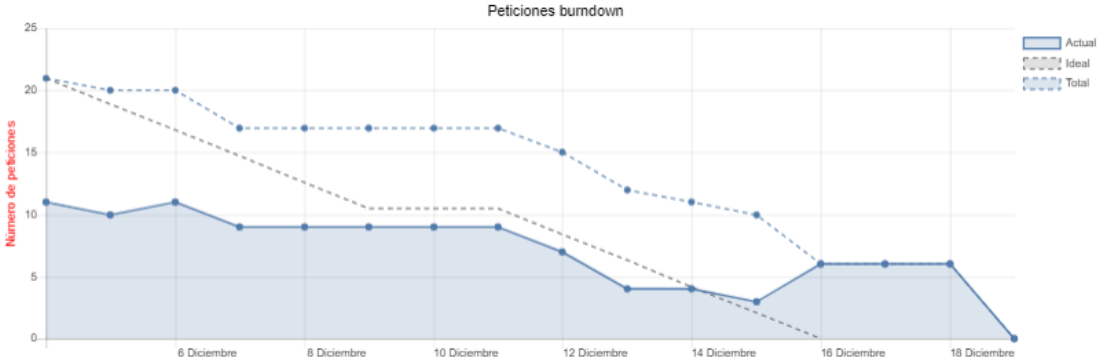

Sigebys - Sprint 56

v1.0.56 ABIERTO

Modificar Borrar Nueva petición

19 días tarde (2023-11-17)

SIABYS v1.0.56

- Fecha de Inicio: 2023-11-06
- Objetivo:
  Inserción de Devengado en SICO
  Deuda técnica
- Logros:
  Avance significativo con Incidencias de deudas técnicas.
  Buena predisposición del Equipo.
  Proceso de Pruebas y Capacitación de Implantación a usuarios Finales (DGCP) con avance significativo.
  Buena aceptación del usuario Final.
  Buena adopción del Marco de trabajo SCRUM.
- Oportunidades de Mejora:
  Mejor planificación técnica para llegar al objetivo del Sprint.
  Mucha inversión en pruebas.
  Mejorar pruebas unitarias para los procesos.
  Avanzar con pruebas de procesos desde el Front.
  En mitad del sprint hacer un refinamiento.
  Considerar Deudas técnicas e incluirlas en el objetivo del Siguiente Sprint
- Contratiempos:
  Evitar Cambios de acuerdos sobre las funcionalidades.
  Evitar trabajos no documentados.
  No perder de vista que será de mucha utilidad trabajar a futuro con marcos normativos.
  Se Solicita logs de Test y UAT.
  Evitar distracciones de tareas no plafinidicadas como por ejemplo, jerarquia de firma

95%

91 peticiones (85 cerradas — 6 abiertas)

Peticiones relacionadas

- ~~Error #8780~~: Al crear contrato retorna órdenes que No corresponden
- ~~Error #8784~~: Al crear orden retorna lugares de entrega que no corresponden
- ~~Error #8877~~: Recepción: Ajuste para actualizar estado a controlado
- ~~Error #8950~~: Al intentar volver al mismo lugar de entrega, no permite crear la nota de remisión ya que no disponibiliza los demás artículos
- ~~Funcionalidad #5049~~: BE - Inserción del resumen de estructuras por acta de recepcion
- ~~Funcionalidad #8689~~: Eliminación de Factura pre-impresa
- ~~Funcionalidad #8753~~: Servicio de insercion de la cabecera del devengado
- ~~Funcionalidad #8758~~: Creación de Acta de Recepción por lugar de entrega
- ~~Funcionalidad #8764~~: BE Servicio de lectura de cuenta contable en SIARE
- ~~Funcionalidad #8765~~: CU lectura de cuentas contables en el SIARE
- ~~Funcionalidad #8768~~: BE obtención de código del proveedor del SIAF
- Funcionalidad #8769: FE catalogo de asociacion de cuenta contables con objeto de gastos
- ~~Funcionalidad #8782~~: Servicio de obtención de la descripción de la estructura presupuestaria
- ~~Funcionalidad #8783~~: DB creación y ajustes en la estructura db para devengado y obligado
- Funcionalidad #8794: Membrete en listados
- ~~Funcionalidad #8796~~: Servicio de insercion en tabla auxiliar del devengado
- ~~Funcionalidad #8806~~: Actualizar lista de Lugar de Entrega
- ~~Funcionalidad #8943~~: CU Servicio de insercion en tabla auxiliar del devengado
- ~~Funcionalidad #8957~~: Eliminación de Factura pre-impresa
- ~~Funcionalidad #8992~~: Servicio de obtencion de monedas del SIAF
- ~~Funcionalidad #9000~~: Servicio de obtencion de cotizaciones del SIAF
- ~~Funcionalidad #9045~~: Recuperar datos del contrato y proveedor para la cabecera del devengado
- ~~Funcionalidad #9046~~: Recuperar la estructura presupuestaria para generar el devengado
- ~~Funcionalidad #9053~~: Mostrar en el resumen del acta de recepcion el devengado
- ~~Funcionalidad #9068~~: Creación Flujo para pruebas automatizadas del FE con Cypress
- ~~Soporte #8858~~: Participación en daily sprint 56 - SIABYS Desarrollo
- Gestión #8790: Normativa del SIGEBYS
- ~~Gestión #8792~~: Provision de listado de cuentas patrimoniales con objeto de gasto
- ~~Gestión #8804~~: Planificación, Retrospectiva y Ceremonias del sprint 56

Control de tiempo

Tiempo estimado	**481.50 horas**
Tiempo dedicado	**514.47 horas**

Peticiones por Tipo

Error	4/4
Funcionalidad	19/21
Soporte	1/1
Gestión	6/7
Incidente	24/25
Refactor	1/1
Mejora	9/9
Documentación	10/11
Implantación	8/9
Minuta	3/3

~~Gestión #8859~~: Cronograma de Implantación SIABYS - Actualización de fechas de actividades esenciales
~~Gestión #8884~~: Prueba del módulo de alta de compras en los diferentes ambientes
~~Gestión #8887~~: Configuración de permisos para Capacitaciones
~~Gestión #8888~~: Pruebas para despliegues entre ambientes
~~Incidente #8708~~: No actualiza ninguno de los campos habilitados, de la pantalla Lugar de Entrega.
~~Incidente #8710~~: Favor unificar la descripción del mensaje de validación "DESCRIPCIÓN", que hace referencia al campo Punto de Referencia.
~~Incidente #8750~~: Items de factura muestra sin filtrar por acta de recepción
~~Incidente #8760~~: Permite limpiar el valor del buscador y la descripción, al intentar actualizar se emite un error.
~~Incidente #8761~~: Se sugiere agregar un texto más informativo, al error presentado en pantalla cuando se intenta adjuntar un archivo superior a lo permitido.
~~Incidente #8770~~: Se sugiere agregar un limite de caracteres dentro de los campos Nº de Nota y Nº de Timbrado, al actualizar el registro.
~~Incidente #8856~~: No se aplica filtro en Lista de Ítems (agregados)
~~Incidente #8861~~: Las etiquetas no coinciden con el estado del acta
~~Incidente #8863~~: No se visualiza la columna Estado en el list
~~Incidente #8864~~: Corregir etiqueta "Orden de Compra"
~~Incidente #8903~~: Se visualiza un valor distinto al ingresado dentro del campo Código de Contrato, en la Factura.
~~Incidente #8923~~: No recupera rótulo en SICO cuando solo se carga una parte del rótulo
~~Incidente #8925~~: No actualiza el valor del campo Plazo de Entrega al eliminar y modificar.
~~Incidente #8933~~: Unificar etiquetas
~~Incidente #8937~~: Descripción no cuenta con upper case en List
~~Incidente #8941~~: Corregir texto Cantidad Adjudicada - Selector de ítems
~~Incidente #9001~~: No guarda el valor seleccionado del combo Unidad de Tiempo.
~~Incidente #9007~~: No realiza el cambio de estado a CONTROLADO
~~Incidente #9008~~: Se muestra un mensaje incorrecto en el pop up, en el flujo de factura.
~~Incidente #9013~~: No habilita el botón Actualizar, al modificar el campo Descripción.
~~Incidente #9015~~: Mostrar Botón Crear en Contrato -> Orden de ejecucuión en el alta
~~Incidente #9025~~: No habilita el botón Controlado, para realizar el cambio de estado del registro.
~~Incidente #9028~~: Corregir ortografía en cabecera de ítems de orden de ejecución
~~Incidente #9050~~: Se sugiere agregar separador de miles al campo Monto Total.
Incidente #9085: No se visualizan correctamente algunos parámetros dentro del reporte (Categoría de Contratación, Razón Social del Proveedor, Nro de Orden).
~~Refactor #8980~~: Crear filtro personalizado para item de orden de ejecucion
~~Mejora #8789~~: Mejoras en la cabecera de factura
~~Mejora #8797~~: Agregar codigo de objeto de gastos en Productos DNCP
~~Mejora #8805~~: Actualización de lugar de entrega
~~Mejora #8807~~: Creación de Fecha de Orden en Lista de Orden de Ejecución
~~Mejora #8868~~: Listado de detalle del contrato
~~Mejora #8869~~: Eliminar el plazo de entrega en la orden de ejecucion
~~Mejora #8978~~: FE Ajuste Orden de Ejecución - Campo despliega fecha menor a la cargada
~~Mejora #9012~~: Ajuste de tipo de dato de DNCPcontratoBienesDTO
~~Mejora #9076~~: Insercion de bienes en REVA
~~Documentación #8293~~: CU lectura de proveedores del SIAF
~~Documentación #8680~~: Perfiles y Permisos para MPV 1 - Alta de Bienes por Compras
Documentación #8721: Actualización del pdf de orden de ejecución
~~Documentación #8754~~: CU del Servicio de Insercion de la cabecera del devengado
~~Documentación #8755~~: CU del Servicio de Insercion del detalle del devengado
~~Documentación #8756~~: Servicio de Insercion del detalle del devengado
~~Documentación #8759~~: CU Creación de Acta de Recepción por lugar de entrega
~~Documentación #8767~~: CU catalogo de asociacion de cuenta contables con objeto de gastos
~~Documentación #8898~~: CU resumen de acta de recepción por estructura presupuestaria
~~Documentación #8993~~: CU Servicio de obtencion de monedas y cotizaciones del SIAF
~~Documentación #9054~~: CU Mostrar en el resumen del acta de recepcion el devengado
~~Implantación #8811~~: Preparar materiales de capacitación
~~Implantación #8857~~: Pruebas en TEST del flujo de sistema MPV 1
~~Implantación #8990~~: Perfiles y Permisos para MPV 1 - Alta de Bienes por Compras - Entornos Desa y UAT
~~Implantación #8992~~: Participación en daily sprint 56 - SIABYS Desarrollo
~~Implantación #8944~~: Prueba en UAT con DGCP-Jefatura - Sprint 55
~~Implantación #9041~~: Demostración MPV1 Sprint 55 - Departamento de Bienes - DGPC
~~Implantación #9043~~: Pruebas en UAT del MPV 1 - Sprint 55 Post Despliegue
~~Implantación #9056~~: Capacitación interna a funcionarios del Departamento de Bienes - DGCP-MEF
Implantación #9172: Capacitación interna a funcionarios del Departamento de Bienes - DGCP-MEF
~~Minuta #8841~~: Stand Up Implementación MPV 1
~~Minuta #8901~~: Reunión de Seguimiento SIABYS
~~Minuta #8918~~: Participación en daily sprint 56 - SIABYS Análisis y Desarrollo

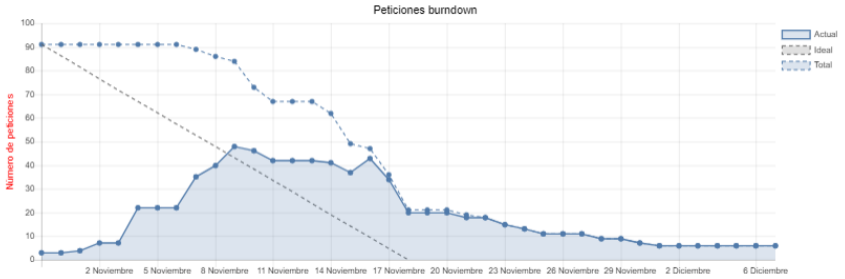

Sigebys - Sprint 57

v1.0.57 ABIERTO

Modificar Borrar Nueva petición

5 días tarde (2023-12-01)

SIABYS v1.0.57

- Fecha de Inicio: 2023-11-20
- Objetivo:
  Inserción de Devengado en SICO
  Iniciar con la Inserción de Obligado en SICO.
  Acompañar ajustes detectados en capacitación con equipo de Implatación. (Cerrar deudas técnicas)

- Logros:
  - Avance en Devengado
  - Se trabajo bien en la capacitación
  - Modalidad hibrida de trabajo fue más productiva
  - Buen manejo del feedback

- Oportunidades de Mejora:
  - Mejorar la definición de los tickets
  - Tener lista de contratos para pruebas
  - Mantener la modalidad hibrida de trabajo
  - Pruebas en todo el proceso
  - Mejorar la comunicación
  - Pruebas automatizadas en ambiente UAT

- Contratiempos:
  - Falta de conectividad
  - Incapacidad de hacer homeoffice
  - Retrabajo por falta de comunicación
  - Problemas con la infraestructura de la oficina (sanitarios y claustrofobia)
  - Falta de log de test y uat
  - Falta capacitación de los usuarios de la DGCP

89%

82 peticiones (66 cerradas — 16 abiertas)

Peticiones relacionadas

Error #9267: IMPUESTO - FACTURA	•••
Funcionalidad #9017: Eliminación de lugares de entrega	•••
~~Funcionalidad #9103~~: Servicio de recuperación de datos para insercion del devengado	•••
~~Funcionalidad #9104~~: Servicio de invocación de un procedimiento para insertar el devengado en el SIAF	•••
~~Funcionalidad #9105~~: Encolamiento de llamadas del devengado	•••
~~Funcionalidad #9106~~: BE Reprocesamiento de registros devengado no insertados en el SIAF	•••
~~Funcionalidad #9110~~: Diseño de tablas para el obligado	•••
~~Funcionalidad #9112~~: CU Eliminación de lugares de entrega	•••
Funcionalidad #9113: FE Habilitación de Factura	•••
~~Funcionalidad #9150~~: Creación de trigger para Cabecera de Devengado	•••
~~Funcionalidad #9151~~: Creación de trigger para Detalle de Devengado	•••
~~Funcionalidad #9152~~: Creación de trigger para Aprobación del Devengado	•••
~~Funcionalidad #9203~~: Proceso de Creación de Orden de Ejecución	•••
~~Funcionalidad #9209~~: Proceso Selección de un contrato de la DNCP	•••
~~Funcionalidad #9211~~: Creación de Nota de remision	•••
~~Funcionalidad #9215~~: BE Habilitación de Factura	•••
~~Funcionalidad #9225~~: BE catalogo de asociacion de cuenta contables con objeto de gastos	•••
Funcionalidad #9226: FE catalogo de cuenta contables con objeto de gastos	•••
~~Funcionalidad #9255~~: Lugar de entrega: Ajustar campos obligatorios para alta y edición.	•••
Funcionalidad #9282: Cambio de estado de devengado	•••
~~Funcionalidad #9303~~: Actualizar las reglas de Negocio del SIAF con un Trigger en la Cabecera.	•••
~~Funcionalidad #9304~~: Actualizar las reglas de Negocio del SIAF con un Trigger en el Detalle	•••
Funcionalidad #9305: Pruebas y ajustes del proceso de devengado	•••
Funcionalidad #9306: FE Reprocesamiento de registros devengado no insertados en el SIAF	•••
~~Soporte #9189~~: Identificación de contratos validos para capacitación a entidades pilotos 28/11	•••
~~Soporte #9191~~: Identificación de contratos validos para capacitación a entidades pilotos 29/11	•••
~~Soporte #9192~~: Identificación de contratos validos para capacitación a entidades pilotos 30/11	•••
Soporte #9221: Pruebas para despliegues entre ambientes	•••
~~Soporte #9272~~: Diseño de Reporte de redmine de incidentes de UAT - Para resolución por despliegues o nuevos desarrollos	•••
~~Soporte #9287~~: Comprobante Recepción - Moneda despliega un mensaje inesperado	•••
~~Gestión #9100~~: Planificación, Retrospectiva y Ceremonias del sprint 57	•••
~~Incidente #9094~~: No se visualiza la columna DEPÓSITO	•••
~~Incidente #9095~~: Entregado = 2 no se visualiza en el listado	•••
~~Incidente #9099~~: Se presenta un error al omitir la validación, de Adjuntar la Factura Pre-Impresa.	•••
~~Incidente #9237~~: Reporte FC 12	•••

Control de tiempo

Tiempo estimado	**405.00 horas**
Tiempo dedicado	**590.30 horas**

Peticiones por Tipo

Error	0/1
Funcionalidad	17/23
Soporte	5/6
Gestión	1/1
Incidente	10/11
Refactor	3/3
Mejora	7/13
Documentación	10/11
Implantación	3/3
Minuta	10/10

~~Refactor #9134~~: Reporte FC 12
~~Refactor #9251~~: FE Item de factura-impuesto
~~Refactor #9309~~: BE Item de factura-impuesto
Mejora #8871: Mostrar el listado de Orden de ejecucion como treetable
~~Mejora #9016~~: Poner fijo el tipo de comprobante en Factura
Mejora #9062: Ajuste en Notificación al proveedor
Mejora #9087: Filtro de Contratos - Añadir Filtro para Finalizados y por defecto desplegar solo los Contratos no finalizados
~~Mejora #9135~~: FE Ajuste de pantalla modal de Acta de Recepción para mejor visualización datos de items
~~Mejora #9149~~: FE Ajuste de pantalla modal de Comprobante de Recepción para mejor visualización datos de items
~~Mejora #9159~~: Cambiar etiqueta en contrato
Mejora #9160: Actualización de Responsables de Firma
Mejora #9273: Filtro de Ordenes de ejecucion en nota de remision
~~Mejora #9277~~: Actas firmadas
~~Mejora #9318~~: Guardado de monto con decimales de acuerdo al tipo de moneda de contrato
Mejora #9322: Bloqueo de creacion de lugares de entrega e itmes
~~Mejora #9324~~: FE Ajuste Modal de Vincular Nota de Remisión
~~Documentación #9114~~: CU BE Habilitación de Factura
~~Documentación #9115~~: CU FE Habilitación de Factura
~~Documentación #9116~~: CU reprocesamiento de devengado
~~Documentación #9156~~: CU Proceso devengado
~~Documentación #9158~~: CU Proceso obligado
Documentación #9180: Documentación para la Aprobación del Devengado
~~Documentación #9197~~: Actualizar Instructivo MPV1 Pasos 5 y 13
~~Documentación #9224~~: Actualizar Plan de Actividades Implantación a Diciembre 2023
~~Documentación #9244~~: Guía de usuario MPV 1 - Alta de Bienes por Compras
~~Documentación #9301~~: Documentación de la Cabecera del Devengado
~~Documentación #9302~~: Documentación del Detalle del Devengado
~~Implantación #9181~~: Preparar instructivo paso a paso MPV1
~~Implantación #9185~~: Participación en daily sprint 57 - SIABYS Análisis y Desarrollo
~~Implantación #9222~~: Participación en daily sprint 57 - SIABYS Análisis y Desarrollo
~~Minuta #9179~~: Stand Up Implementación MPV 1
~~Minuta #9190~~: Coordinar actividades capacitación del 22 al 24 de noviembre.
~~Minuta #9198~~: Prueba de SIGEBYS del 20 de Nov - Día 4
~~Minuta #9200~~: Prueba de SIGEBYS del 21 de Nov - Día 5
~~Minuta #9216~~: Prueba de SIGEBYS del 22 de Nov - Día 6
~~Minuta #9229~~: Stand Up Implementación MPV 1
~~Minuta #9265~~: Prueba de SIGEBYS del 23 de Nov - Día 7
~~Minuta #9266~~: Prueba de SIGEBYS del 24 de Nov - Día 8
~~Minuta #9293~~: Prueba de SIGEBYS del 27 de Nov - Día 9
~~Minuta #9328~~: Capacitación entidades piloto - Día 1

Sigebys - Sprint 58

v1.0.58 ABIERTO

5 días tarde (2023-12-15)

SIABYS v1.0.58

- Fecha de Inicio: 2023-12-04
- Objetivo:
  Montaje de Datawarehouse
  Publicación de primeros tableros de control
- Logros:
  Pruebas automatizadas desde contratos hasta ficha del bien ()
  Avance en devengado.
  Plan de pruebas iniciados y con acompañamiento de Calidad.
  Revision en detalles del circuito con equipo de bienes
- Oportunidades de Mejora:
  Crear habito de avisar a devops cuando existen cambios e properties.
  volver a salir a las 17:00 luego de diciembre.
  Hacer Review previo a Retrospectiva.
  Plan de revision diaria con recalendarización.
- Contratiempos:
  Se requiere mejor comunicación (Siabys/Arquitectura/Devops) referente a cambios que impactan al módulo de Siabys.
  servicio de la DhCP inestable (para creación de contratos).
  Falta de claridad de procesos - Devengado y Obligado.
  Notificar cuando se tocan configuraciones globales (a la interna del módulo).
  Problemas de internet y VPN - (lentitud/ falta de conexión por momentos).
  Salir a las 17:30,sería más productivo el trabajo remoto con una buena planificación y comunicación que aumentar la jornada 30 min. más.
  Cancelación de presentacion a entidades piloto en diciembre.

77%

124 peticiones (87 cerradas — 37 abiertas)

~~Error #9397~~: Ver notificación - No devuelve el PDF de notificación al proveedor
~~Error #9516~~: centrar el título
~~Error #9526~~: Número de factura
Error #9532: Mensaje de error en comprobante de recepción
~~Error #9692~~: RECEPCIÓN DE DEPÓSITO O ALMACÉN
~~Error #9694~~: RECEPCIÓN EN DEPÓSITO O ALMACÉN
~~Error #9709~~: ventana de Rótulo
Funcionalidad #7041: PDF para Bienes Remitidos
Funcionalidad #8977: Actualizacion del estado del acta al cambiar el estado de la factura
Funcionalidad #9018: Eliminación logica de Orden de Ejecución
Funcionalidad #9107: Servicio de recuperación de datos para insercion del obligado
Funcionalidad #9109: Servicio de invocación de un procedimiento para insertar el obligado en el SIAF
~~Funcionalidad #9115~~: CU Eliminación logica de Orden de Ejecución
~~Funcionalidad #9248~~: Proceso de Creación de Deposito de Recepción Custodia
~~Funcionalidad #9455~~: Agregar la opcion de alta al tree-table de Orden de Ejecucion
~~Funcionalidad #9461~~: Cambios en la Base de datos
Funcionalidad #9466: Prueba integrada y ajustes del reproceso
~~Funcionalidad #9469~~: Busqueda de contratos en la creación
~~Funcionalidad #9474~~: Automatización de pruebas para Proceso Nota de remisión
Funcionalidad #9475: Casos de Prueba de los procesos
Funcionalidad #9484: Servicio de insercion en tablas auxiliares del obligado
Funcionalidad #9485: Resumir la busqueda de lugar en nota de remision
~~Funcionalidad #9487~~: Distribuir el acta de recepcion para varias estructuras
~~Funcionalidad #9498~~: Servicio que lee los productos del SIAF
~~Funcionalidad #9608~~: Proceso de Contrato / Orden de Ejecución - Alta del bien
Funcionalidad #9670: Dashboard - PDF para Bienes Remitidos
~~Funcionalidad #9748~~: Proceso de Creación de Acta de Recepción
~~Funcionalidad #9749~~: Proceso de Aprobación de Acta de Recepción
~~Funcionalidad #9720~~: Proceso de Firma de Actas de Recepción
~~Funcionalidad #9721~~: Proceso de Comprobante de Recepción
~~Funcionalidad #9722~~: Proceso de Ficha del Bien
~~Funcionalidad #9757~~: Actualizacion del monto devengado desde el obligado
Soporte #9275: Tiempo de entrega en Lugar de entrega
~~Soporte #9339~~: Accesos a Adriana Croce - Jefa de Bienes
~~Soporte #9483~~: Prueba del proceso del sprint 58
~~Gestión #9457~~: Planificación, Retrospectiva y Ceremonias del sprint 58
Gestión #9458: Reuniones del Sprint 58
Gestión #9582: Solicitar acceso a entorno de pruebas Portal DNCP - Gestión de Contratos / Llamados
~~Gestión #9643~~: Tratamiento de Incidencias - Flujo de fixes
~~Gestión #9644~~: Tratamiento de incidencias - Motivo de Cierre
~~Gestión #9646~~: Pruebas del Sprint 58
~~Gestión #9667~~: Revisión de precondiciones para ajustes de perfiles de usuarios
Gestión #9724: Participación en reunión de seguimiento SIABYS
~~Gestión #9799~~: Pruebas del sprint 58 con Usuario Final en ambiente UAT
~~Gestión #9800~~: Tratamiento de incidencias - Motivo de Cierre
~~Incidente #9328~~: Acta de recepcion-descarga de acta
~~Incidente #9345~~: Error al crear una ficha manual
Incidente #9355: Comprobante de Recepcion/Proveedor
~~Incidente #9382~~: Refrescar listado de depósito o custodia al agregar un nuevo item
~~Incidente #9391~~: Permite guardar Factura con el Nro. incompleto
~~Incidente #9398~~: Al obtener el reporte, no se visualiza el logo en el Acta de Recepción.
Incidente #9526: Mensaje Ocurrio un inconveniente al realizar la operación
~~Incidente #9527~~: Incidencia Contratos - MSPBS - Elga Croce
~~Incidente #9527~~: Incidencia Contratos - MSPBS - Elga Croce
~~Incidente #9548~~: Acta de Recepción - Buscar Nota de Remisión no trae datos
~~Incidente #9549~~: Permite editar lugar de entrega de una orden notificada (treetable)
~~Incidente #9551~~: Error al intentar crear manualmente una ficha del bien
~~Incidente #9552~~: Luego de cargar 1 producto en remisión no habilita el botón (+) para cargar otro (luego de cerrar y navegar con los TABS)
~~Incidente #9553~~: Permite agregar Lugar de Entrega en Ordenes de Ejecución con estado NO FINALIZADO, para un contrato que no posee saldo.
Incidente #9584: Contratos - Orden de Ejecución - mensaje de error al ingresar a un contrato existente
~~Incidente #9597~~: Habilitación de Factura - No se imprime mensaje de confirmación y no refresca
~~Incidente #9641~~: No se visualiza el detalle del treetable luego de realizar la remisión
~~Incidente #9675~~: No retorna la categoría del contrato
Incidente #9742: alinear iconos de acción en Ordenes de ejecución
Incidente #9743: Al agregar un registro se visualizar el valor -1 en Plazo de Entrega.
~~Refactor #9376~~: Bien componentizado-listado
~~Refactor #9383~~: Refrescar listado de acta de recepcion al agregar un nuevo item
~~Refactor #9422~~: Deposito Custodia-Fecha efectiva de entrega
~~Refactor #9423~~: Validar el timbrado de la nota de remisión
~~Refactor #9493~~: Ajustes en Facturas para actualizar como estado Controlado
~~Refactor #9623~~: BE Refactor del contrato
~~Refactor #9645~~: FE Refactor del contrato
Refactor #9813: Traslado de funcionalidad, refactor y mejoras
~~Mejora #8751~~: Logo en el acta de recepción
~~Mejora #8946~~: Indicar la cantidad de caracteres requeridos para la factura
Mejora #9299: Contratos-agregar el filtro de UJE
~~Mejora #9323~~: Nota de remision - Seleccionar todo
Mejora #9348: Moneda en contratos
Mejora #9349: Ficha del bien identificador del bien
~~Mejora #9389~~: Actualización del FC 12
Mejora #9399: Reporte FC12 - actualizar reporte con datos faltantes
~~Mejora #9444~~: Mejora en el servicio de la dncp
Mejora #9514: Orden de ejecución -> Lugares de entrega: modificación de nombre
~~Mejora #9793~~: Se agrega columna a la actualizacion REVA
~~Documentación #9463~~: Definición conceptual de retenciones
~~Documentación #9476~~: Regla de negocio de insercion del obligado (Cabecera)
Documentación #9477: Regla de negocio de insercion del obligado (detalle)
~~Documentación #9478~~: Trigger de validación de insercion del obligado (detalle)
~~Documentación #9479~~: Trigger de validación de insercion del obligado (Cabecera)
Documentación #9480: Regla de negocio de la ejecución presupuestaria
~~Documentación #9481~~: Regla de negocio de las retenciones y deducciones
~~Documentación #9492~~: CU Refactor del contrato
~~Documentación #9496~~: CU inserción de la ejecución presupuestaria en el obligado
~~Documentación #9499~~: CU Servicio que lee los productos del SIAF
~~Documentación #9601~~: Camino esperado de Contratos - Orden de Ejecución
~~Documentación #9602~~: Camino esperado de Nota de Remisión - Alta del Bien
~~Documentación #9603~~: Camino esperado de Depósito de Recepción/Custodia - Alta del Bien
~~Documentación #9608~~: Camino esperado de Acta de Recepción - Alta del Bien
~~Documentación #9609~~: Camino esperado de Aprobación de Actas de Recepción - Alta del Bien
~~Documentación #9610~~: Camino esperado de Firma de Actas de Recepción - Alta del Bien
~~Documentación #9611~~: Camino esperado de Comprobante de Recepción - Alta del Bien
~~Documentación #9612~~: Camino esperado de Ficha del Bien - Alta del Bien
~~Documentación #9650~~: Visualización de la estructura presupuestaria de la factura
~~Documentación #9680~~: CU Listado de bienes en deposito
Documentación #9759: Redacción Informe de Trabajo Mes 7
~~Implantación #9515~~: Actualización de plan de actividades implantación
Implantación #9517: Verificar usuarios y perfiles de funcionarios DGCP
~~Implantación #9522~~: Pruebas con usuarios DGCP-Bienes
~~Implantación #9517~~: Verificar usuarios y perfiles de funcionarios DGCP
~~Implantación #9522~~: Pruebas con usuarios DGCP-Bienes
~~Implantación #9547~~: Exportar entidades asignadas a funcionarios DGCP-Bienes
~~Implantación #9577~~: Documento Taller Relevamiento de Recomendaciones Entidades Piloto
Implantación #9578: Preparar números de contratos para funcionarios de Bienes-DGCP
Implantación #9579: Actualizar Instructivo MPV1 Alta de Bienes por Compras 1.2 a 1.3
Implantación #9580: Elaborar videotutoriales del MPV1
Implantación #9585: Plan de revisión de formularios MPV 1 - con departamento de Bienes DGCP
Implantación #9629: Revisión en detalle de CONTRATOS
~~Implantación #9662~~: Revisión en detalle de NOTA DE REMISIÓN
~~Implantación #9664~~: Revisión en detalle de DEPÓSITO DE RECEPCIÓN / CUSTODIA
~~Implantación #9665~~: Revisión en detalle de DEPÓSITO / Reporte Existencia
Implantación #9681: Lectura Ley 7021/2022
~~Minuta #9497~~: Retroalimentación de Capacitaciones a OEE Pilotos
~~Minuta #9540~~: Stand Up Implementación MPV 1
Minuta #9542: Pruebas SIGEBYS del 04 de Dic - Día 1
~~Minuta #9676~~: Stand Up Implementación MPV 1
~~Minuta #9682~~: POC - Refinamineto Sigebys
Minuta #9741: Stand Up Implementación MPV 1

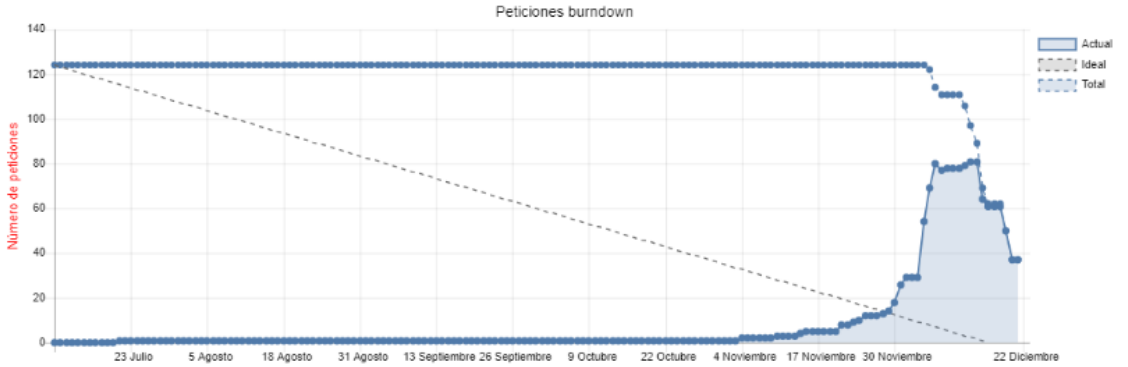

Presupuesto - Monitoreo del Desempeño – Sprint 56

v1.0.56 ABIERTO

Modificar Borrar Nueva petición

19 días tarde (2023-11-17)

- Fecha de Inicio: 2023-11-06
- Objetivo:
  * Desarrollo de carga de avances.
  * Tablero de control Indicadores.
  * Gestión de versiones.
  * Ajuste de Gestión del desempeño y Monitoreo por versión (Plan Financiero).
  * Pruebas en UAT de Tablero de Indicadores versión 1.
  * Relevamiento de reportes de avance.

- Logros:
  - Cierre de primer MPV para el proyecto SIARE - Gestión del desempeño.
  - Buen trabajo e integridad del equipo.
  - Cierre de catálogos de colores y configuración de tablero de control.
  - Cambio de pantalla de variables (unidad de medidas)
  - Actualización de documentos frontend y backend.
  - Maquetas aprobadas por DGP (Monitoreo de avances)
  - Elaboración de casos de uso entendibles para desarrolladores.
  - Inicio de modalidades de epicas que ayudan a englobar los trabajos en los módulos teniendo en cuenta otras verticales como transversales.

- Oportunidades de Mejora:
  - Aplicar agilismos a las reuniones de definiciones como las versiones y aplicación de ambientes (Acotar el sprint pero considerar futuros cambios que se agregan en etapas anteriores).
  - Definiciones concretas de parte del usuario final para completar en la finalización de documentos.
  - Definir en totalidad los escenarios posibles para distribución de tareas y desarrollo concreto.
  - Mejorar la elaboración de definiciones para CU.
  - Terminar ticket configuración de tableros (motivo cambio a formulación personalizado)
  - Dependencia fuerte de los usuarios que definen lentamente los requerimientos.
  - Contar con ambientes mas estables.
  - Contar con analistas funcionales para todas las etapas de presupuesto.

- Contratiempos:
  - Aplicar agilismos a las reuniones de definiciones como las versiones y aplicación de ambientes (Acotar el sprint pero considerar futuros cambios que se agregan en etapas anteriores).
  - Acceso de recursos de monitoreo para el diagnostico(elk configurado, logs para todos los ambientes).
  - No se cuenta con analista funcional, difícil de sacar requerimientos con el usuario.
  - Fechas de entregas muy optimistas (Mejoras en la planificación con los usuarios).
  - Análisis de riesgos para usuarios del Congreso, en caso que precisen acceder a Gestión del Desempeño.

99%

49 peticiones (48 cerradas — 1 abierta)

Peticiones relacionadas

- ~~Funcionalidad #8774~~: BD - Creacion de tablas para Monitoreo de avances
- ~~Funcionalidad #8775~~: BD - Implementar modificacion tablas de gestion del desempeño para incluir versiones/año
- ~~Funcionalidad #8776~~: BE - Modificacion de gestion del desempeño para incluir versiones/año
- ~~Funcionalidad #8777~~: FE - Modificacion de gestion del desempeño para incluir versiones/año
- Funcionalidad #8779: FE - Configuracion de tablero de control
- ~~Funcionalidad #8785~~: Desarrollar APIS en siaf-conector para lectura y capturar las modificaciones de versiones
- ~~Funcionalidad #8793~~: Foliado de campo codigo para indicadores y poblaciones
- ~~Funcionalidad #8813~~: FE Catalogo de Colores
- ~~Funcionalidad #8814~~: FE - Configuracion de tablero de control
- ~~Funcionalidad #8818~~: Listado de Tablero de Control
- ~~Funcionalidad #8819~~: BD agregar año a tablero-controles
- ~~Funcionalidad #8821~~: Desarrollar APIS en siaf-conector para lectura
- ~~Funcionalidad #8827~~: Año y vigencia en Configuración del Tablero de Control
- ~~Funcionalidad #8895~~: CU - Medio de Verificación
- ~~Funcionalidad #8981~~: Agregar columna descripcion y años a tablas de indicador_variable_avance
- ~~Funcionalidad #8989~~: BE Pantalla de Acceso de Carga de Avance
- ~~Funcionalidad #8990~~: FE Pantalla de Acceso de Carga de Avance
- ~~Funcionalidad #8991~~: BE Listado de Tablero de Control
- ~~Funcionalidad #9011~~: Implementar script de BD a liquibase de laboratorio
- ~~Funcionalidad #9032~~: BD - Modificar tablas de indicador avances de acuerdo a nuevas especificaciones
- ~~Funcionalidad #9039~~: BE - Inicializar configuracion para avances del indicador
- ~~Funcionalidad #9044~~: Prototipo composición de la fórmula
- ~~Funcionalidad #9058~~: BE - Inicializacion de registros cuando el usuario presiona en el Ojito (INDICADOR_FORMULA_RESULTADOS/INDICADOR_VARIABLE_AVANCE_TOTALES)
- ~~Funcionalidad #9059~~: BE - Inicializacion de registros cuando el usuario presiona en el Ojito (INDICADOR_AVANCE_CONFIGURACIONES/INDICADOR_VARIABLE_AVANCE_VALORES)
- ~~Funcionalidad #9071~~: BD - Modificacion de tablas segun requerimiento de desarrollo de avances
- ~~Funcionalidad #9078~~: BD - Modificar tablas de indicador avances de acuerdo a nuevas especificaciones
- ~~Funcionalidad #9083~~: Listado de Indicadores
- ~~Gestión #8216~~: Identificar entidades a ser versionadas
- ~~Gestión #8972~~: Retro Sprint 55 y Planning Sprint 56
- ~~Gestión #9079~~: Review Sprint 56
- ~~Incidente #8893~~: No se debe permitir crear registros con * o N/A
- ~~Incidente #8954~~: Falta flujo alterno 1, GUARDAR Y CREAR
- ~~Documentación #8808~~: Prototipo Configuración del Indicador
- ~~Documentación #8812~~: Actualizar Caso de Uso de versiones
- ~~Documentación #8815~~: Caso de Uso Configuración del Indicador (Plan Financiero y Avance)
- ~~Documentación #8826~~: Incorporar año y vigencia a la Configuración del Tablero de Control
- ~~Documentación #8922~~: Ajustar prototipo - Carga de Avance Variable del Indicador
- ~~Documentación #8964~~: Prototipo Indicadores
- ~~Documentación #8965~~: Caso de Uso Indicadores
- ~~Documentación #8974~~: Ajustar Diccionario de Datos -CU Tablero de Control
- ~~Documentación #8975~~: Verificacion de la minutas reuniones DGP
- ~~Documentación #8996~~: Prototipo Medio de Verificación
- ~~Documentación #8997~~: Prototipo Carga de Metas
- ~~Documentación #9031~~: Prototipo Configuración del Indicador
- ~~Documentación #9080~~: Actualización Prototipo de Indicadores
- ~~Documentación #9086~~: Lectura de minutas de las reuniones con la DGP
- ~~Documentación #9089~~: Elaboración del documento guía de usuario de Catálogos
- ~~Minuta #8971~~: Reunión Semanal SIARE-DGP 08/11/2023
- ~~Minuta #9054~~: Reunión Semanal SIARE-DGP 15/11/2023

Control de tiempo

Tiempo estimado	**525.00 horas**
Tiempo dedicado	**365.79 horas**

Peticiones por Tipo

Funcionalidad	26/27
Gestión	3/3
Incidente	2/2
Documentación	15/15
Minuta	2/2

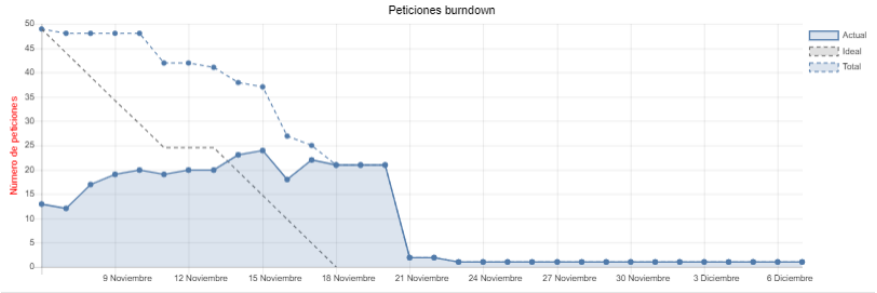

Presupuesto - Monitoreo del Desempeño – Sprint 57

v1.0.57 ABIERTO

Modificar Borrar Nueva petición

5 días tarde (2023-12-01)

- Fecha de Inicio: 2023-11-20
- Objetivo:
  1. Gestión de años.
  2. Notificaciones.
  3. Pruebas en UAT de carga de avances y tablero de control de Indicadores.
  4. Reporte de avance.
  5. Documentación carga de avance de población (prototipo, flujo, diccionario de datos, caso de uso).
  6. Desarrollo carga de avance de población.

- Logros:
  1. El desarrollo de los maquetados del modelo de monitoreo fueron más rápidos debido a la implementación en los casos de uso.
  2. Mejora en la productividad al realizar una modalidad de trabajo híbrido (home office).
  3. Consenso con usuarios respecto a monitoreo.
  4. Se concretó análisis y se presentó primera demo de versiones.
  5. Buena organización y distribución de las tareas.
  6. Finalización de tickets dentro del sprint.
  7. Se mejora la comprensión de casos de usos con reuniones de frontend y backend.
  8. Integridad del equipo de desarrollo de Plan Financiero.
  9. Cierre de etapas en relevamiento y confirmación de reglas de negocio para carga de avance.
  10. Confirmación de reglas de negocio para Plan Financiero.
  11. Avance en el desarrollo en ambiente de desarrollo de lo prototipado en el figma y mejoras en el UI.

- Oportunidades de Mejora:
  1. Conseguir analistas funcionales conforme a nuestras necesidades.
  2. Definir fechas de entrega de cada producto:
  a. Carga de avance: xx/xx/yyyy
  b. Versión: xx/xx/yyyy
  3. Se propone completar el caso de uso con DFD y prototipo.
  4. Utilizar el edge para depurar o ver errores de desarrollo.
  5. Posibilidad de seguir con la modalidad de trabajo híbrido.

- Contratiempos:
  1. Inconvenientes con el internet.
  2. Tiempos muy ajustados para relevamiento de datos con los usuarios finales.
  3. Se sigue sin tener entrada bien definida para el camino correcto para empezar el flujo.
  4. No se cuenta con analistas funcionales.
  5. Los usuarios cambian constantemente los requerimientos.
  6. Estamos atrasados con respecto a las prioridades de los usuarios finales.
  7. No se pudo tratar las Notificaciones para avance de Indicadores.
  8. Aún no se pudo realizar pruebas en ambiente de UAT.
  9. Aún no se pudo tratar la carga de avance de Población.
  10. Acceso a logs de los distintos ambientes lab y test mínimamente (dificulta mucho el diagnóstico de casos y se depende mucho del equipo de Devops).

98%

49 peticiones (47 cerradas — 2 abiertas)

Peticiones relacionadas

- ~~Funcionalidad #9117~~: Foliado de campo codigo para indicadores y poblaciones
- Funcionalidad #9118: Año y vigencia en Configuración del Tablero de Control
- ~~Funcionalidad #9119~~: BE Pantalla Cuadro de Resumen de la Fórmula
- ~~Funcionalidad #9120~~: BE Listado de Tablero de Control
- ~~Funcionalidad #9121~~: Listado de Indicadores
- ~~Funcionalidad #9122~~: Ordenamiento del menú de Presupuesto
- ~~Funcionalidad #9123~~: BD - Ajustes a tablas
- ~~Funcionalidad #9128~~: BE Configuración del Indicador
- ~~Funcionalidad #9130~~: FE Pantalla de Acceso de Carga de Avance
- ~~Funcionalidad #9154~~: BE Pantalla de Acceso de Carga de Avance
- ~~Funcionalidad #9167~~: Ficha del Indicador
- ~~Funcionalidad #9175~~: FE Ajuste Listado de Tablero de Control
- ~~Funcionalidad #9188~~: BD - Implementar scripts para aplicacion de version/año en ambiente desa
- ~~Funcionalidad #9201~~: Configuración de permisos para Listado de Indicadores
- ~~Funcionalidad #9206~~: Se debe modificar en el BE/FE la columna variable_avance a la tabla de indicador_variable
- ~~Funcionalidad #9207~~: Medios de Verificación
- ~~Funcionalidad #9208~~: Composición de la Fórmula
- ~~Funcionalidad #9230~~: BE Carga de Meta anual
- ~~Funcionalidad #9231~~: FE Carga de Meta anual

Control de tiempo

Tiempo estimado	**700.00 horas**
Tiempo dedicado	**575.00 horas**

Peticiones por Tipo

Funcionalidad	26/27
Gestión	2/2
Incidente	3/3
Documentación	15/15
Minuta	1/2

~~Funcionalidad #9232~~: BE Carga de Avance
~~Funcionalidad #9253~~: Actualizar dto's y modelos de Indicadores y Población
~~Funcionalidad #9254~~: Actualizar las tablas de detalle de Indicadores y Población
~~Funcionalidad #9342~~: BE Modificacion de Avance
~~Funcionalidad #9343~~: Modifiacion de tabla medidas-artefactos-compartidos para eliminar columnas de versiones de presupuesto
~~Funcionalidad #9360~~: Actualizar front conforme a cambios en los dto's de Indicadores y Población
~~Funcionalidad #9374~~: Ordenamiento del menú de Presupuesto - test
~~Funcionalidad #9392~~: Agregar columna institución en listado del Indicador
~~Gestión #9285~~: Retro Sprint 56 y Planning Sprint 57
~~Gestión #9411~~: Review y Retro del Sprint 57 y Planning del Sprint 58
~~Incidente #8874~~: Se sugiere agregar validación para los campos Porcentaje Desde, Porcentaje Hasta.
~~Incidente #8875~~: Favor corregir el mensaje de confirmación al agregar nuevos registros.
~~Incidente #8876~~: Los mensajes de atención o advertencia deben visualizarse en español.
~~Documentación #8967~~: Caso de Uso Apertura
~~Documentación #8983~~: Caso de Uso Configuración del Indicador
~~Documentación #9124~~: Caso de Uso Indicadores
~~Documentación #9125~~: Caso de Uso Fórmula del Indicador
~~Documentación #9126~~: Lectura de minutas de las reuniones con la DGP
~~Documentación #9146~~: Elaboración de documento guía de usuario de Carga de Avance
~~Documentación #9147~~: Actualizar Caso de Uso de versiones
~~Documentación #9168~~: Prototipo de reporte de Avance de Indicadores
~~Documentación #9183~~: Lectura de Casos de Uso de Formulación de Gestión del Desempeño - Indicadores
~~Documentación #9205~~: Prototipo Cierre de avance por Frecuencia
~~Documentación #9212~~: Prototipo carga de avance de Población
~~Documentación #9316~~: Prototipo Programación de Metas anual
~~Documentación #9324~~: Caso de Uso Generación del Plan Financiero
~~Documentación #9347~~: Prototipo de Notificaciones
~~Documentación #9450~~: Actualizar Caso de Uso de versiones
~~Minuta #9182~~: Reunión Semanal SIARE-DGP 21/11/2023
Minuta #9350: Reunión Semanal SIARE-DGP 28/11/2023

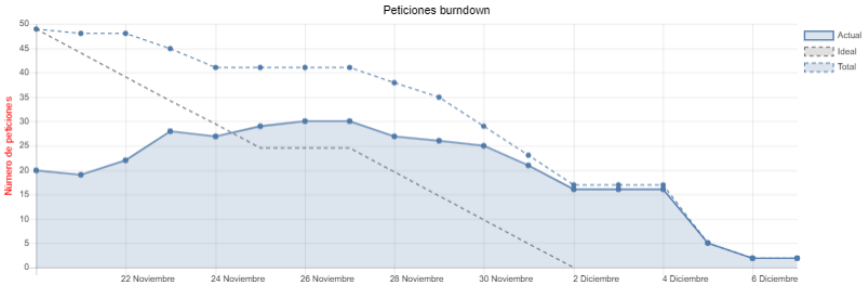

Presupuesto - Monitoreo del Desempeño – Sprint 58

v1.0.58 ABIERTO

5 días tarde (2023-12-15)

- Fecha de Inicio: 2023-12-04
- Objetivo:
  1. Gestión de año y versiones (Plan Financiero) en su versión 2.
  2. Modificaciones de Indicadores y población por versiones (Plan Financiero) en su versión 2.
  3. Reporte de avance de Indicadores.
  a. Caso de Uso.
  4. Calendario de Procesos
  a. Actualización del caso de uso y prototipo.
  5. Notificaciones, justificaciones y alertas.
  a. Prototipo, casos de uso e inicio de desarrollo.
  6. Documento de Caso de Uso de Generación de Plan Financiero.
  7. Pruebas en UAT de primera versión de avance de Indicadores.
  8. Pruebas en UAT de Gestión de año y versiones.
  9. Pruebas en UAT de la Generación de Plan Financiero (versión 1).

94%

71 peticiones (65 cerradas – 6 abiertas)

Peticiones relacionadas

- ~~Error #9472~~: Cuando el total del valor de variable es 0 la celda de valores plurianuales se desplaza
- ~~Funcionalidad #9120~~: FE Configuración del Indicador
- ~~Funcionalidad #9234~~: BE/FE Medio de Verificación de Variable
- ~~Funcionalidad #9235~~: FE Medio de Verificación de Variable
- ~~Funcionalidad #9317~~: Configuración del Indicador
- ~~Funcionalidad #9401~~: Actualizar reportes conforme a cambios en los dto's de Indicadores y Población
- ~~Funcionalidad #9402~~: BE Pantalla de Acceso de Carga de Avance
- ~~Funcionalidad #9404~~: Duplicación de variables vinculadas al Indicador
- ~~Funcionalidad #9405~~: Ajustar columna de la tabla INDICADOR_VARIABLES
- ~~Funcionalidad #9406~~: FE Pantalla de Acceso de Carga de Avance
- ~~Funcionalidad #9408~~: BE Carga de Meta anual
- ~~Funcionalidad #9409~~: FE Carga de Meta anual
- ~~Funcionalidad #9424~~: BE Configuración del Indicador
- ~~Funcionalidad #9448~~: BD - modificaciones en tabla INDICADOR_VARIABLES
- ~~Funcionalidad #9453~~: Agregar columna institución en listado del Indicador
- Funcionalidad #9465: FE Carga de avance
- ~~Funcionalidad #9486~~: Ordenamiento del menú de Presupuesto - UAT
- ~~Funcionalidad #9510~~: Servicio para Generación del Plan Financiero desde el SIAF
- ~~Funcionalidad #9573~~: Prueba de Indicadores en ambiente de desarrollo
- ~~Funcionalidad #9576~~: Servicio para acceder desde el SIAF a Plan Financiero (Indicadores)
- ~~Funcionalidad #9586~~: Servicio para acceder desde el SIAF a Carga de Avance (Indicadores)
- ~~Funcionalidad #9590~~: Agregar botón en SIAF para acceder a Plan Financiero de SIARE
- Funcionalidad #9598: Prueba de Indicadores en ambiente de test
- ~~Funcionalidad #9636~~: Listado de Población
- ~~Funcionalidad #9651~~: No se visualizan los medios de verificación para perfil Operador de Presupuesto
- ~~Funcionalidad #9653~~: Programación de metas
- ~~Funcionalidad #9655~~: Agregar botón en SIAF para acceder a Monitoreo de SIARE
- ~~Funcionalidad #9666~~: Gráfico anual
- ~~Funcionalidad #9701~~: Población e Identificación de la Población
- ~~Funcionalidad #9707~~: Actualizar la tabla INDICADOR_VARIABLE_AVANCE_VERIFICACION_MEDIOS
- ~~Funcionalidad #9740~~: Reporte Ficha del Indicador
- ~~Funcionalidad #9746~~: Modificación de CU Tabla de Control para reglas de negocio de configuracion
- ~~Funcionalidad #9747~~: Servicio para obtener bitácora de los detalles de Indicadores
- ~~Funcionalidad #9770~~: Configuración de la Población
- ~~Incidente #9539~~: Corregir texto en mensaje de solapamiento
- ~~Incidente #9541~~: Permite cargar porcentajes que ya existen en otro registro inactivo
- ~~Incidente #9560~~: Permite agregar dentro del campo Descripción los valores * y N/A.
- ~~Incidente #9561~~: Se sugiere agregar tilde a la palabra valido.
- ~~Incidente #9688~~: No se limpian los campos cargados anteriormente
- ~~Incidente #9690~~: Actualizar mensaje en dependencia del contacto
- ~~Incidente #9693~~: No permite la vinculación de un indicador ya finalizado
- ~~Incidente #9695~~: Error al seleccionar generar avance en la variable
- ~~Incidente #9698~~: Especificaciones no coinciden con documentación
- Incidente #9749: No emite mensaje de vinculación exitosa
- Refactor #9734: Listado de Indicadores
- ~~Documentación #9394~~: Actualizar caso de uso de Indicadores
- ~~Documentación #9409~~: Prototipo de Notificaciones
- ~~Documentación #9416~~: Actualización del documento guía de usuario de Carga de Avance
- ~~Documentación #9443~~: Actualización del caso de uso Tablero de Control
- ~~Documentación #9449~~: Caso de Uso Apertura
- ~~Documentación #9451~~: Caso de Uso Generación del Plan Financiero
- ~~Documentación #9505~~: Caso de Uso Notificaciones
- ~~Documentación #9511~~: Reportes
- ~~Documentación #9536~~: Adecuar línea de referencia en carga de avance
- ~~Documentación #9554~~: Prototipo Calendario de Procesos
- ~~Documentación #9555~~: Caso de Uso carga de avance de Población
- ~~Documentación #9556~~: Caso de Uso Población
- ~~Documentación #9576~~: Estandarización e integración de documentos (Gestión del Desempeño y Monitoreo)
- ~~Documentación #9604~~: Ajustar prototipo de Calendario de Procesos
- ~~Documentación #9618~~: Actualizar prototipo de carga de avance de Población
- ~~Documentación #9619~~: Incorporar en la documentación guía de usuario la etapa de Plan Financiero
- ~~Documentación #9636~~: Prototipo Población
- ~~Documentación #9642~~: Revisión de Caso de Uso Indicadores
- ~~Documentación #9657~~: Actualizar CU tablero de control
- ~~Documentación #9708~~: Actualizar Medios de Verificación de Variables
- ~~Documentación #9728~~: Actualizar CU Indicadores
- ~~Documentación #9758~~: Prototipo listado de Indicadores
- ~~Documentación #9803~~: Prototipo Bitácora
- ~~Minuta #9520~~: Reunión Semanal SIARE-DGP 05/12/2023
- Minuta #9677: Reunión Semanal SIARE-DGP 12/12/2023
- Minuta #9807: Reunión Semanal SIARE-DGP 14/12/2023

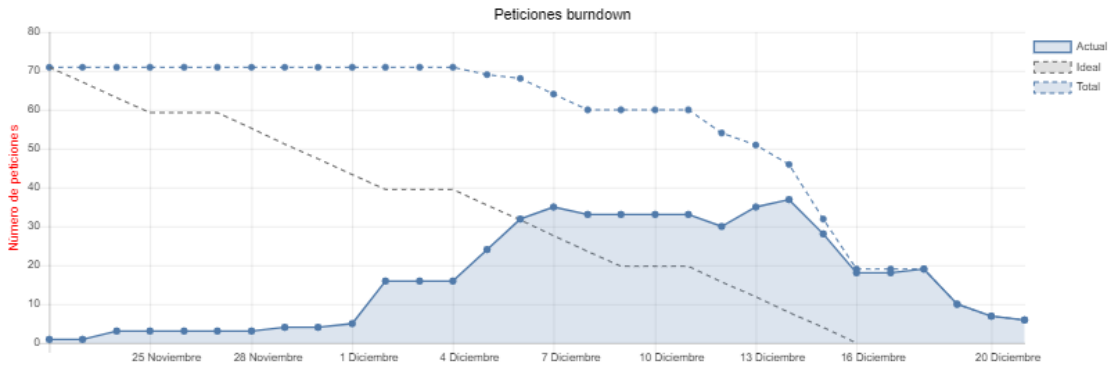

OSCAR FERNANDO BOGARIN ESQUIVEL

Firmado digitalmente por OSCAR FERNANDO BOGARIN ESQUIVEL
Fecha: 2023.12.20 19:03:26 -03'00'
